

编号: HYZY-ZHJL-JLYB-20171130

监 理 月 报

工程名称: 浙江华宇纸业 8mwp 分布式光伏发电项目

2017 年 11 月 第五期 (总 期)

总监理工程师: 赵占良



监理单位 (章)
报告日期: 2017 年 11 月 15 日

监 理 月 报

工程名称：浙江华宇纸业 8mwp 分布式光伏发电项目

2017 年 11 月 第 5 次 月报


开始时间 2017 年 11 月 01 日 结束日期 2017 年 11 月 30 日


监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	平湖昇茂新能源科技有限公司绍兴柯桥地区 20MWp 分布式光伏项目	浙江华宇纸业 8mwp 分布式光伏发电项目	影像	5 张	

监理重点工作情况

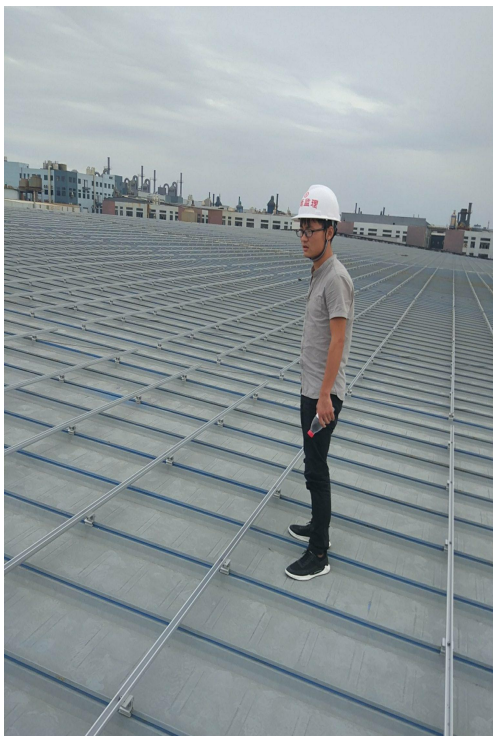专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		浙江华宇纸业 8mwp 分布式光伏发电项目夹具、导轨等已安装 60%，箱变基础施工已开始，其余材料均未进场；	1、夹具、导轨安装； 2、组件安装； 3、电缆敷设； 4、箱变基础施工； 5、并网验收；

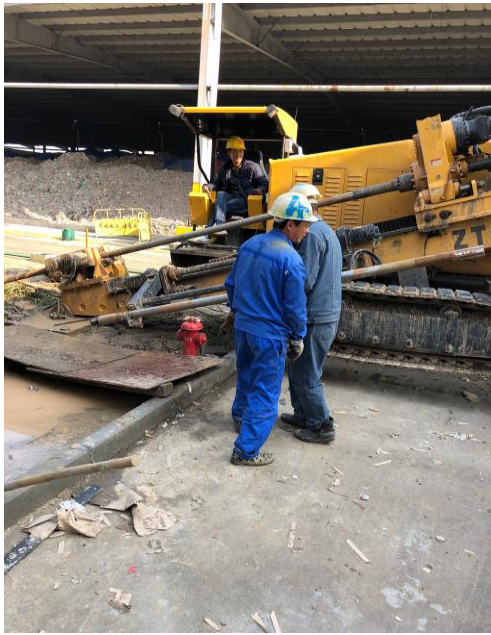

			
	设备交付进度	未完成	设备安装完成
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未完成	完成竣工图
	设计交底	未交底	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	未完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	配电房基础施工；	支架及组件安装；电缆敷设，电缆头制作及耐压试验；

	主要原材料质量	暂未进场；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

浙江华宇纸业 8mwp 分布式光伏发电项目进度百分比			
序号	名称	总预算金额（元）	完工百分比
1	组件	19634194.80	0%
2	逆变器	2529375.00	0%
3	EPC	16111168.00	30%

二、 安全文明施工情况

事故（起） 无			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外队伍人数
无	无	无	1	15 人	2	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源	要求施工单位合理安排施工计划，及时调整人力、

	配置，充分调动施工人员的积极性	物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

平湖昇茂新能源科技有限公司绍兴柯桥地区 20MWp

分布式光伏发电项目监理部

2017 年 11 月 30 日
