


监 理 月 报

工程名称：隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫项目 月次第一次表
开始时间2017 年 9 月 1 日 结束日期2016 年 8 月 25 日监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
专业	事项		本月重点工作情况	下月重点工作计划	
进度	 		一、初步验收及消缺整改 二、检测单位进行 三、电缆沟回填 四、消缺项 1、4 m²直流电缆规整固定； （多余电缆线放入支架凹槽中加以固定） 2、汇流箱、逆变器、25 电缆、240 电缆接地线安装到位；（汇流箱逆变器箱外接地进行有效连接） 3、汇流箱、逆变器、变压器开关箱电缆出入口出进行防火泥封堵； 4、跨列 4 m²	全面竣工验收；等检测报告	

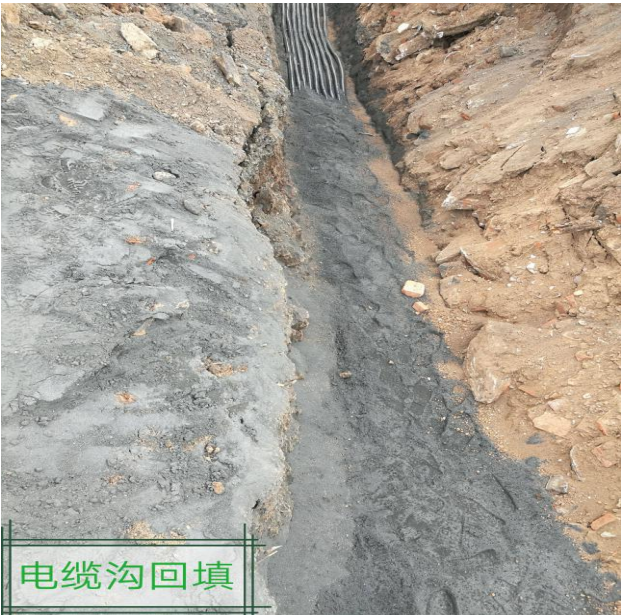

直流电缆穿保护管，并埋于地下；

5、电缆沟深度整改，电缆沟深度不达标的进行二次开挖整改；

6、接地环网连接支架的扁铁搭接面不符合规范，重新整改（搭接面需是全材料宽度的2倍，进行3面焊接）；

7、阵列直线接地扁铁搭接面不符合规范，且扁铁要埋于地下，重新整改；（搭接面需是全材料宽度的2倍，进行3面焊接）

8、接地扁铁刷防腐漆、黄绿线；

9、支架底座悬空问题整改处理（用1:1比例混泥土进行整改）；
组件接地线，直接螺丝复检；

10、支架拉杆整改；

11、坡上的现直接敷设在地上的25、4 m²电缆及时



处理：
12、现 场 场
地清理。



	设备交付进度	已全部到位	全部到位
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	技术交底	已交底	
	设计变更	无	

安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	要求所有整改消缺项符合设计要求及电力验规范	
	主要原材料质量	支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关

	设备质量	符合设计要求	进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度

一、 本月进度情况

序号	任务名称	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量 / 总量)	累计完成(完成量 / 总量)	备注
1	消缺整改	2017.9.1	9.25	90%	90%	

三、下月进度计划

序号	任务名称	施工开始日期	施工结束日期	下月实际完成	累计完成	备注
1	支架安装					完工
2	组件安装					完工
3	电气安装					完工

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	消缺整改	竣工验收事宜

安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	消缺整改项符合施工工艺和设计要求规范要求	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司
