

JXM16*: 监理月报

编号: JSJH-JLYB-006

监 理 月 报

工程名称: 嘉善地区 7.01538MWp 分布式光伏发电项目

(嘉善聚晖新能源有限公司)

2017 年 12 月 第 1 期

总监理工程师: 赵立良

监理项目部 (章):



报告日期: 2017 年 12 月 24 日


监理月报

1. 本月工程实施情况

工程名称	嘉善聚晖新能源分布式光伏发电项目
项目地址	嘉善工业园区
建设单位	嘉善聚晖新能源有限公司
设计单位	西安大唐电力设计研究院有限公司 浙江恒通电力设计有限公司
总包单位	浙江诺欧博新材料有限公司 浙江京禾电力工程技术有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
工程概况	嘉善聚晖新能源分布式光伏发电项目分 3 个厂区： 嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75KWp 分布式光伏发电项目，共有屋面 4 个（1 个水泥屋面，3 个彩钢瓦屋面）；位于嘉善县成功路 118 号。 嘉善聚晖新能源有限公司 1599.54KWp 分布式光伏发电。浙江宏嘉实业有限公司项目。1 个彩钢瓦屋面；位于嘉善县惠民街道惠新大道 8 号。 承田汽车配件工业（浙江）有限公司 332.13KWp 分布式发电项目，共 3 个屋面（1 个彩钢瓦，2 个水泥屋面），位于嘉善县人民大道灵秀路 50 号。

工程实施情况

嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75KWp 分布式光伏发电项目，目前组件支架、导轨、桥架、逆变器、汇流箱都已安装完成；光伏电缆接线完成；接入柜、箱变安装调试完成，等消缺完成后并网发电（预计 12 月 26 日）。

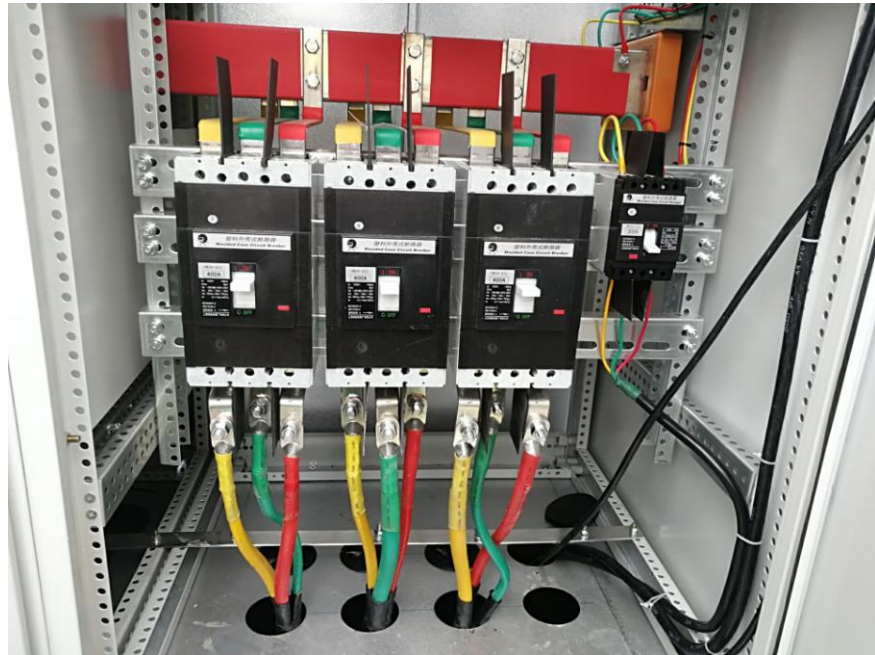

誉丰箱变低压接线完成

嘉善聚晖新能源有限公司 1599.54KWp 分布式光伏发电。浙江宏嘉实业有限公司项目。已于 2017 年 11 月 22 日并网发电。



宏嘉并网发电

承田汽车配件工业（浙江）有限公司 332.13KWp 分布式发电项目。水泥屋面与彩钢瓦屋面的导轨、支架、组件、汇流箱、逆变器都已安装完成，光伏电缆敷设完成。已于 12 月 23 日并网发电。



承田并网发电

2. 本月监理工作情况

由于现场没有项目部办公室，业主住在海宁不来现场及总包单位负责人也很少来现场，所以监理例会没法开，有事情也是电话、微信沟通。

到各个项目进行巡视检查现场施工质量及安全施工情况，审查总包单位及施工单位报审及施工资料，并整理完善监理资料。督促总包方加强现场施工安全管理及施工资料同步进行。

3. 工程存在问题及建议

关于安全问题（施工人员不正确佩戴安全帽等）督促总包方立即整改到位。

桥架的安装及现场所用的材料不符合验收规范。建议总包单位加强对现场施工队的技术交底及安全培训，对材料把好质量关，材料到场后组织监理部验收。

4. 下月监理工作重点

加强对现场的巡视力度，杜绝不文明施工的发生。要求总包单位负责人要每天到现场做好技术交底，确保工程保质的情况下顺利完成。要求对已完工的项目做好成品保护。

督促总包单位尽快上报施工资料。

新开项目巡视。
