

监 理 月 报

工程名称: 嘉善地区 7.01538MWp 分布式光伏发电项目

(嘉兴福昇新能源有限公司)

2017 年 11 月 第 1 期

总监理工程师: 赵克良

监理项目部 (章)



报告日期: 2017 年 11 月 01 日 - 11 月 30 日



监理月报

1. 本月工程实施情况


工程名称	嘉兴福昇新能源分布式光伏发电项目
项目地址	嘉兴新丰镇、大桥镇
建设单位	嘉兴福昇新能源有限公司
设计单位	浙江恒通电力设计有限公司
总包单位	浙江京禾电力工程技术有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
工程概况	<p>嘉兴福昇新能源分布式光伏发电项目分 2 个厂区：</p> <p>嘉兴市星源城镇建设开发有限公司 1305.72KWp 分布式光伏发电项目，共有屋面 4 个彩钢瓦与水泥混合屋面；位于浙江省嘉兴市南湖区大桥镇横岗路。</p> <p>浙江龙达实业股份有限公司 2.815KWp 分布式光伏发电项目，位于浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 289 号，共 5 屋面（其中 4 个彩钢瓦屋面，1 个水泥屋面在建）</p>

动
理
(



工程实施情况

浙江龙达实业股份有限公司 2.815KWp 分布式光伏发电项目，目前 4 个彩钢瓦屋面已于 10 月 18 日并网送电。水泥屋面要等龙达厂方业主主体验收后方可施工，具体时间不确定。

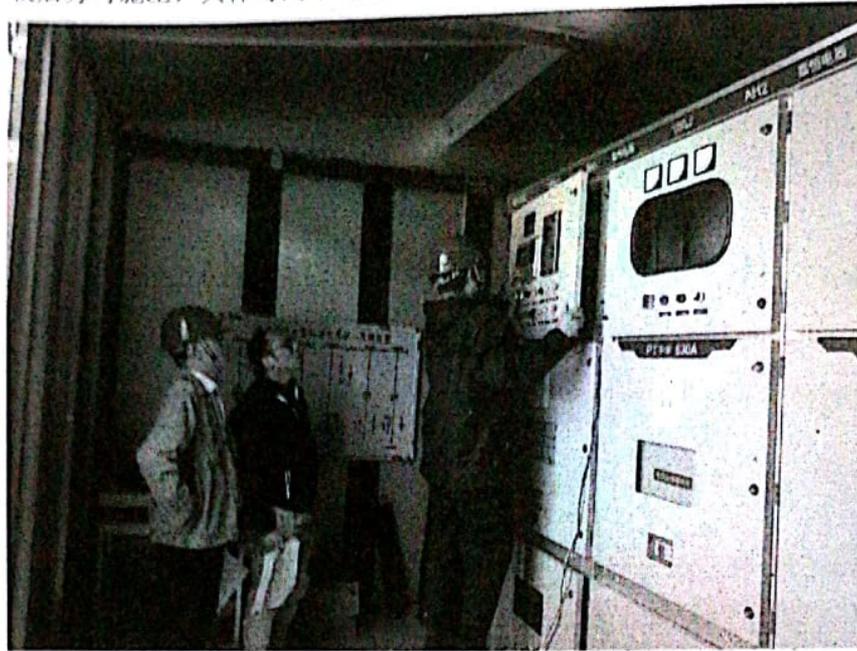

龙达调试并网送电

嘉兴市星源城镇建设开发有限公司 1305.72KWp 分布式光伏发电项目，目前彩钢瓦屋面夹具、导轨、桥架已经安装完成。并网柜、光伏接入柜已经安装完成并接好线。汇流箱、逆变器、组件安装完成；还有一个屋面由于漏水不让施工，还在协调过程中，具体时间还不能确定。



星源组件安装



2. 本月监理工作情况

由于现场没有项目部办公室，业主住在海宁不来现场及总包单位负责人也很少来现场，所以监理例会没法开，有事情也是电话、微信沟通。

审核总包单位的报审资料并整理监理资料。对不符合要求的让总包重新做。

3. 工程存在问题及建议

关于安全问题（施工人员不正确佩戴安全帽、现场抽烟等）督促总包方立即整改到位。

桥架的安装工艺不符合设计要求及验收规范，现场所用的材料不符合要求。

建议总包单位加强对现场施工队的技术交底及安全培训，对材料把好质量关，材料到场后组织监理部与建设方现场验收，合格后方可在本工程使用。

4. 下月监理工作重点

加强对现场的巡视力度，杜绝不文明施工的发生。

要求总包单位负责人要每天到现场做好技术交底，确保工程保证质量的情况下顺利完成。

督促总包单位施工资料要同步进行。

要求总包单位对龙达项目的消缺工作及时完成，并做好安全警示工作。

浙江中泰建设有限公司

