



正衡监理

编号: JL- (RJFP) -05

监 理 月 报

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

2018年1月第5期

项目监理部 (章)

总监理工程师: 苗得明



报告日期: 2018 年 1 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目 月次 第 5 次 月报开始时间 2017 年 12 月 31 日 结


束日期 2018 年 1 月 30 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目		影像	31 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 五龙村光伏扶贫电站 光伏组件20171231	九堡镇 1、松燕村光伏扶贫电站建设地点羊角小学: 并网发电。 2、下宋村光伏扶贫电站建设地点下宋小学: 并网发电。 3、石角村光伏扶贫电站建设地点石角小学: 并网发电。 4、塹下村光伏扶贫电站建设地点九堡	本工程 16 个乡镇 49 个贫困村的光伏扶贫电站全部建成, 并网验收。

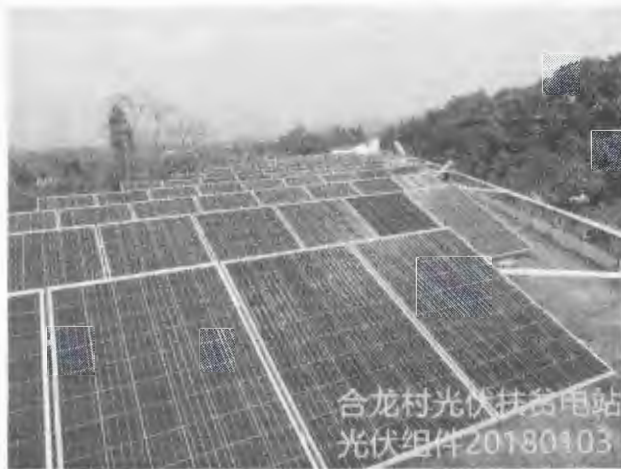

中学：并网发电。

5、
密溪村光伏扶贫电站建设地点官仓中学：并网发电。
瑞林镇

6、
大坪村光伏扶贫电站建设地点村委及居民楼：已并网发电。

7、
禾塘村光伏扶贫电站建设地点瑞林镇政府屋顶：已并网发电。

8、
上荒村光伏扶贫电站建设地点上荒小学：已并网发电。

9、
下坝村光伏扶贫电站建设地点下坝小学：临时并网发电。

10、
苏地村光伏扶贫电站建设地点苏地小学：已并网发电。
冈面乡

11、
陈坑村光伏扶贫电站建设地点陈坑



超田村光伏扶贫电站
光伏组件20170104



禾塘村光伏扶贫电站
电站整改工作20180105



下坝村光伏扶贫电站
光伏组件20180106

小学：临时并
网发电。

武阳镇

12、

安富村光伏
扶贫电站建
设地点安富
小学：已并网
发电。

13、

龙江村光伏
扶贫电站建
设地点龙江
小学：已并网
发电。

14、

珠坑村光伏
扶贫电站建
设地点居民
屋顶：已并网
发电。
谢坊镇

15、

瓦子村光伏
扶贫电站建
设地点瓦子
小学：已并网
发电。

16、乐村村
光伏扶贫电
站建设地点
乐村小学：已
并网发电。

17、新民村光
伏扶贫电站
建设地点新
民小学：已并
网发电。

18、

安背村光伏
扶贫电站建
设地点村委
居民屋顶：已



并网发电。

19、
旋龙村光伏扶贫电站建设地点居民屋顶：已并网发电。
万田乡

20、
茶亭村光伏扶贫电站建设地点居民屋顶：已并网发电。

21、
麻地村光伏扶贫电站建设地点居民屋顶：已并网发电。

叶坪乡

22、
山岐村光伏扶贫电站建设地点山岐幼儿园：已并网发电。

23、
合龙村光伏扶贫电站建设地点合龙小学：已并网发电。

24、
朱坊村光伏扶贫电站建设地点朱坊幼儿园：已并网发电。

25、
禾仓村光伏扶贫电站建设地点为立



新中学：已并网发电。

26、
大胜村光伏扶贫电站建设地点烟草站屋顶：已并网发电。

27、
马山村光伏扶贫电站建设地点为居民屋顶：已并网发电。

28、
仰山村光伏扶贫电站建设地点马山小学：已并网发电。




云石山乡

29、
超田村光伏扶贫电站建设地点营草纽扣公司：已并网发电。

30、
陂下村光伏扶贫电站建设地点陂下小学：已并网发电。

31、
田心村光伏扶贫电站建设地点居民屋顶：已并网发电。

沙洲坝镇

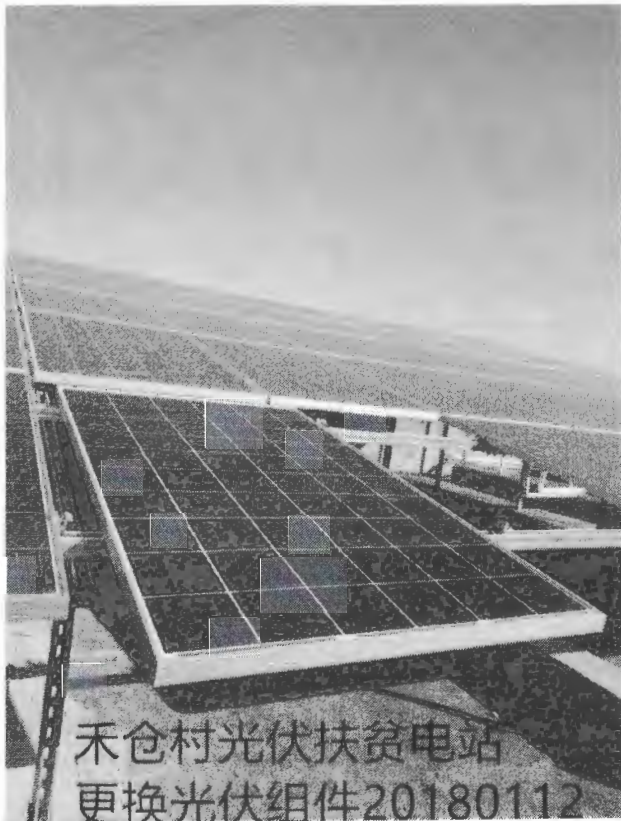

32、
大布村光伏



扶贫电站建设地点大布村新村委：已并网发电。

泽潭乡

33、

安治村光伏扶贫电站建设地点村委屋顶：农网改在，暂时无法并网。

34、

五龙村光伏扶贫电站建设地点居民屋顶：已并网发电。

日东乡

35、

湖陂村光伏扶贫电站建设地点湖陂小学：已并网发电。

拔英乡

36、

邱坑村光伏扶贫电站建设地点拔英小学：已并网发电。

大柏地乡

37、

杨古村光伏扶贫电站建设地点大柏地小学：已并网发电。

38、

横江村光伏扶贫电站建



茶亭村光伏扶贫电站
光伏组件20180116



马山村光伏扶贫电站
光伏组件20180117



朱坊村光伏扶贫电站
光伏组件20180118

设地点大柏地中学：已并网发电。

39、元坑村光伏扶贫电站建设地点居民屋顶：已并网发电。
黄柏乡

40、龙湖村光伏扶贫电站建设地点村委：已并网发电。

41、太坊村光伏扶贫电站已建成并网发电。

42、向阳村光伏扶贫电站建设地点上墩小学：已并网发电。
壬田镇

43、横坑村光伏扶贫电站建设地点横坑小学：已并网发电。


44、长胜村光伏扶贫电站建设地点村委屋顶：已并网发电。

45、桥岭村光伏扶贫电站建设地点烟草站：已并网发电。

 太坊村光伏扶贫电站 光伏组件20180119  上荒村光伏扶贫电站 光伏组件20180120  禾仓村光伏扶贫电站 光伏组件20180121	电。 46、 凤岗村光伏扶贫电站建设地点烟草站：已并网发电。 47、 洗心村光伏扶贫电站已建成并网发电。 48、 中潭村光伏扶贫电站已建成并网发电。 丁陂乡 49、 山潭村光伏扶贫电站建设地点山潭小学：已并网发电。
--	--





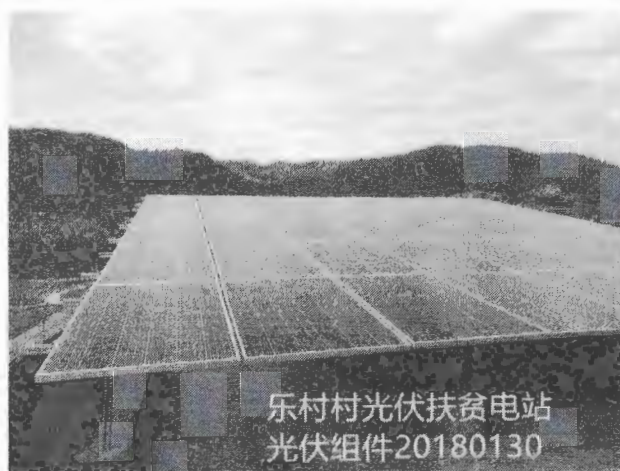

			柜等材料进场 全部安装完成 并验收
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	交付	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安 装，电缆桥架安 装，电缆敷设， 电缆头制作；逆 变器试验；	支架及组件安 装；电缆敷设， 电缆头制；逆变 器试验；

	主要原材料质量	支架外观检查 合格	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量		进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
江西润邦控股集团有限公司								
1	支架安装	2017、8、25	2017、9、5	2017、9、9	2017.11.24	2.235MW / 2.235MW	2.235MW / 2.235MW	
2	组件安装	2017、9、5	2017、9、15	2017、9、16	2017.11.29	2.235MW / 2.235MW	2.235MW / 2.235MW	

3	交流电缆	2017、9、15	2017、9、22	2017.9.26		2.235MW/2.235MW	2.235MW/2.235MW	
4	逆变器安装	2017、9、15	2017、9、22	2017、9、23		49 台	49 台/49 台	
5	配电箱	2017、9、15	2017、9、22	2017.10.1		49 台	49 台/49 台	
6	并网验收	2017、9、20	2017、9、25			2.185MW/2.235MW	2.185MW/2.235MW	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	支架安装	2017、8、25	2017、9、5			2.235MW/2.235MW		
2	组件安装	2017、9、5	2017、9、15			2.235MW/2.235MW		
3	交流电缆	2017、9、15	2017、9、22			2.235MW/2.235MW		
4	逆变器安装	2017、9、15	2017、9、22			49 台		
5	配电箱	2017、9、15	2017、9、22			49 台		
6	并网验收	2017、9、20	2017、9、25			2.235MW/2.235MW		

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件（份）	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
							数量	数
无	无	无		10 人		/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及国家电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目监理部

2018 年 1 月 30 日
