



编号: ZHJL-JLYB-003

监 理 月 报

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

2017 年 11 月

项目监理部 (章):

总监理工程师: 薛生财



报告日期: 2017 年 11 月 28 日

监 理 月 报

工程名称: 山东华轮实业 3MW 布式光伏发电项目 月次 03 月报开始时间 2017 年 11 月 01 日 结束日期 2017 年 11

月 30 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目		影像	72 份	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		箱变基础接地焊接	
		固定松动桥架	



二次舱接线检查



逆变器防火封堵




安装箱变防护栏




汇流箱防火封堵及电
缆挂牌



配电室墙体粉刷

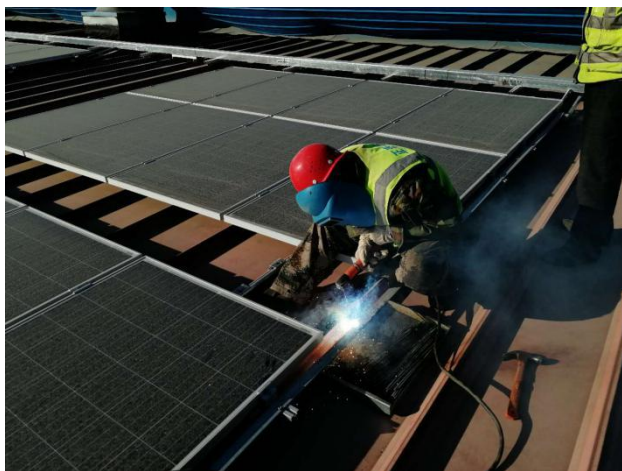

接地扁铁焊接

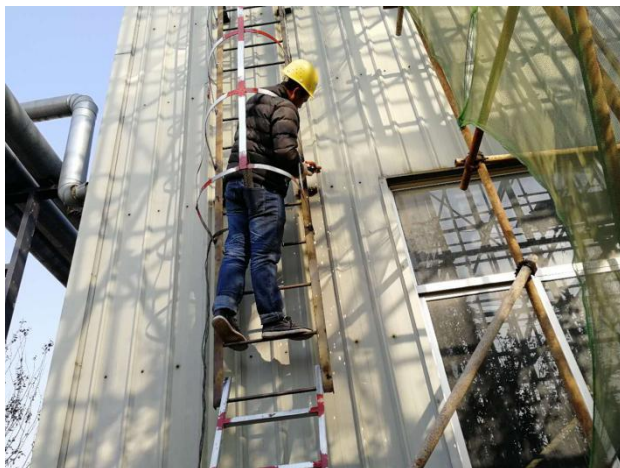

焊接爬梯防护栏



修补屋面



防雷接地网制作

设备交付进度

设计交付进度

质量体系运作情况

施工图会审

电子图纸

质量体系健全，运行良好

无

电子图纸

落实质量保证体系，并对运行情况进行检查

	设计交底	无	
	方案审查	部分已交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	桥架安装、接地焊接、汇流箱安装、电缆头制作及耐压试验；箱式变压器、逆变器试验及调试。	屋面修补、防雷接地网制作
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	甲供材料，合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/

合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序	任 务 名 称	计 划 开 始 时间	计划结束 时间	施 工 开 始日期	施工结束 日期	下 月 计 划 完 成 （ 完 成 量 / 总 量）	本月实际 完成（完 成 量 / 总 量）	权值
信邦建设								
1	汇集站	2017.11.01	2017.11.15	2017.11.01	2017.11.15		100%	
2	接入柜， 母线槽	2017.11.15	2017.11.20	2017.11.15	2017.11.20		100%	
3	逆变器以 及汇流箱 接线	2017.11.01	2017.11.10	2017.11.01	2017.11.10		100%	
4	屋面桥架 盖板	2017.11.01	2017.11.30	2017.11.01	2017.11.30		100%	
5	屋面防雷 接地	2017.11.10	2017.11.30	2017.11.01			100%	

三、 下月进度计划

序 号	任 务 名 称	计 划 开 始 时间	计划结束 时间	施 工 开 始日期	施工结束 日期	下 月 计 划 完 成 （ 完 成 量 / 总 量）	本月实际 完成（完 成 量 / 总 量）	权值
信邦建设								
1	屋面修补	2017.11.25	2017.12.05			100%		
2	防雷接地 网制作	2017.11.10	2017.12.05			100%		
3								
4								
5								

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件（份）	人数	分包队	分包队	系统外包	系统外队伍
伤	备	故			伍数量	伍人数	队伍数量	人数
无	无	无		9 人	1	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及浙江正泰的规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理		
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	继续协调物资到货时间

常州正衡电力工程监理有限公司

山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目监理部

2017 年 11 月 28 日
