

正衡监理

编号: ZHHL-JLYB-001

监 理 月 报

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

2017 年 9 月

项目监理部 (章):

总监理工程师: 薛生财



报告日期: 2017 年 09 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目 月次 01 月报开始时间 2017 年 9 月 8 日 结束日期 2017 年 9 月


30 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目		影像	109 份	

一、 监理重点工作情况


专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		入场搭设脚手架、吊装平台。	

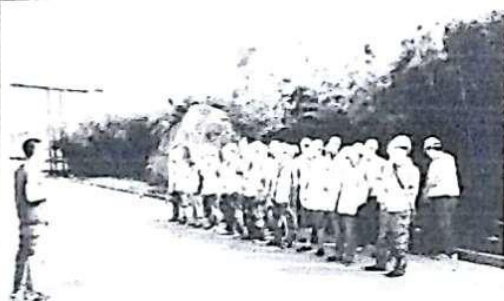

2017.09.11 对施
工人员进行安
全技术交底。



2017.09.12 在项
目现场进行第
一次监理例会。

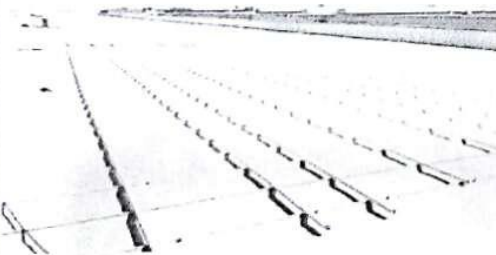

2017.09.13 安装
支架



2017.09.17 搭接
女儿墙防护网。

	2017.09.20 整改 不合格夹具。	
	2017.09.19 日常 巡视。	
	2017.09.29 接地 网焊接	
	2017.09.30 焊接 防雷接地	

		2017.09.30 浇筑 箱变基础垫层。	
	设备交付进度	支架、组件、扁铁、电缆、部分汇流箱等进场	桥架、剩余汇流箱、箱变、逆变、SVG 进场
	设计交付进度	电子图纸	电子图纸
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	无	
	设计交底	无	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	

安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安装、接地网焊接、箱变基础浇筑垫层。	支架及组件安装、桥架安装、电缆敷设、箱变基础砌筑、接地焊接、汇流箱安装、
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	甲供材料，合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/

	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
信邦建设								
1	定位放线	2017.09.09	2017.09.18	2017.09.09	2017.09.18	100%	100%	
2	支架安装	2017.09.09	2017.09.27	2017.09.09	2017.09.27	100%	100%	
3	组件安装	2017.09.19	2017.10.10	2017.09.19		60%	60%	
4	箱变基础	2017.09.24	2017.10.15	2017.09.24		20%	20%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成(完成量/总量)	本月实际完成(完成量/总量)	权值
信邦建设								
1	组件安装	2017.10.09	2017.10.13			100%		
2	箱变基础	2017.10.01	2017.10.15			80%		
3	桥架安装	2017.10.10	2017.10.17			95%		
4	接地焊接	2017.10.20	2017.10.30			95%		
5	配电房电缆沟开挖	2017.10.01	2017.10.10			100%		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		30 人	1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组作到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及浙江正泰的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理		
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	继续协调物资到货时间

常州正衡电力工程监理有限公司

山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目监理部

2017 年 9 月 30 日
