



正衡监理

编号: JL-(XZHS)-02


监 理 月 报

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地屋顶分布式光伏发电项目

2017 年 10 月第 2 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 金生文



报告日期: 2017 年 10 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 西安杭泰皓森屋顶分布式光伏发电项目 月次 第 2 次 月报开始时间 2017 年 10 月 01 日

结束日期 2017 年 10 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	<u>西安杭泰皓森屋顶分布式光伏电站项目</u>		影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

专 业	事 项	本 月 重 点 工 作 情 况	下 月 重 点 工 作 计 划
进 度		数控中心、精铸 厂房屋顶组件 安装完成, 逆变 器汇流箱安装 完成, 并网柜搭 接完成.	无

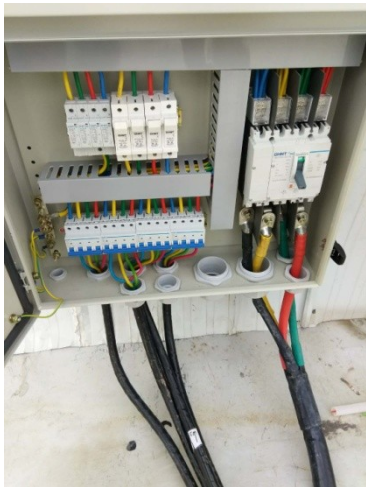

	 			
	设备交付进度	无	/	
	设计交付进度	图纸完成	/	
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	/	
	施工图会审	完成		
	设计交底	完成		
	方案审查	已审查	/	
	技术交底	完成		
	设计变更	无		
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	/	
	安全交底情况	督促施工单位	/	

		对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	/
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	/
质量	主要工序质量	逆变器、并网柜、二次接线调试、并网。	/
	主要原材料质量	/	/
	构（配）件质量	/	/
	设备质量		/
	质量验评情况	工序施工符合要求	/
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	/

本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	定位放线						100%	
2	角驰夹具						100%	
3	支架安装	2017.10.01	2017.10.20	2017.10.01	2017.10.17		100%	
4	组件安装	2017.10.01	2017.10.20	2017.10.01	2017.10.17		100%	
5	电缆桥架	2017.10.01	2017.10.30	2017.10.18	2017.10.25		100%	
6	直流电缆 4*16mm 2	2017.10.01	2017.10.30	2017.10.22	2017.10.24		100%	
7	高压电缆 4*150 敷设	2017.10.01	2017.10.30	2017.10.15	2017.10.16		100%	
8	逆变器安装	2017.10.01	2017.10.30	2017.10.17	2017.10.21		100%	
9	汇流箱安装	2017.10.01	2017.10.30	2017.10.17	2017.10.21		100%	
10	并网柜安装	2017.10.01	2017.10.30	2017.10.18	2017.10.20		100%	

二、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线						100%	
2	角驰夹具						100%	
3	支架安装						100%	
4	组件安装						100%	
5	电缆桥架			/	/		100%	

6	直流电缆 4*16mm2			/	/		100%	
7	高压电缆 4*150 敷 设						100%	
9	逆变器安 装						100%	
10	汇流箱安 装						100%	
11	并网柜						100%	

三、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		28 人	/	/	/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	配合建设单位做好并网前准备工作。要求 施工单位合理安排施工进度计划，及时调 整人力、物力	
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制 度》，， 落实安全文明施工措施。	
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施 工项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底， 现场检查施工人员是否按照技术交底内 容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的

		工程量清单、进度款支付申请
物资供应	督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司
西安杭泰皓森屋顶分布式光伏发电项目监理部

2017 年 10 月 31 日
