



正衡监理


编号: ZHJL-JLXM-005

监 理 月 报

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏发电项目

2018 年 04 月第 5 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 纪现壮

报告日期: 2018 年 04 月 26 日

监 理 月 报

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程



月次 第 5 次 月报开始时间 2018 年 03 月 26 日 结束日期 2018 年 04 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程		影像		

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		(1) 外线电缆沟完成 100%; (2) 除物流车间屋面西面其余 4 个车间 (焊装、冲压、总装、交检) 屋面支架安装完成, 累计完成 90%; (3) 除物流车间屋面西面其余 4 个车间 (焊装、冲压、总装、交检) 屋面组件进行安装完成。累计完成 90%; (4) 除	1. 并网发电 2. 消缺整改

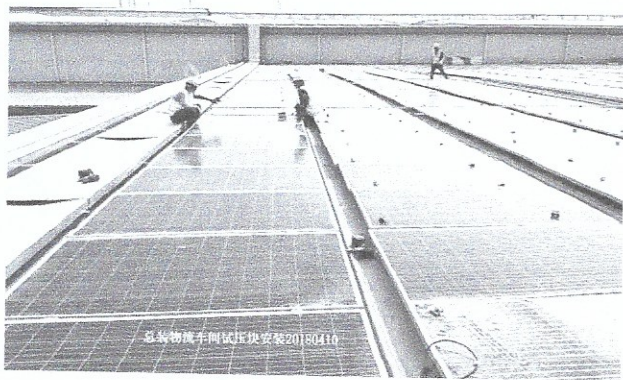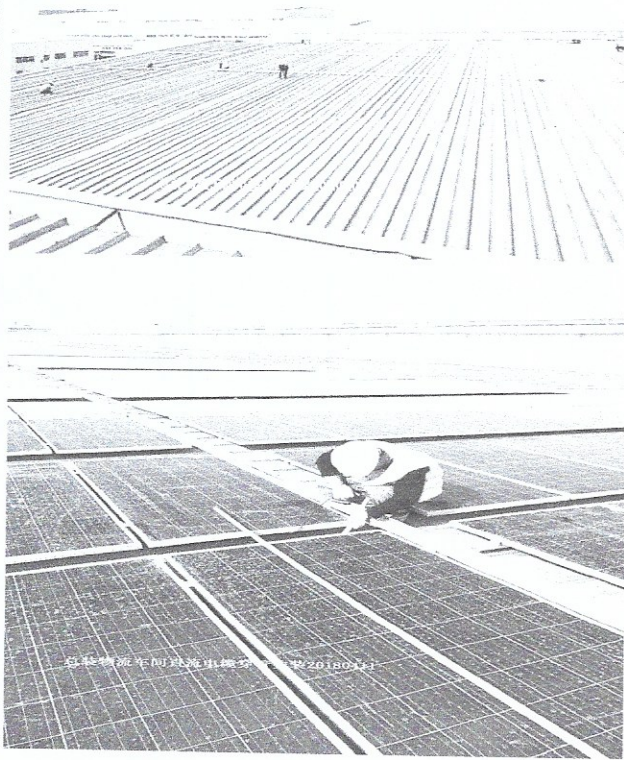


物流车间屋面西面其余4个车间（焊装、冲压、总装、交检）屋面桥架进行安装，累计完成90%；

（5）已完成，累计完成100%；

（6）箱逆变1#-8#，一次、二次预制舱，SVG箱基础四周场平，夯土，打散水，做台阶已完成

（7）自动化，逆变厂家进场调试设备。

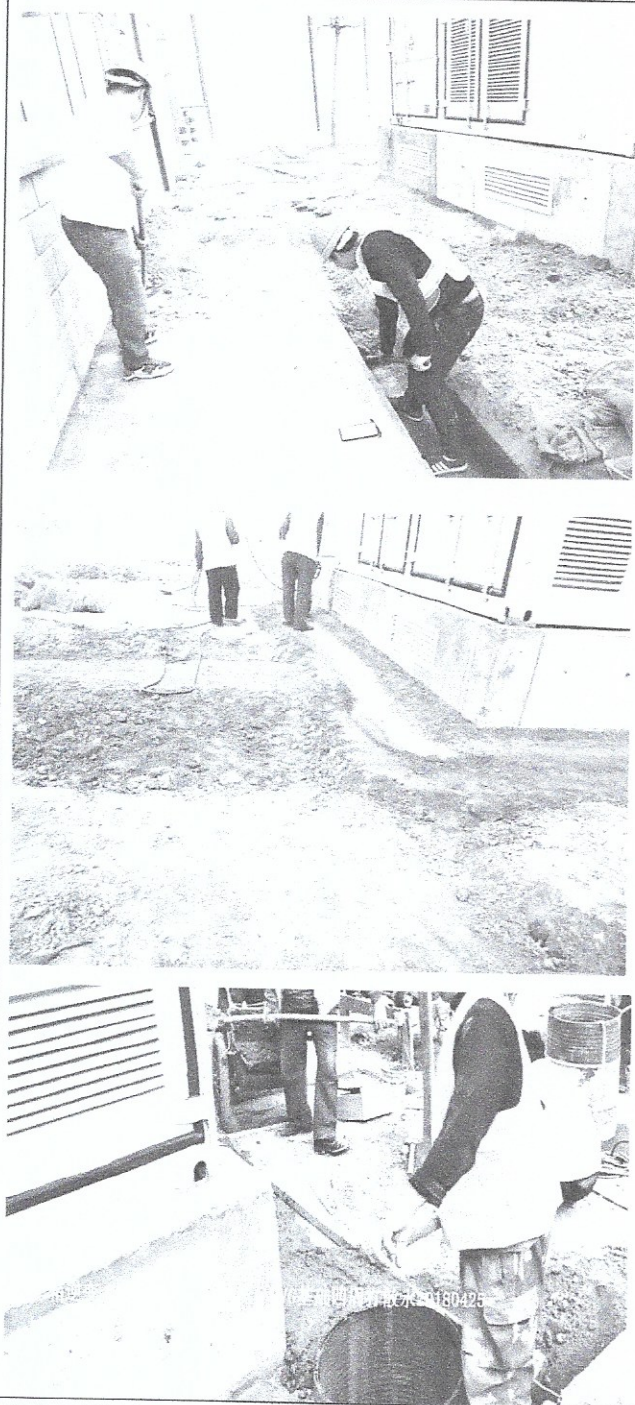				
设备交付进度	交付	无		
设计交付进度	全部蓝图交付	图纸全部交付		
质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查		
施工图会审	完成			
设计交底	完成			
方案审查	已完成			
技术交底	完成	加强组件安装与电缆敷设技		

			术交底
	设计变更	物流、焊装车间 15处烟囱位置 设计变更	已施工完成
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	每天上班前进 行安全交底
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	每天安全班前 喊话及交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	完成
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	现场垃圾及时 清理，集中堆放
质量	主要工序质量	支架及组件安 装螺栓必须紧 固到位	桥架部分部位 毛刺必须处理 到位
	主要原材料质量	良好，个别组件 开箱检查发现 破损	定期检查材料 质量
	构（配）件质量	良好	良好
	设备质量	无	外观检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	验收符合要求
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始 时间	计划结束 时间	施工开始 日期	施工结 束日期	本月实 际完成 (完成 量 / 总 量)	累计完 成(完成 量 / 总 量)	备注
1	组件安装	2017.11.10	2017.12.25	2017.11.20		1mw/8. 8mw	8mw/8.8 mw	
2	桥架安装		2017.12.25				90%	
3	设备基础 硬化、台阶	2018.04.15	2018.04.21	2018.04.17				

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成(完成量/总量)	本月实际完成(完成量/总量)	权值
1	并网发电	/	/	/	/	/	/	

四、 安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	搅拌机 1 台, 电焊机 1 台	无	无	12 人	2	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置, 充分调动施工人员的积极性	光伏区进入全面施工施工, 严查施工质量
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》, 安委会要定期对现场进行安全检查; 对施工人员进行安全培训、考试, 提高作业人员安全防范意识, 落实安全文明施工措施。	实施安全监理, 发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查; 单位工程重点部位施工进行旁站; 督促施工单位质量通病防治措施; 监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底, 现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会, 监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量, 及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作, 督促施工单位做好物资保管工作, 要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查, 确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求, 安排人员、机具进行施工。

山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程监理项目部

2018 年 04 月 26 日
