



编号: ZHJL-JLXM-004

监 理 月 报

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏发电项目

2018 年 01 月第 4 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 纪现壮

报告日期: 2018 年 01 月 26 日

监 理 月 报

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程




月次 第 5 次 月报开始时间 2018 年 12 月 26 日 结束日期 2018 年 01 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程		影像		

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	(1) 除物流车间其余四个屋面已施工完成, 现阶段进行消缺整改, 整理资料; (2) 物流车间屋面: 支架安装完成, 桥架安装完成 (未盖板), 直流电缆和光伏电缆敷设完成, 接地完成 50%, 剩余组件安装及电气接线。 (3) 通信方面: 现业主方正与电力局进行沟通协调, 近期会有明确	(1) 物流车间桥架安装完成, 接地完成 (2) 厂房加固完成, 焊接施工过后存在的色差补漆刷漆消缺整改完成。

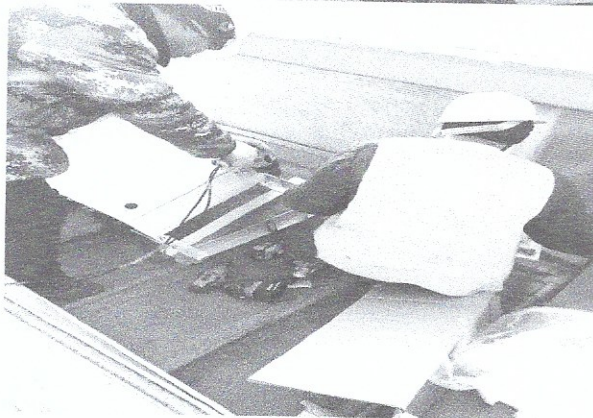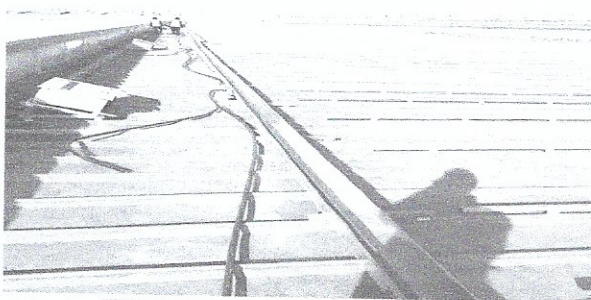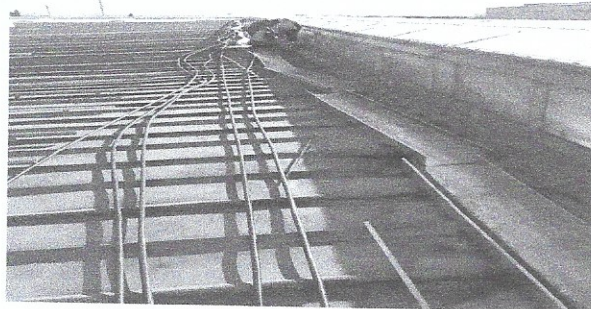

答复，并确定并网发电时间。

(4) 厂房加固：完成 90%，同时进行焊接施工过后存在的色差补漆刷漆消缺整改措施，现剩余无法施工区域及相对较难施工区域，业主方正与设计院进行沟通协调，落实是否取消该区域施工。

设备交付进度	交付	无
设计交付进度	全部蓝图交付	图纸全部交付
质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
施工图会审	完成	
设计交底	完成	
方案审查	已完成	
技术交底	完成	加强组件安装与电缆敷设技术交底
设计变更		已施工完成

安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	每天上班前进行安全交底
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	每天安全班前喊话及交底
	安全措施落实情况	落实不彻底,已要求施工单位认真落实	完成
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	现场垃圾及时清理,集中堆放
质量	主要工序质量	支架及组件安装螺栓必须紧固到位	桥架部分部位毛刺必须处理到位
	主要原材料质量	良好,个别组件开箱检查发现破损	定期检查材料质量
	构(配)件质量	良好	良好
	设备质量	无	外观检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	验收符合要求
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	直流电缆敷设					50%		
2	光伏电缆敷设					50%		
3	厂房加固					90%		
4								
5								
6								

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1								
2	支架安装	2017.11.05	2017.12.25	2017.11.05			7mw/8.8MW	
3	组件安装	2017.11.10	2017.12.25	2017.11.10		8.8MW/8.8MW	7mw/8.8mw	
4	直流电缆	2017.11.15	2017.12.25	2017.11.15		8.8mw/8.8mw	7.9mw/8.8mw	
5	厂房加固		2017.12.25			100%	90%	
6	接地敷设	2017.11.10	2017.12.25	2017.11.10			8mw/8.8mw	

四、 安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外分包队伍数量	系统外队伍人数
无		无	无	16人	2	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置,充分调动施工人员的积极性	光伏区进入全面施工施工,严查施工质量
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》,安委会要定期对现场进行安全检查;对施工人员进行安全培训、考试,提高作业人员安全防范意识,落实安全文明施工措施。	实施安全监理,发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查;单位工程重点部	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要

	位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程监理项目部

2018 年 01 月 26 日
