

编号: JXM15--002

监 理 月 报

工程名称: 江西新余木林森 16.7 兆瓦分布式屋顶发电项目

2017 年 11 月 第 2 期

总监理工程师: 1611 峰

监理项目部(章)

2017 年 11 月 30 日



监 理 月 报

1、本月工程实施情况

一期施工：

1、综合楼支架安装完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之二十五，逆变器安装完成百分之百，汇流箱安装完成百分之百。

2、1号厂房支架安装完成百分之五十五，直流电缆桥架安装完成百分之十五逆变器安装完成百分之百，汇流箱安装完成百分之百。

3、2号厂房支架安装完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之十，逆变器安装完成百分之百，汇流箱安装完成百分之百。

4、3号厂房支架安装完成百分之九十五，直流电缆桥架安装完成百分之十，逆变器安装完成百分之百，汇流箱安装完成百分之百。

5、4号厂房支架安装完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之八，逆变器安装完成百分之百，汇流箱安装完成百分之百。

6、5号厂房支架安装完成百分之八十五，直流电缆桥架安装完成百分之十逆变器安装完成百分之百，汇流箱安装完成百分之百。

7、6号厂房支架安装完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之二十逆变器安装完成百分之百，汇流箱安装完成百分之百。

8、7号厂房支架安装完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之十五，逆变器安装完成百分之百，汇流箱安装完成百分之百。

9、8号厂房支架安装完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之五。

10、9 号彩钢瓦支架安装完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之百，导轨支架防雷接地安装完成百分之七十五，4 平方电缆铺设完成百分之五十。

11、10 号彩钢瓦支架安装完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之百，导轨支架防雷接地安装完成百分之八十，4 平方电缆铺设完成百分之五十。

三期施工：

1、7 号厂房支架安装完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之百，交流电缆桥架安装完成百分二十八，导轨支架防雷接地安装完成百分八十，逆变器安装完成百分之六十五，4 平方电缆铺设完成百分之百。

2、8 号厂房支架安装完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之百，交流电缆桥架安装完成百分二十，导轨支架防雷接地安装完成百分百，逆变器安装完成百分之七十，4 平方电缆铺设完成百分之百。

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

因现场施工已进入冬季，且项目现场雨水较多，监理项目部要求施工单位，利用晴朗天气，及时增配人员及机械，做好施工倒排计划；加快落实设备材料进场时间。力求在 12 月 30 号之前完成业主要求，实现并网。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月现场一三期设计图纸全部到场，由于材料进场滞后，监理项目内部组织图纸预检会议，熟悉图纸；同时对一期已安装完成水泥屋面支架进行检查，并提出整改意见。同时针对现场设备之间破路电缆穿线及关于现场设计变更事宜下发工作联系单。要求施工单位严格按照设计要求及规范进行施工。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

由于现场施工即将进入 12 月份，监理项目部要求施工单位必须制定出冬季施工预案，同时必须向现场施工人员配备相应的劳保工具。设备卸车及吊装过程中，提前做好安全技术交底工作。注意周边施工环境，确保施工安全；

3、工程存在问题及建议

现场彩钢瓦屋面檩条增加夹具事宜，望施工单位尽快与设计进行沟通，并及时出具相关文件；

4、下月监理工作重点

4.1 工程管理方面的监理工作重点

预计下月项目设备将全部到场，组件亦依次进场；为争赶并网节点，现场施工将全面开展；监理项目部重点对 SVG 等设备基础进行监督，对厂区设备之间破路电缆穿线施工进行把控；同时对电缆敷设等隐蔽工程进行验收。现场配合电气施工人员进行并网。确保现场施工有序进行。


4.2 项目监理机构内部管理方面的工作重点

下月监理项目部结合现场实际施工情况，内部人员将分专业、分区域对整个现场施工进行全面监督。同时完善内部监理资料。对公司内部推崇的监理云操作流程进行熟悉。

5、形象进度



三期厂房内高压电缆分接箱设备吊装

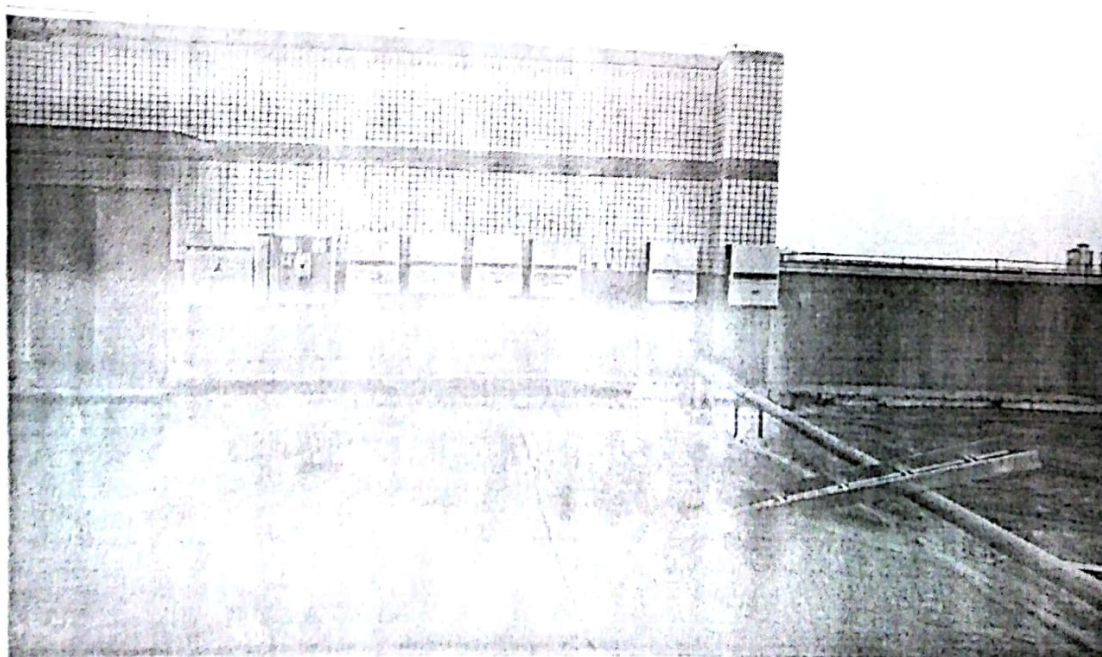

一期2号移逆变器、直流箱安装完成
