



正衡监理

编号: ZJTZ-09

监 理 月 报

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏
发电项目

2018 年 7 月 第 9 期

项目监理部 (章)

总监理工程师: 梅波

报告日期: 2018 年 7 月 30 日

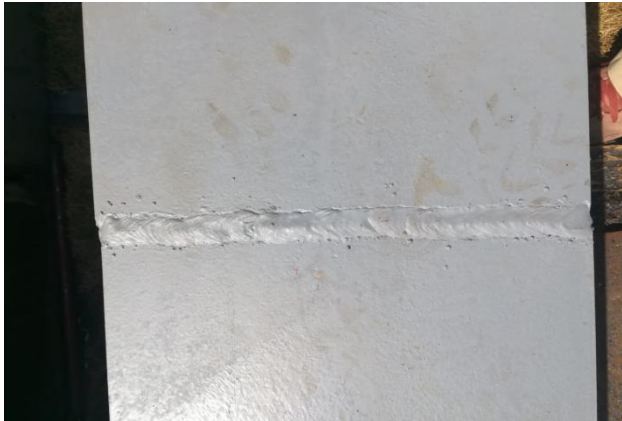
监 理 月 报

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 月次 第
9 次。月报开始时间 2018 年 7 月 1 日 结束日期 2018 年 7 月 31 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目		影像	19 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		焊装车间屋面、总装车间屋面、生产车间屋面扶栏与检修人行道施工和焊装车间、总装车间、生产车间三处钢楼梯基础施工。	焊装车间屋面、总装车间屋面、生产车间屋面扶栏与检修人行道施工和焊装车间、总装车间、生产车间三处钢楼梯焊装与吊装施工。

	  		
设备交付进度		无	无

	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未会审	未会审
	设计交底	未交底	未交底
	方案审查	已交付	已交付
	技术交底	未交底	未已交底
	设计变更	无	无
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	扶栏与检修道安装。钢楼梯基础施工、钢楼梯焊接与吊装。	扶栏与检修道安装。钢楼梯基础施工、钢楼梯焊接与吊装。
	主要原材料质量	夹具外观质量合格，支架外观检查合格，钢筋观感质量合格；模板检查合格；	对主要材料进行检查

	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	无	无
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
	款项支付情况	无	无
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序 号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始 日期	施 工 结 束日期	本 月 实 际 完 成 (完 成 量 / 总 量)	累 计 完 成(完成 量 / 总 量)	备注
信邦建设工程有限公司与陕西顺协盈建筑工程有限公司								
1	焊装车间 屋面扶栏	2018.7.5	2018.7.15	2018.7.5	2018.7.15	100%	100%	
2	焊装车间 屋面检修 人行道	2018.7.5	2018.7.15	2018.8.1	2018.8.23	0%	0%	
3	生产准备 车间屋面 扶栏	2018.7.6	2018.7.15	2018.7.6	2018.7.23	100%	100%	
4	生产准备 车间屋面 检修人行 道	2016.6.23	2018.6.30	2018.6.23	2018.6.30	60%	60%	
5	总装车间 屋面检修 人行道	2018.7.10	2018.7.30	2018.7.15	2018.7.30	50%	50%	
6	总装车间 屋面扶栏	2017.10.15	2017.11.15	2017.10.19	2017.12.15	100%	100%	

7	焊装车间 屋面钢楼梯	2017.10.15	2017.11.15	2017.10.28	2017.12.25	100%	100%	
8	生产准车 间屋面钢 楼梯	2017.10.15	2017.11.15	2017.10.28	2017.12.25	100%	100%	
9	总装车间 屋面钢楼 梯	2017.11.10	2017.11.30	2017.10.30	2017.12.20	100%	100%	

三、 下月进度计划

序 号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始 日期	施 工 结 束日期	本 月 实 际 完 成 (完 成 量 / 总 量)	累 计 完 成(完成 量 / 总 量)	备注
信邦建设工程有限公司与陕西顺协盈建筑工程有限公司								
1	焊装车间 屋面扶栏	2018.7.5	2018.7.15	2018.7.5	2018.7.15	100%	100%	
2	焊装车间 屋面检修 人行道	2018.7.5	2018.7.15	2018.7.5	2018.7.15	100%	100%	
3	生产准备 车间屋面 扶栏	2018.7.6	2018.7.15	2018.7.6	2018.7.15	100%	100%	
4	生产准备 车间屋面 检修人行 道	2018.7.18	2018.7.30	2018.7.18	2018.7.30	100%	100%	
5	总装车间 屋面检修 人行道	2018.7.10	2018.7.17	2018.6.10	2018.6.17	100%	100%	
6	总装车间 屋面扶栏	2018.6.23	2018.7.5	2018.6.23	2018.7.5	40%	100%	
7	焊装车间 屋面钢楼 梯	2018.7.15	2018.7.30	2018.7.15	2018.7.30	100%	100%	
8	生产准车 间屋面钢	2018.7.15	2018.7.15	2018.7.28	2018.7.30	100%	100%	

	楼梯							
9	总装车间 屋面钢楼梯	2018.7.10	2018.7.30	2018.7.30	2018.7.30	100%	100%	

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	无	19 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好屋面扶栏，检修人行道，钢楼梯制用与吊装工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	附属工程材料进场检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工

技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照工作进度要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目

项目监理部

2018年7月30日
