



编号: ZJTZ-012

监 理 月 报

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏
发电项目

2018 年 10 月 第 12 期

项目监理部 (章)

总监理工程师:



报告日期: 2018 年 10 月 30 日


监 理 月 报

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 月次 第
9 次。月报开始时间 2018 年 10 月 1 日 结束日期 2018 年 10 月 31 日 监理
单位：常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	浙江金刚汽车路桥 V 项目 基地 12MW 分布式光伏发电 项目		影像	4 张	

一、 监理重点工作情况

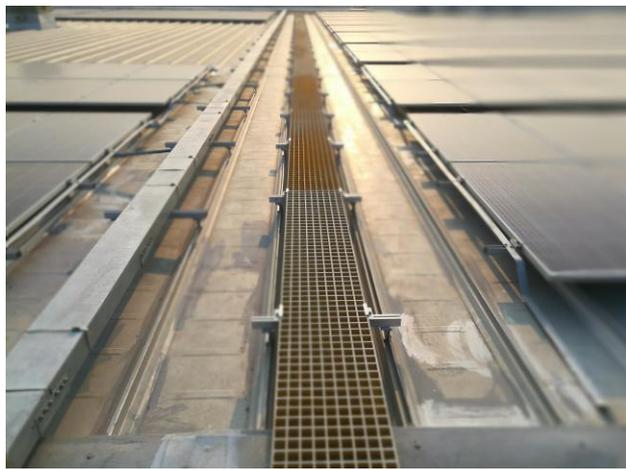专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		4 m ² 电缆 及屋面接 地扁铁架 空消缺。 换草皮施 工。	审核施工单位 提的竣工资 料，准备竣工 验收，提交监理 归档资料。

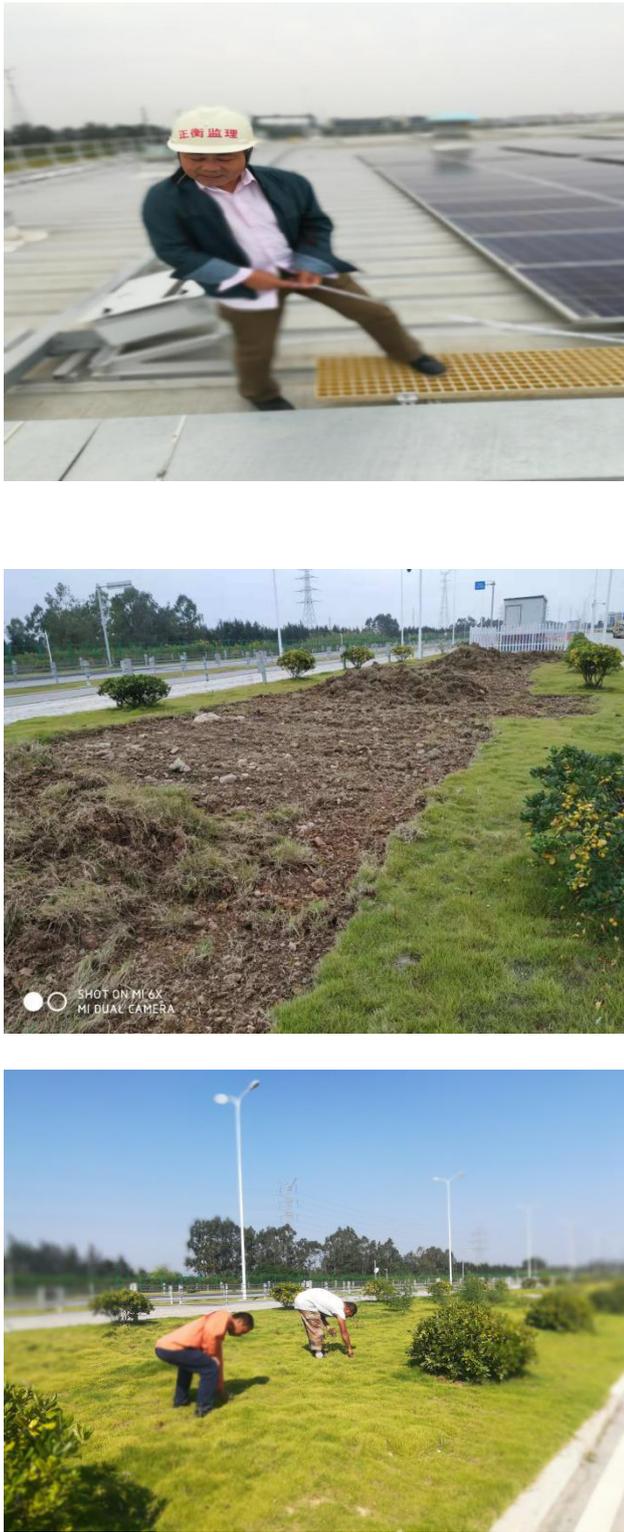

			
	设备交付进度	无	无
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全,	落实质量保证

		运行良好	体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未会审	未会审
	设计交底	未交底	未交底
	方案审查	已交付	已交付
	技术交底	未交底	未已交底
	设计变更	无	无
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	扶栏与检修道安装。钢楼梯基础施工、钢楼梯支架焊接与吊装。	扶栏与检修道安装。钢楼梯基础施工、钢楼梯支架焊接与吊装。
	主要原材料质量	夹具外观质量合格，支架外观检查合格，钢筋观感质量合格；模板检查合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量	把控好进场材

		合格	料质量关
	设备质量	无	无
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
	款项支付情况	无	无
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
信邦建设工程有限公司与陕西顺协盈建筑工程有限公司								
1	生产准备车间屋面检修人行道	2018.7.5	2018.8.15	2018.7.5	2018.8.15	2 100%	100%	
2	焊装车间屋面检修人行道	2018.7.5	2018.7.15	2018.8.5	2018.8.17	100%	100%	
3	生产准备车间屋面扶栏	2018.7.6	2018.7.15	2018.7.6	2018.7.23	100%	100%	
4	生产准备车间屋面清洗系	2018.8.18	2018.8.31	2018.8.18	2018.8.31	100%	100%	
5	焊装车间屋面清洗系统	2018.8.18	2018.8.31	2018.8.18	2018.8.31	100%	100%	
6	总装车间屋面清洗系统	2018.8.18	2018.8.31	2018.8.18	2018.8.31	100%	100%	
7	钢楼梯	2018.6.10	2018.8.25	2018.8.25	2018.8.25	100%	100%	未消缺

8	三个屋面的4 m ² 电缆线与接地扁铁架空	2018.9.10	2018.10.25	2018.9.10	2018.10.25	100%	100%	
9	换草皮	2018.10.21	2017.10.27	2018..10.27	2018.10.27	100%	100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
信邦建设工程有限公司与陕西顺协盈建筑工程有限公司								
1	审核资料	2018.10.1	2018.10.16	2018.10.1	2018.10.16	80%	80%	
2	准备竣工验收	2018.10.1	2018.10.16	2018.10.16	2018.10.16	0%	0%	
3								

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	无	8人	/	/	/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好三个屋面接地扁铁和组件 4 m ² 电缆线架空施工，提交资料，准备竣工验收。
安全管理	定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工及做好竣工资料。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应		

常州正衡电力工程监理有限公司

浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目

项目监理部 2018 年 10 月 31 日
