



编号: JL-(XYWDH)-03

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

2018年4月第3期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 刘士俊

报告日期: 2018年4月30日

2018/5/2 07:51

监 理 月 报

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 月次 第3次 月报开始时间 2018年4月15日
 结束日期 2018年4月30日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		影像	12张	


一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 <p style="text-align: center; color: red;">工人未佩戴安全帽</p>	河口村支架立柱安装完成；小五站镇四个村桩基放线完成；正阳、勃信、开发、立新、吉兴河、仁兴、中和、生产、岱山、团结等 10 个村级电站逆变器汇流箱配套电缆就位，已开始敷设电缆沟，接地扁铁焊接。	，河口支架组件安装；小五站镇四个村打桩；正阳、勃信、开发、立新、吉兴河、仁兴、中和、生产、岱山、团结等 10 个村级电站电气工程安装





团结村汇流箱检查

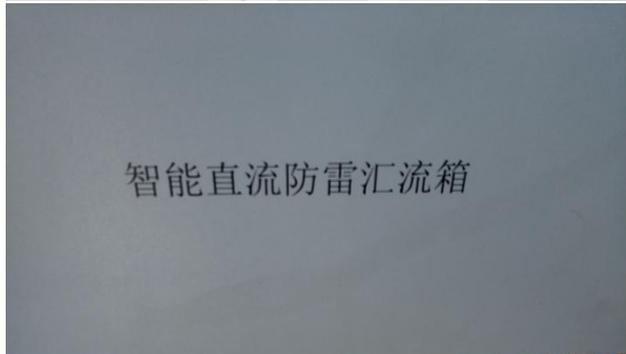

智能直流防雷汇流箱




没有防火封堵



团结村



龙口电缆安装

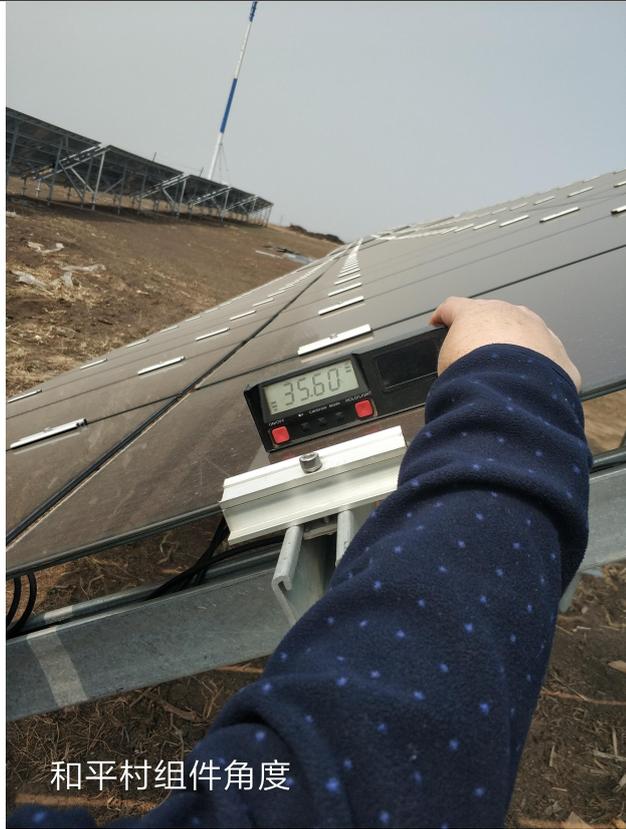


和平村组件角度



和平村螺丝安装问题

2018/4/29 09:17

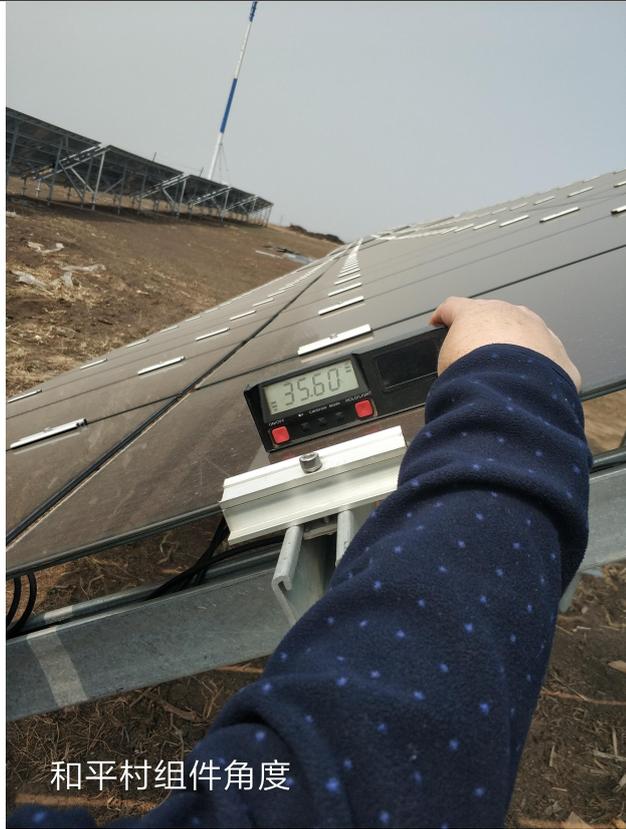

和平村组件角度



河口支架前后立柱安装完成 2018/4/29 10:53

			
设备交付进度		<p>正阳、勃信、开发、立新、吉兴河、仁兴、中和、生产、岱山、团结等 10 个村级电站逆变器汇流箱配套电缆就位</p>	<p>河口、城西、和平小五站镇四个村逆变器等进场</p>
设计交付进度		<p>正阳、勃信、开发、立新、吉兴河、仁兴、中和、生产、岱山、团结、城西、和平村图纸</p>	<p>其余图纸未完成</p>

	质量体系运作情况	质量体系不健全	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已进行	
	设计交底	无	
	方案审查	已审查	
	技术交底	无	
	设计变更	正在落实	
安全	安全培训情况	新进场员工未进行安全培训，且施工人员未佩戴安全帽	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安装，电缆敷设，箱逆变基础浇筑，组件电气接线；	逆变器安装。
	主要原材料质量	支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查

	设备质量	未进场报验	进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	总包预付款 到位	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量 / 总量)	累计完成(完成量 / 总量)	备注
东海建筑（河口）								
1	定位放线	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.23			3	
2	基础打桩	2018.4.16	2018.6.30	2018.4.23			3	
3	支架安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.23			2	
4	组件安装	2018.4.20	2018.6.30	2018.4.23			2	
东海建筑								
1	逆变器安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25			0	
2	接地安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25			2	
3	汇流箱安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25			2	
4	电缆敷设	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25			21	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成	本月实际完成	权值
----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----

						(完成 量 / 总 量)	(完成 量 / 总 量)	
南通二建								
1	汇流箱、 逆变器安 装完成	2018.4.15	2018.06.30	2018.4.25		10个村	0区	
东海								
	河口支架 组件安装 完成	2018.4.15	2018.06.30	2018.4.25				

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		26人	2	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，成立安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及七台河市润谷农业发展有限公司的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

	容进行施工。	
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
勃利县光伏分布式发电站扶贫项目
2018年4月30日
