

正衡监

编号: JL-(XYWDH)-05

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

2018年6月第5期

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2018年6月30日

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 月次 第5次 月报开始时间 2018年6月1日 结束日期 2018年6月30日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		影像	12张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 <p style="text-align: center;">河口逆变器支模完成</p>	<p>河口电缆安装完成, 防雷接地完成, 逆变器基础完成, 汇流箱安装完成, 围栏大门施工完成。城西逆变器基础完成, 环形接地完成, 汇流箱安装完成, 电缆安装完成。小五站镇桩基础施工完成, 支架安装完成两个场地, 汇流箱到场。开发、立新、吉兴河村、仁兴村、生产村、团结村、正阳、勃</p>	<p>河口、城西、小五站镇逆变器安装完成。小五站镇支架、组件、接地、汇流箱、电缆、逆变器基础、围栏完成施工, 外线施工完成、完成并网工作。城西、岱山、中和完成并网施工。新开土地规划完成, 开工。</p>



监理检查岱山围栏施工

SHOT ON MI 6
MI DUAL CAMERA

2018/6/6 10:21

信村逐一并网
施工。



检查团结村大门

2018/6/12 10:15



检查正阳村汇流箱



●○ SHOT ON MI 6 MI DUAL CAMERA 立新村大门




生产村电缆敷设

2018/6/2 10:29



小五站支架安装中

2018/6/24 10:32

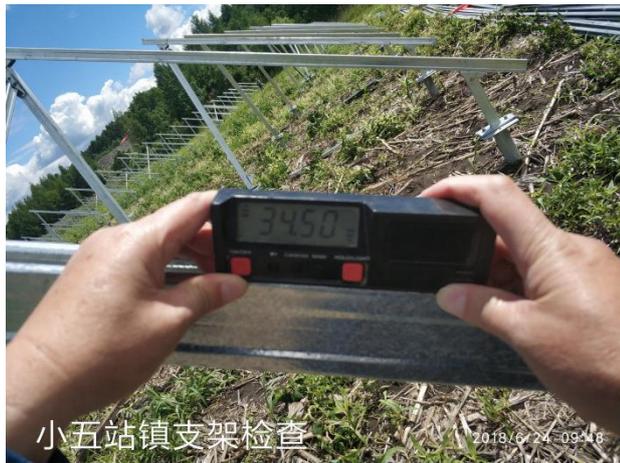



业主及监理检查河口逆变器基础



中和村

<p>设备交付进度</p>	<p>小五站、城西、河口汇流箱到场</p>	<p>河口、城西、和平小五站镇7个村逆变器进场。各村变压器进场安装。</p>
<p>设计交付进度</p>	<p>正阳、勃信、开</p>	<p>其余图纸未完</p>

		发、立新、吉兴 河、仁兴、中和、 生产、岱山、团 结、城西、和平、 河口、小五站镇 四个村图纸已 交付	成
	质量体系运作情况	正常	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	已进行，但图纸 会审记录未落 实	
	设计交底	已交底	
	方案审查	已审查	
	技术交底	已交底	
	设计变更	正在落实	
安全	安全培训情况	开展安全活动 与不定期检查	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安	逆变器安装。

		装, 电缆敷设, 箱逆变基础浇筑, 组件电气接线;	
	主要原材料质量	支架外观检查合格, 组件观感质量合格;	对主要材料进行检查
	设备质量	开展设备开箱检查记录	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度, 加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	总包第二笔款到位	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	定位放线	2018.4.15	2018.6.30	2018.5.5	2018.6.10	4	17	
2	基础打桩	2018.4.16	2018.6.30	2018.5.5	2018.6.25	4	17	
3	支架安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.23		2	13	
4	组件安装	2018.4.20	2018.6.30	2018.4.23			13	

1	逆变器安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25			10	
2	接地安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25	2018.6.18	2	12	
3	汇流箱安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25		2	12	
4	电缆敷设	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25		2	12	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	汇流箱、 逆变器安装完成	2018.6.20	2018.06.30	2018.6.25		7个村	10个村	
2	小五站镇 支架组件 安装完成	2018.6.1	2018.06.15	2018.6.18		4个村	2个村	

四、 安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		20人	2	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，成立安委会要定期对现场进行安全	安全管理委员会不定期大检查，包括现场施工和生活区检查

	检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位变压器、逆变器、汇流箱尽快到场

常州正衡电力工程监理有限公司
勃利县光伏分布式发电站扶贫项目
2018年6月30日
