



正衡监理

编号: JL-(XYWDH)-12

## 监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

2019年 03 月第 12 期

项目监理部 (章):



总监理工程师:

报告日期: 2019 年 03 月 30



由 扫描全能王 扫描创建

# 监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 月次: 第 12 次 月报开始时间: 2019 年 02 月 28 日  
结束日期: 2019 年 03 月 30 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司


## 一、工程影像资料


| 序号 | 单位工程标准名称        | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|----|-----------------|--------|------|------|----|
| 1  | 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 |        | 影像   | 6 张  |    |

形象照片

现场检查维修逆变器

检查光伏区汇流箱

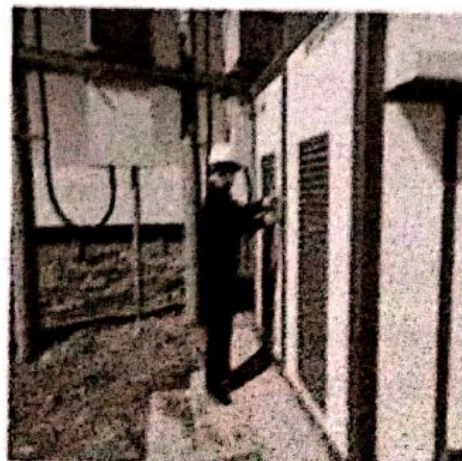

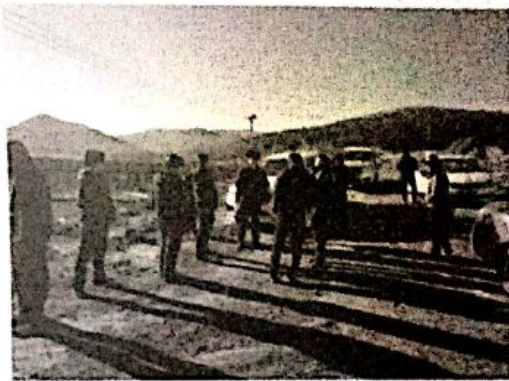

#### 一、 主要监理工作（质量、安全、进度、投资）

在监理过程中，认真执行监理规范的要求，严格按监理规划、监理细则进行操作，按照有关规范的要求对工程质量、安全、进度、等方面进行全面控制，并严格按监理程序进行。

为保证工程质量，督促施工单位及时上报工程资料，并对提交的工程资料进行了认真、严格审核；监理部定期召开监理工地例会，对上周工作进行总结，并安排下周工作，对出现的问题进行协调解决，如现场出现特殊问题立即召开专题会议，尽快解决，并将会议纪要整理打印发于各单位。平时通过检查、旁站、巡视、验收，杜绝出现失控现象。在实际操作过程中严格执行验收程序，原材料不经监理验收合格，严禁进场使用，对需复试的原材料严格执行见证取样制度，待复试合格后方可进场使用。上道工序尤其是隐蔽和关键工序验收不合格严禁进入下道工序施工，并且在砼施工过程中进行全程旁站监理，发现问题及时处理，并做好旁站记录。对工程中出现的质量问题认真对待，由各方共同商定处理方案，并督促其按处理方案进行整改，并再次验收合格后方可进行下道工序施工，确保质量符合要求。

本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，汇同各方检查了现场的机械设备、临时用电、消防、场容场貌等项目，针对存在安全隐患的，立即发出监理通知单要求整改，在监理的督促下和各方配合下，本月安全文明生产状况良好，施工现场未发生任何人身伤亡和设备损坏事故。

进度方面督促帮助施工单位合理安排好人力、物力，积极的做好消缺工作。另外本监理部及时对现场情况（如质量、安全、进度等）进行总结，并编制监理周报、月报，较好地促进了工程项目的实施。



## 二、本月施工进度计划

| 序号 | 任务名称        | 计划开始时间     | 计划结束时间     | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成<br>(完成量/总量) | 本月实际完成<br>(完成量/总量) | 权值 |
|----|-------------|------------|------------|--------|--------|--------------------|--------------------|----|
| 1  | 更换破损汇流箱、逆变器 | 2019.02.28 | 2019.04.30 |        |        | 400台               | 300台               |    |
| 2  | 组件安装完成      | 2019.02.28 | 2019.05.31 |        |        | 80%                | 30%                |    |

## 三、安全文明施工情况

| 事故(起)    |          |          | 编制安全策  | 施工 | 安全分包情况     |            |                  |                 |
|----------|----------|----------|--------|----|------------|------------|------------------|-----------------|
| 人身重<br>伤 | 机械设<br>备 | 电网事<br>故 | 划文件(份) | 人数 | 分包队<br>伍数量 | 分包队<br>伍人数 | 系统外<br>包队伍<br>数量 | 系统外<br>队伍人<br>数 |
| 无        | 无        | 无        |        | 7人 | 2          | /          | /                | /               |

## 四、施工重点工作情况

| 专业   | 本月重点工作情况                                                                       | 下月重点工作计划                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性                                                | 21个村级电站消缺验收，更换破损逆变器及组件。               |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，成立安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 | 安全管理委员会不定期大检查，包括现场施工和生活区检查，工人安全设备佩戴情况 |
| 质量管理 | 单位工程重点部位施工进行旁站；督促施                                                             | 按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要                 |



|      |                                                              |                                 |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      | 工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。                             | 求整改。                            |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。                    | 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。 |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。 | 督促施工单位组件尽快到场                    |

## 五、工程存在问题及建议总结

在参建各方的共同努力下，本月质量、安全文明总体良好，如：1、施工单位应及时报验所有施工资料 2、及时更换破损逆变器及组件；3、个别施工人员未戴安全帽；；4、施工单位应做好电站安全工作。针对以上的情况，监理部在现场及时指出，要求施工方项目部加强管理和安全技术交底工作，确保光伏区正常发电。

常州正衡电力工程监理有限公司  
勃利县光伏分布式发电站扶贫项目  
2019 年 03 月 30 日

