

正衡监理

编号: JL- (XYWDH) -17

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

2019年 09 月第 17 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:

报告日期: 2019 年 09 月 30

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 月次 第 17 次 月报开始时间 2019 年 8 月 30 日
结束日期 2019 年 9 月 30 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		影像	6 张	

形象照片

查看光伏组件

巡视光伏区

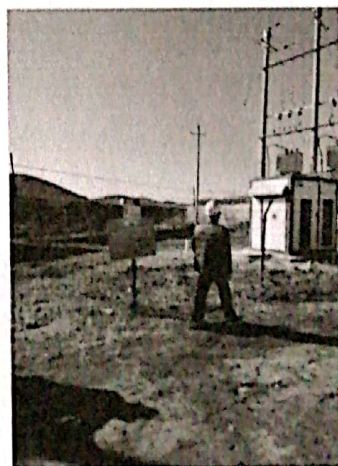



一、 主要监理工作（质量、安全、进度、投资）

在监理过程中，认真执行监理规范的要求，严格按监理规划、监理细则进行操作，按照有关规范的要求对工程质量、安全、进度、等方面进行全面控制，并严格按监理程序进行。

为保证工程质量，督促施工单位及时上报工程资料，并对提交的工程资料进行了认真、严格审核；监理部定期召开监理工地例会，对上周工作进行总结，并安排下周工作，对出现的问题进行协调解决，如现场出现特殊问题立即召开专题会议，尽快解决，并将会议纪要整理打印发于各单位。平时通过检查、旁站、巡视、验收，杜绝出现失控现象。在实际操作过程中严格执行验收程序，原材料不经监理验收合格，严禁进场使用，对需复试的原材料严格执行见证取样制度，待复试合格后方可进场使用。上道工序尤其是隐蔽和关键工序验收不合格严禁进入下道工序施工，并且在砼施工过程中进行全程旁站监理，发现问题及时处理，并做好旁站记录。对工程中出现的质量问题认真对待，由各方共同商定处理方案，并督促其按处理方案进行整改，并再次验收合格后方可进行下道工序施工，确保质量符合要求。

本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，汇同各方检查了现场的机械设备、临时用电、消防、场容场貌等项目，针对存在安全隐患的，立即发出监理通知单要求整改，在监理的督促下和各方配合下，本月安全文明生产状况良好，施工现场未发生任何人身伤亡和设备损坏事故。

进度方面督促帮助施工单位合理安排好人力、物力，积极的做好消缺工作。另外本监理部及时对现场情况（如质量、安全、进度等）进行总结，并编制监理周报、月报，较好地促进了工程项目的实施。

二、本月施工进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	汇流箱、逆变器安装完成					已完成	已完成	
2	组件安装完成					已完成	已完成	

三、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故	划文件(份)	人数	分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		20人	2	/	/	/

四、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	21个村级电站消缺验收
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，成立安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	安全管理委员会不定期大检查，包括现场施工和生活区检查，工人安全设备佩戴情况
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施	按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。

	工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位组件尽快到场

五、工程存在问题及建议总结

- 1、太升村，福安村两村级发电站更换，安装组件。
- 2、现场个别螺栓生锈问题，你总包单位应组织施工人员尽快更换。
- 3、资料未提交，要求总包单位尽快提交光伏区资料（材料、设备出场检验报告、合格证，材料送检，设备第三方检测报告等）及项目所需资料（监理通知单、强制性条文执行记录、项目划分表等）尽快提交监理单位进行审查。
- 4、施工现场存在施工垃圾应立即清理。
- 5、现场光伏区组件严重破损导致发电量受损，你总包单位应立即更换以免影响正常发电。
- 6、福安村发电站拆除转换率底的光伏组件，整改消缺。

六、下月工作计划

- 1、10月底完成小五站发电站的验收工作。
- 2、下月完成太升村，福安村两村的二次倒运，完成整改消缺。

常州正衡电力工程监理有限公司
勃利县光伏分布式发电站扶贫项目
2019年9月30日
