



正衡监理

编号: FGGF-YB-001

监 理 月 报

工程名称: 扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫
发电项目

2017 年 11 月第 1 期



项目监理部(章):

总监理工程师: 苗宇明

报告日期: 2017 年 11 月 30 日

监 理 月 报

开始时间 2017 年 11 月 2 日 结束日期 2017 年 11 月 30 日

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工序工作	1、场平放线定位检查完成。 2、桩基础钻孔测量检查完成。 3、砼桩浇筑旁站完成。 4、桩基础整改检查完成。	1、逆变接线完成，试验完成； 2、支架安装调整完成； 3、组件安装调整完成，全容量并网； 4、汇流箱安装完成； 5、光伏电缆敷设、接线完成； 6、接地完成，接地电阻值测量。
	设备交付进度	管桩、支架、组件进场	组件、逆变器、汇流箱、电缆安装完成
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	已完成 43 个场地变更，变更已结束	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	场地平整合格，桩基础浇筑部分出现麻面、蜂窝、预埋螺栓不合格现象已要求整改完成，支架及组件安装检查测试。	支架及组件安装；电缆敷设，电缆头制作及耐压试验；汇流箱、逆变器试验及调试。
	主要原材料质量	支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查

	构(配)件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度,加大工序报验抽查力度

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	定位放线	2017.11.02	2017.11.12	2017.11.02	2017.11.16	100%	100%	
2	基础打桩	2017.11.05	2017.11.25	2017.11.08	2017.11.28	100%	100%	
3	支架安装	2017.11.10	2017.12.05	2017.11.22		10%	10%	
4	组件安装	2017.11.15	2017.12.08	2017.11.26		5%	5%	
5	接地安装							
6	逆变、汇流箱安装							
7	电缆敷设安装							
8	并网线路接入							
9	系统调试							
10	道路、围栏							
11	并网验收							
12	竣工资料移交							

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	定位放线	2017.11.02	2017.11.12	2017.11.02	2017.11.16	100%	100%	
2	基础打桩	2017.11.05	2017.11.25	2017.11.08	2017.11.28	100%	100%	
3	支架安装	2017.11.10	2017.12.05	2017.11.22	2017.12.10	10%	10%	
4	组件安装	2017.11.15	2017.12.08	2017.11.26	2017.12.15	5%	5%	
5	接地安装	2017.11.18	2017.12.10	2017.12.01	2017.12.15			
6	逆变、汇流箱安装	2017.11.22	2017.12.10	2017.12.03	2017.12.18			
7	电缆敷设	2017.11.18	2017.12.10	2017.12.02	2017.12.16			

8	并网线路接入	2017.11.25	2017.12.12					
9	系统调试	2017.12.10	2017.12.14					
10	道路、围栏	2017.11.20	2017.12.14					
11	并网验收	2017.12.15	2017.12.16					
12	竣工资料移交		2017.12.25					

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	施工
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	单位
伤	备	故			数量
无	无	无	2 份	280 人	8

五、施工重点工作情况


专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

	容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

附图





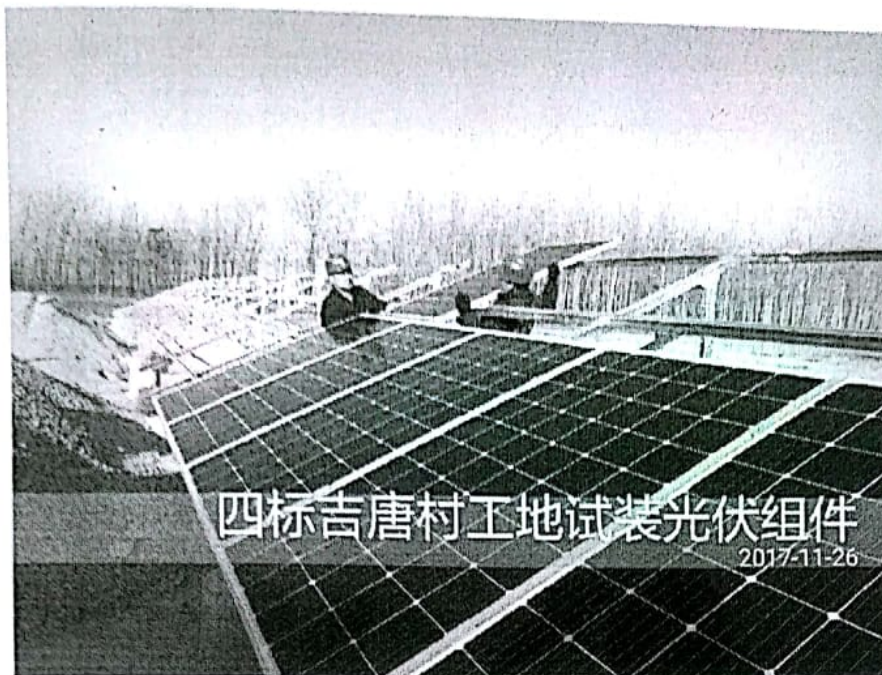

四标吉唐村工地试装光伏组件

2017-11-26



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

工程名称 扶沟县2017统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

施工部位 二标大王庄挖围栏基础及地线沟

2017/11/26



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

工程名称 扶沟县2017统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

施工部位 二标丁庄基础浇筑
拍摄日期 2017年11月23日

2017/11/23

常州正衡电力工程监理有限公司

扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项
目监理部

2017 年 11 月 30 日
