



正衡监理

编号: FGGF-YB-002

监 理 月 报

工程名称: 扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫
发电项目

2017 年 12 月 第 2 期



项目监理部 (章):

总监理工程师:

胡守刚

报告日期: 2017 年 12 月 31 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

开始时间 2017 年 12 月 1 日 结束日期 2017 年 12 月 31 日

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工序工作	1、汇流箱、计量箱安装完成 2、光伏电缆敷设、接线完成 3、组件安装调整完成，并网运行 4、逆变接线完成，试验完成 5、支架安装调整完成	1、道路、围栏、标志桩安装 2、竣工验收 3、竣工资料移交
	设备交付进度	支架、组件、逆变器、汇流箱、并网柜全部进场	道路、围栏等附属工程结束、不合格项消缺完成
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	已完成 43 个场地变更，变更图纸已交付	
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	提出的安全问题都已落实	场地围栏安装及用电安全
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架组件安装良好，电缆敷设，电缆头制作及耐压试验，逆变器汇流箱试验及调试。	并网发电出现的问题，进行消缺
	主要原材料质量	主要材料进行质量检查	



构(配)件质量	进场材料质量不合格的已要求更换	把控好进场材料质量关
设备质量	逆变器汇流箱厂家为锦浪、阳光电源等名牌保障厂家。	
质量验评情况	加强检查力度，加大工序报验抽查力度	检查施工是否符合要求设计要求

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	定位放线	2017.11.02	2017.11.12	2017.11.02	2017.11.16	100%	100%	
2	基础打桩	2017.11.05	2017.11.25	2017.11.08	2017.11.28	100%	100%	
3	支架安装	2017.11.10	2017.12.05	2017.11.22	2017.12.24	100%	100%	
4	组件安装	2017.11.15	2017.12.08	2017.11.20		95%	99%	剩余极个别场地未完成
5	接地扁铁安装	2017.11.18	2017.12.10	2017.11.23	2017.12.15	100%	100%	
6	逆变、汇流箱安装	2017.11.22	2017.12.10	2017.12.3	2017.12.20	100%	100%	
7	电缆敷设安装	2017.11.18	2017.12.10	2017.11.25	2017.12.20	100%	100%	
8	并网线路接入	2017.11.25	2017.12.12	2017.12.9	2017.12.27	99%	99%	
9	系统调试	2017.12.10	2017.12.14	2017.12.20	2017.12.28			
10	道路、围栏	2017.11.20	2017.12.14	2017.11.25				正在做
11	并网验收	2017.12.15	2017.12.16					
12	竣工资料移交		2017.12.25					

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	道路、围栏、标志桩安装	2018.1.1	2018.1.15					



2	监 控 安 装、调试	2018.1.1	2018.1.20					
3	竣工验收	2018.1.22	2018.1.28					
4	竣工资料 移交	2018.1.31	2018.1.31					

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	施工
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	单位
伤	备	故			数量
无	无	无	2 份	320 人	8

五、 施工重点工作情况


专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力	1、道路、围栏、标志桩安装 2、监控安装、调试 3、竣工验收 4、竣工资料移交
安全管理	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	审查施工单位有没有做好围栏、标志桩、用电安全的防护措施。
质量管理	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工	将所有质量问题进行逐一排查并要求施工方更改。
技术管理	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。	
造价管理	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请	



物资供应	督促施工单位进行	
------	----------	--

附图



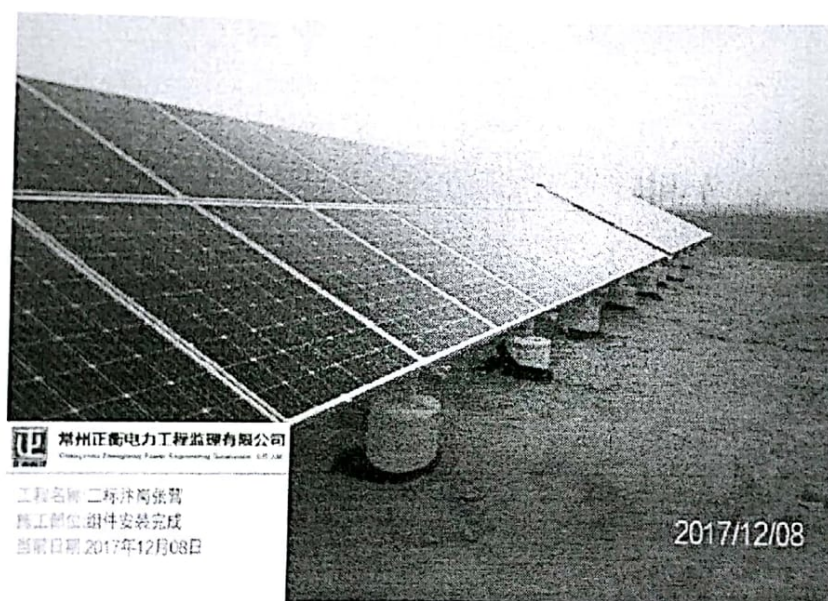





常州正衡电力工程监理有限公司

扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项
目监理部

2017 年 11 月 30 日

