



正衡监理

编号: ZHJL-YHGS-YB-03

监 理 月 报

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

2018年3月第1期

项目监理部(章):

总监理工程师: 苗守明

报告日期: 2018年3月31日



监 理 月 报

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥-兴桥)

月次：第 3 次月报

开始时间：2018 年 3 月 1 日 结束时间：2018 年 3 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥-兴桥)	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目	影像	8 张	



一、 监理重点工作情况

1、兴桥项目已并网，正在进行消错整改工作

2、蔡桥项目施工情况：

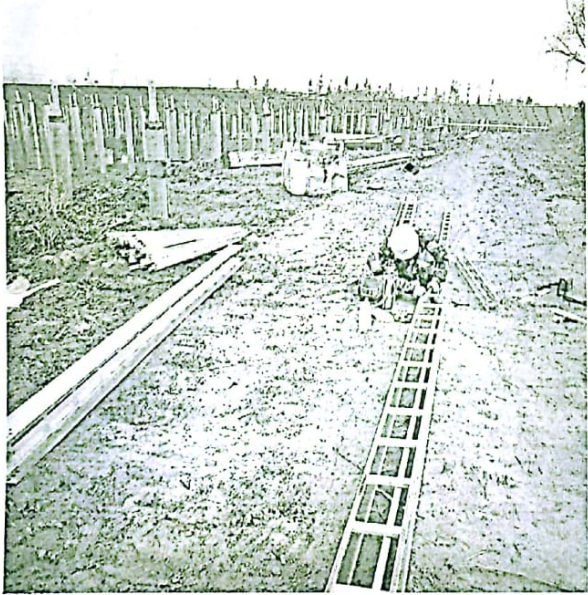专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		桩基基础施工； 支架安装施工； 组件安装施工； 桥架安装施工； 站内电缆敷设 接线； 接地网施工；	支架安装； 组件安装施工； 站内电缆接线； 全站接地网施工； 并网设备调试； 质监站及供电公司验收； 并网发电；



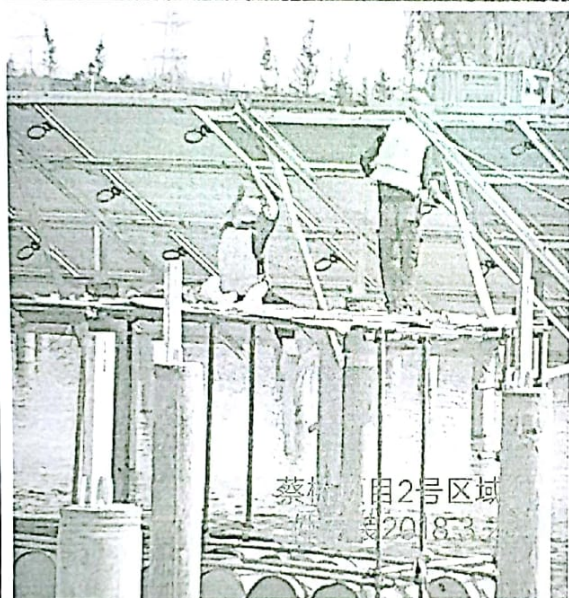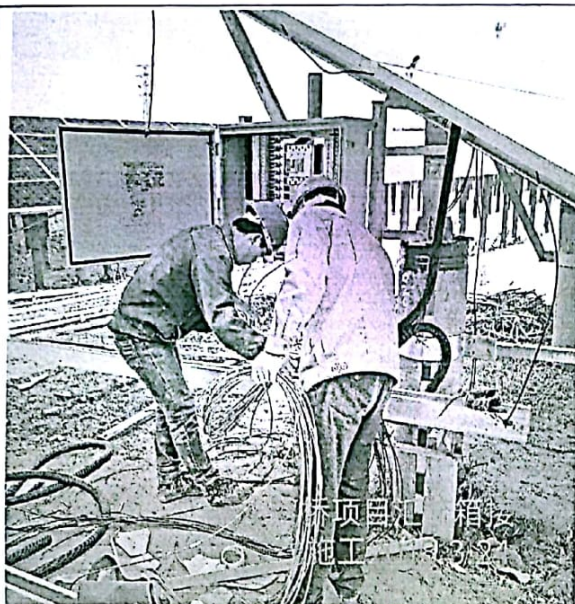



安全			
	设备交付进度	设备已全部进场	/
	设计交付进度	完成	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	/
	设计交底	完成	/
	方案审查	已交付	/
	技术交底	完成	/
	设计变更	无	/
	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工

			进行安全教育及考核
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底,已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	水塘内管桩歪斜已校正完成,已要求施工单位保证各工序的施工质量。	对施工过程中出现的质量隐患及时下达整改通知,严格把控工程质量。
	主要原材料质量	主要设备材料厂家资质、合格证及第三方检测报告齐全。质量合格	/
	构(配)件质量	主要构配件厂家资质、合格证及第三方检测报告齐全。质量合格	/
	设备质量	资质及证明材料齐全,质量合格	/
	质量验评情况	工序施工符合	加强过程检查

		要求	力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

1、兴桥项目除管桩校正、立柱更换外，其余整改工作已全部完成。

2、蔡桥项目进度情况：

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量 / 总量)	累计完成(完成量 / 总量)	备注
1	桩基施工	2018.2.25	2018.3.8	2018.2.25	2018.3.8		100%	
2	支架安装	2018.3.1	2018.4.5	2018.3.1			95%	
3	组件安装	2018.3.1	2018.4.5	2018.3.1			95%	
4	电缆桥架	2018.3.1	2018.4.5	2018.3.1			95%	
5	直流电缆	2018.3.1	2018.4.5	2018.3.1			95%	
6	低压电缆	2018.3.1	2018.4.5	2018.3.1			95%	
7	汇流箱安装接线	2018.3.1	2018.4.5	2018.3.1			95%	
8	设备基础 土建及安装调试	2017.12.11	2018.4.5	2017.12.14			95%	

三、 下月进度计划

1、兴桥项目计划4月底结束消错整改工作。

2、蔡桥项目进度计划情况：

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	桩基施工	2018.4.1	2018.4.5	2018.4.1		/	/	
2	支架安装	2018.4.1	2018.4.5	2018.4.1		/	/	
3	组件安装	2018.4.1	2018.4.5	2018.4.1		/	/	
4	电缆桥架	2018.4.1	2018.4.5	2018.4.1		/	/	
5	直流电缆	2018.4.1	2018.4.5	2018.4.1		/	/	
6	低压电缆	2018.4.1	2018.4.5	2018.4.1		/	/	
7	逆变器、 汇流箱安装接线	2018.4.1	2018.4.5	2018.4.1		/	/	
8	设备基础 土建及安装调试	2018.4.1	2018.4.5	2018.4.1		/	/	

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		80人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；	审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资

	对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及国家电网的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理		对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照并网工期的要求，合理安排人员、机具、物资进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目（兴桥-蔡桥）

2018年3月31日

