

沿海高速南沈灶、白蒲 6.18MW 互通光伏电站工程

施工月报

第 3 期

2018 年 02 月 01 日~2018 年 02 月 28 日



签发:

审核:

编制:

云杉清能沿海高速南沈灶、白蒲 6.18MW 互通光伏电站工程项目

监理部

报表日期: 2018 年 02 月 28 日

目 录

1、项目基本信息	3
2、工程大事记.....	3
3、里程碑及主要节点进展情况	3
4、本月工作完成情况	4
5、项目质量管理情况	4
6、项目现场安全情况	4
7、物资到货情况	4
8、图纸交付情况	4
9、下月主要工作	5
10、存在的问题	5
11、解决方案.....	5
12、施工影像资料	5

1、项目基本信息

工程名称：沿海高速南沈灶、白蒲 6.18MW 互通光伏电站工程

建设单位：江苏云杉清洁能源控股有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：江苏中压建设工程有限公司

复工概况：在苏交控大力发展“一主两翼”的策略下，沿海高速互通光伏作为省内着力打造的“交通+”标杆工程，白蒲互通光伏于 2 月 24 日现场复工，于 2 月 26 日在白蒲收费站办公室召开了复工后第一次工程例会，建设方、监理方、EPC 单位悉数到场参会。作为总承包单位，我方将继续大力推进工程建设，狠抓工程质量。复工例会上，我方详细汇报了节后的工作计划，建设单位对各方工作汇报进行了总结并提出了任务要求。

2、工程大事记

- 1、2018 年 2 月 2 日南沈灶质检通过。
- 2、2018 年 2 月 4 日白蒲送出线路 T 接完成。
- 3、2018 年 2 月 14 日南沈灶并网成功。
- 4、2018 年 2 月 24 日项目复工。
- 5、2018 年 2 月 26 日复工后第一次工程例会

3、里程碑及主要节点进展情况

- 1、2 月 2 日南沈灶质检通过；
- 2、2 月 4 日白蒲送出线路 T 接完成。
- 3、2 月 14 日南沈灶并网成功。

4、本月工作完成情况

- 1、南沈灶通过质检；
- 2、南沈灶倒送电成功，并网发电；
- 3、白蒲外线 T 接完成；
- 4、白蒲设备就位完成；
- 5、白蒲管桩施工完成 65%；
- 6、白蒲组件安装完成 33%；

5、项目质量管理情况

施工组织设计及相关质量方案已报审并通过审批，收到业主整改通知单和监理通知单后第一时间进行整改和及时报告反馈。

6、项目现场安全情况

项目安全零事故。所有项目施工人员已进行安全教育并考核合格，各工序施工前均进行安全技术交底，高空作业前均已做好安全防护工作，并报监理、业主方备案。由业主方组织安全大检查一次，检查问题第一时间进行整改并将整改情况汇报监理方、业主方。

7、物资到货情况

设备供货情况： 白蒲设备材料已全部到货

8、图纸交付情况

目前已收到签字版图纸有：已全部交付


9、下月主要工作

- 1、南通供电公司调度协议、供用电合同及购售电合同事宜
- 2、白蒲完成桩基工程
- 3、白蒲光伏支架安装结束
- 4、白蒲光伏组件安装结束
- 5、白蒲电气接线安装结束
- 6、白蒲质检完成
- 7、白蒲调试验收并网发电

10、存在的问题

11、解决方案

12、施工影像资料

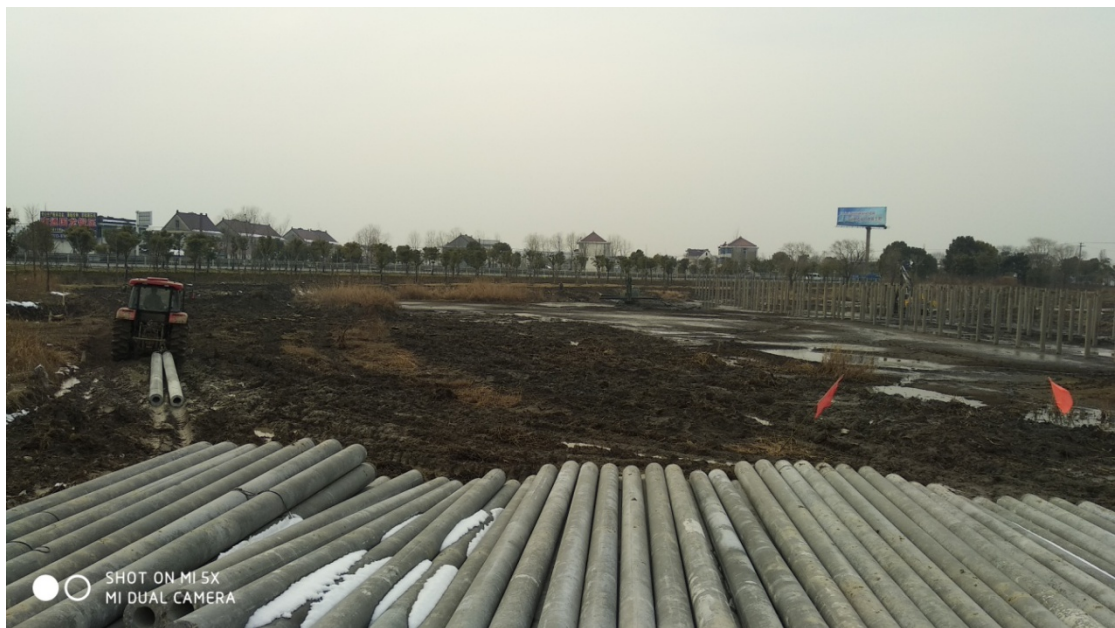

白蒲打桩



南沈灶质检



南沈灶并网
