



正衡监理

编号: ZHJL-YHGS-YB-01

监 理 月 报

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

2017 年 12 月第 1 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 苗守明



报告日期: 2017 年 12 月 25 日

监 理 月 报

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥-兴桥)

月次: 第 1 次月报

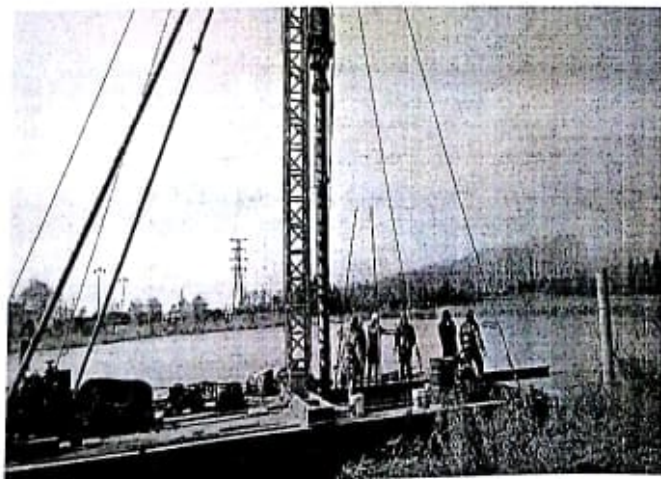
开始时间: 2017 年 12 月 8 日 结束时间: 2017 年 12 月 25 日

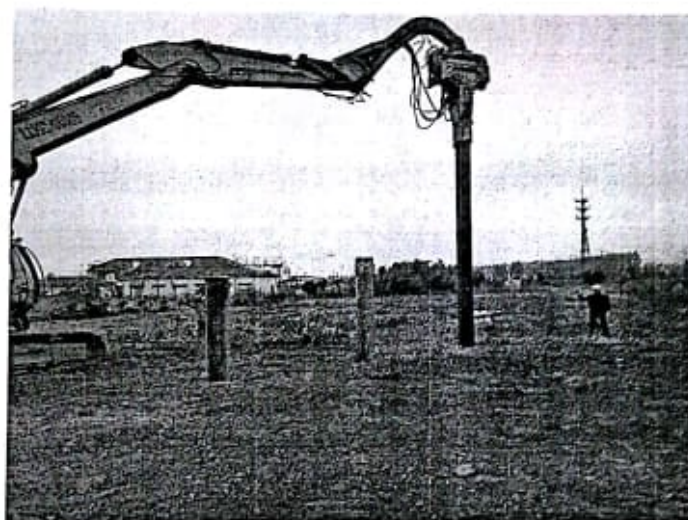
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

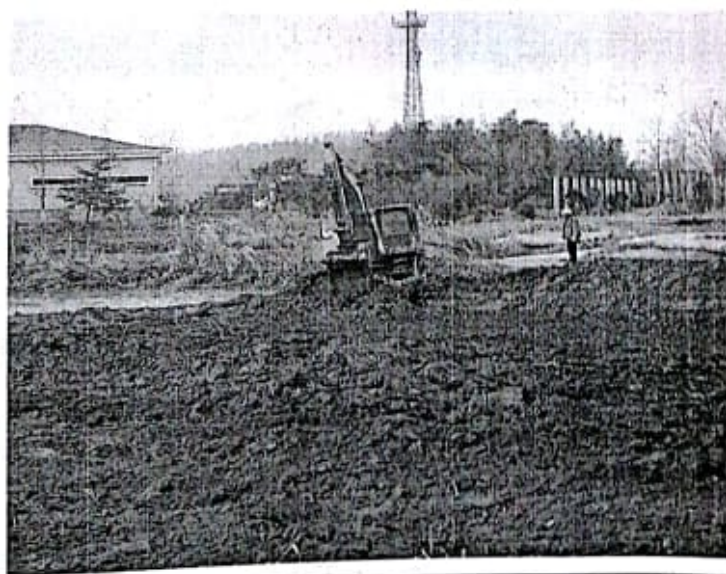
一、工程影像资料

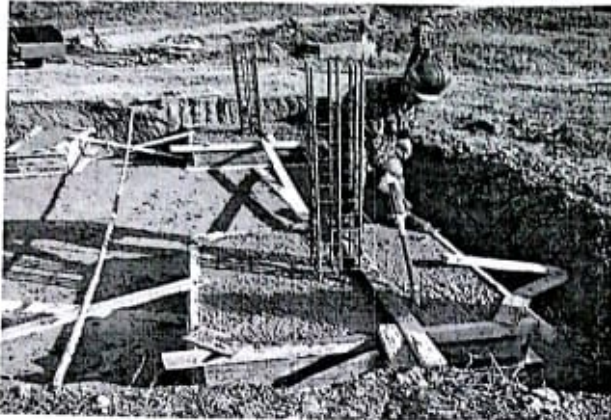
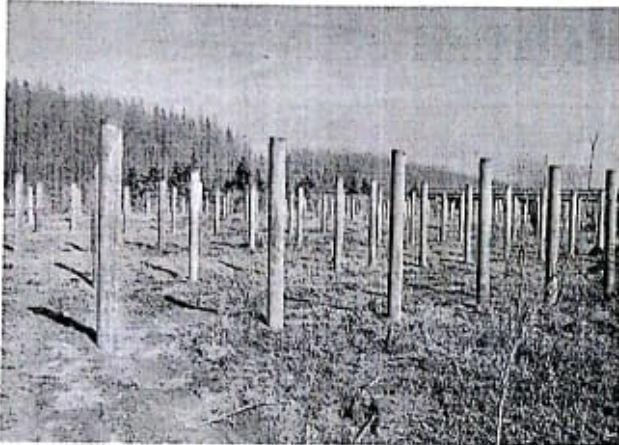
序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥兴桥)	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目	影像	10 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	兴桥水塘排水施工; 设备进场, 大型设备进场报验; 预应力管桩进场; 预应力管桩试验桩, 检测试验; 蔡桥兴桥旱地打桩施工; 箱逆变基础开挖及混凝土浇筑; 蔡桥兴桥施工现场清表施工;	水塘内桩基施工; 支架安装; 组件安装; 电气接线施工; 箱逆变基础及一二次设备基础; 并网设备调试; 质监站及供电公司验收; 并网发电;





	 		
	设备交付进度	打桩设备、预应力管桩进场	剩余管桩到货； 支架、组件、箱 逆变、一二次设备到货
	设计交付进度	设计签名版图 纸完成。未见任何蓝图	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	箱逆变基础图 纸、旱地桩位图 纸完成会审	施工图会审完 成
	设计交底	完成	

	方案审查	已交付部分	督促施工单位 报审其他资料； 施工进度与资 料同步；
	技术交底	未完成	完成
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育 及考核
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实；对违 反行为罚款处 理	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	早地打桩总体 质量可控；少量 预应力管桩桩 头有破损情况， 已要求施工单 位找出原因并 制定应对措施， 保证施工质量。	支架及组件安 装；电缆敷设， 电缆头制作及 耐压试验；箱式 变压器、逆变器 试验及调试。
	主要原材料质量	预应力管桩整	对主要材料进

		体观感良好，厂家资质、合格证及第三方检测报告齐全。质量合格	行检查；合格后 方可进场使用。 对不合格原材料退回处理
	构（配）件质量	预应力管桩整体观感良好，厂家资质、合格证及第三方检测报告齐全。质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	无设备进场	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	按进度申请进度款	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	桩基施工	2017.12.8	2017.12.30	2017.12.12		2.8MW	2.8MW	

2	支架安装	2017.12.21	2018.1.8				0%	
3	组件安装	2017.12.25	2018.1.20				0%	
4	电缆桥架						0%	
5	直流电缆	2017.12.26	2018.1.22				0%	
6	低压电缆	2017.12.26	2018.1.22				0%	
7	逆变器、 汇流箱安 装接线	2018.1.2	2018.1.23				0%	
8	设备基础 土建及安 装调试	2017.12.11	2018.1.30				0%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量/总量)	累计完成 (完成量/总量)	备注
義和太阳能								
1	桩基施工	2017.12.8	2017.12.30	/		/	/	
2	支架安装	2017.12.21	2018.1.8	/		/	/	
3	组件安装	2017.12.25	2018.1.20	/		/	/	
4			/	/		/	/	
5	直流电缆	2017.12.26	2018.1.22	/		/	/	
6	低压电缆	2017.12.26	2018.1.22	/		/	/	
7	逆变器、 汇流箱安 装接线	2018.1.2	2018.1.23	/		/	/	
8	设备基础 土建及安 装调试	2017.12.11	2018.1.30	/		/	/	

四、 安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		10人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	预应力管桩到场检查；单位工程重点部位及混凝土施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及国家电网的规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理		对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照并网工期的要求，合理安排人员、机具、物资进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

2017年12月25日
