



正衡监理

编号: ZHJL-YHGS-YB-05

监 理 月 报

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

2018年5月第1期



项目监理部 (章):

总监理工程师: 苗守明

报告日期: 2018年5月30日

监 理 月 报


工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥-兴桥) 第5次月报
 开始时间：2018年5月1日 结束时间：2018年5月30日
 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料



序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥-兴桥)	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目	影像	9张	



一、 监理重点工作情况


- 1、兴桥项目已并网，正在进行消错整改工作。
- 2、蔡桥项目已并网，正在进行消错整改工作。

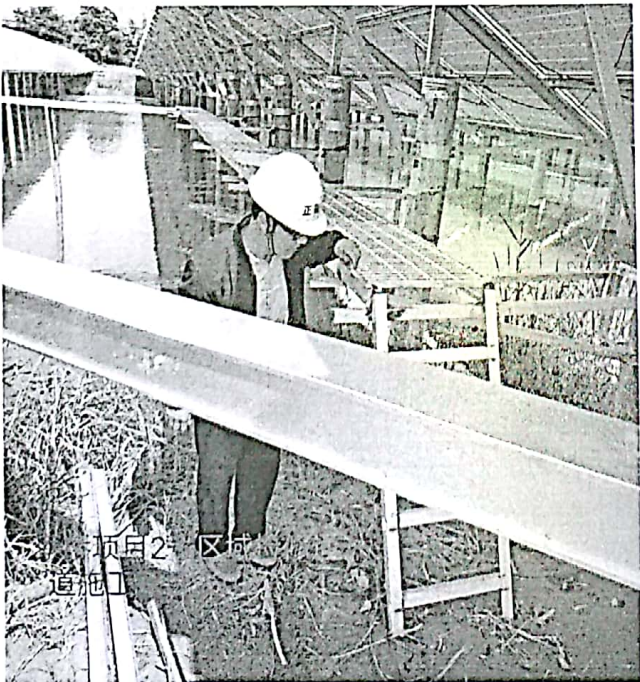专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 项目2-区域 道施工	场区内立柱、组件等消错整改施工； 检修通道安装施工； 视频监控安装施工； 箱逆变围栏、台阶扶手安装施工等。	加强消错整改工作的检查力度，确保施工整改的质量，配合建设单位做好验收工作。



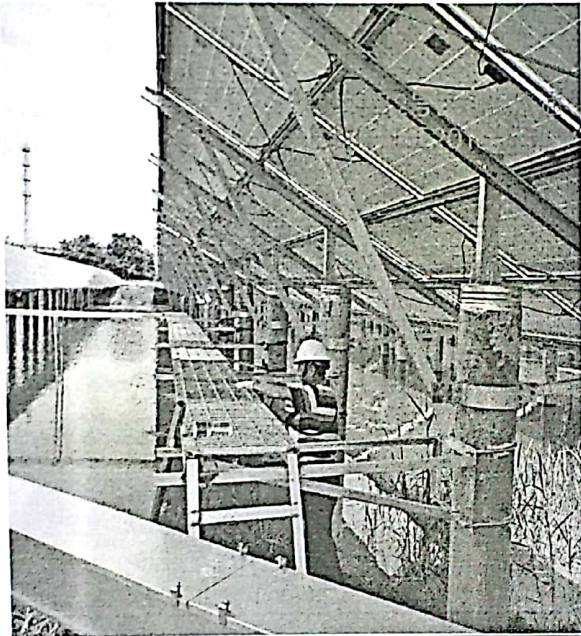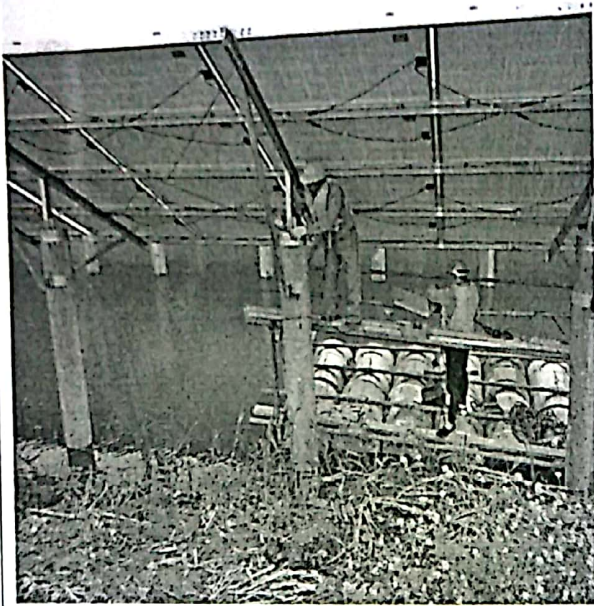

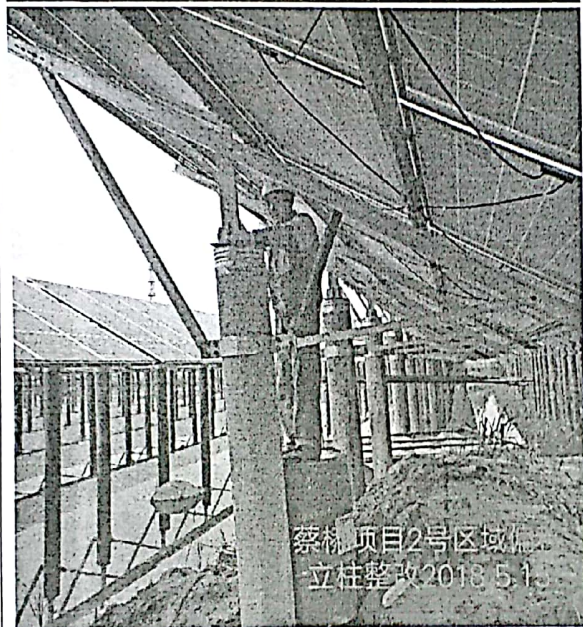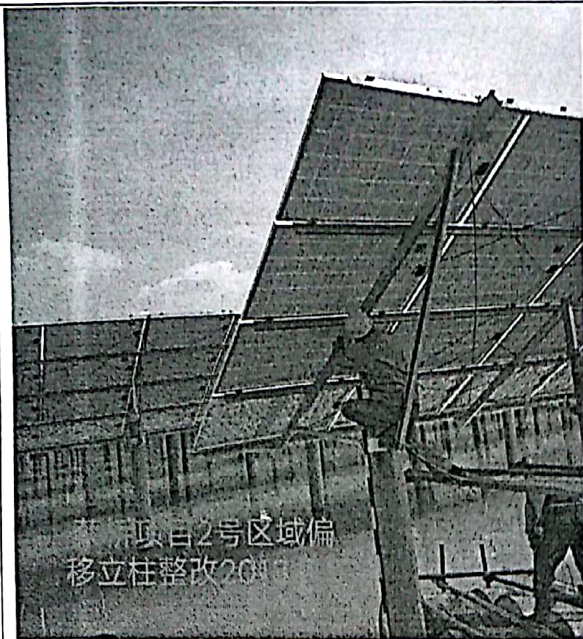

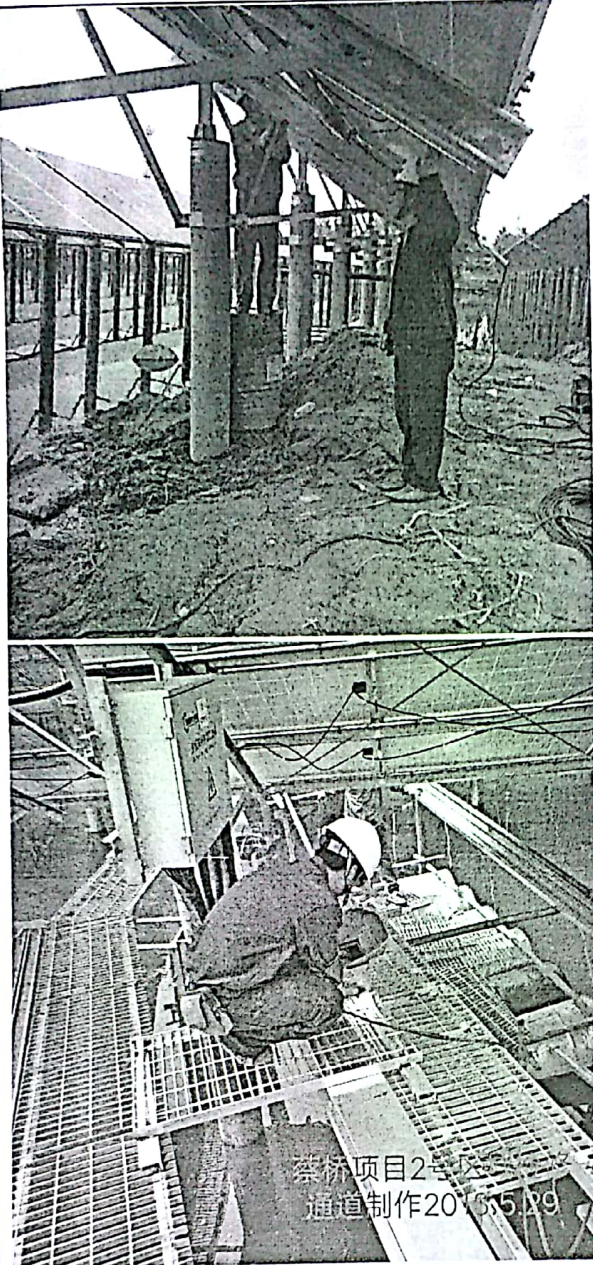			
	设备交付进度	设备已全部进场	/
	设计交付进度	完成	/

	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	完成	/
	设计交底	完成	/
	方案审查	已交付	/
	技术交底	完成	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育 及考核
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底的， 已要求施工单 位认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	已要求施工单 位保证施工整 改的质量。	对施工整改过 程中出现的质量 隐患及时下达 整改通知，严 格把控工程质 量。
	主要原材料质量	主要设备材料 厂家资质、合格 证及第三方检	/

		检测报告齐全，质量合格。	
	构（配）件质量	主要构配件厂家资质、合格证及第三方检测报告齐全，质量合格。	/
	设备质量	资质及证明材料齐全，质量合格。	/
	质量验评情况	工序施工符合要求。	加强过程检查力度。
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

- 1、兴桥项目除管桩校正、立柱更换外，其余整改工作已全部完成。
- 2、蔡桥项目已并网，现正在消错整改。
- 3、蔡桥项目、兴桥项目的检修通道已施工完成。

三、 下月工作计划

- 1、兴桥项目计划6月全部结束消错整改工作，进行竣工验收。
- 2、蔡桥项目计划6月全部结束消错整改工作，进行竣工验收。

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		10 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，做好施工整改工作。	要求施工单位合理安排施工整改进度计划，及时调整人力、物力做好项目的收尾工作，配合建设单位做好验收工作
安全管理	提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	进一步做好安全管理工作
质量管理	单位工程重点部位施工整改进行旁站；督促施工单位落实质量通病防治措施。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及国家电网的规范要求进行施工整改工作。
技术管理	现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	严格按规范及相关要求整改，监督检查执行情况。
造价管理	/	/
物资供应	/	/

常州正衡电力工程监理有限公司
云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目（兴桥、蔡桥）
2018 年 5 月 30 日
