



监 理 月 报

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏
发电项目

2018 年 4 月第 2 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：任仲峰

报告日期：2018 年 04 月 24 日

监 理 月 报

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目 月次 第 2 次 月报开始时间 2018

年 04 月 1 日 结束日期 2018 年 04 月 24 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目		影像	80 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

进度	  	1、本月箱逆变基础开始施工,13日完成1-4号箱逆变基础 2、4月11日,开始对一次仓基础、SVG、接地变基础进行施工,于本月19日完成所有设备基础浇筑	下月重点工作 一次设备接线、 二次设备安装 接线、屋面验收、设备联调、 并网
-----------	--	--	---

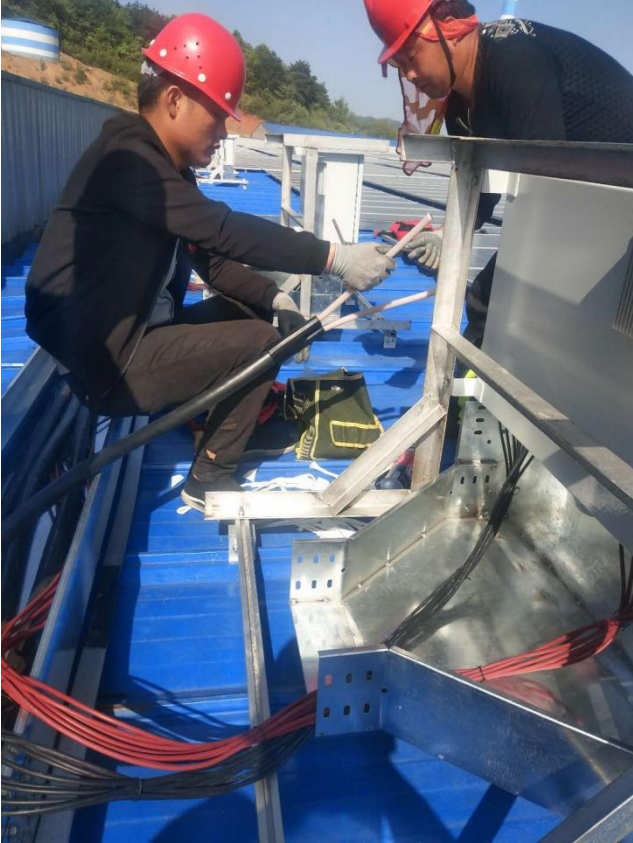		3、本 月 厂区停电 2 小 时，配合设备 厂家对厂区柜 体进行测量	4、屋 面 组件线缆敷设 及接线 4 月 18 日完成（除少 许部分线缆缺 少，基本完成， 共计使用约 15 万米 4mm²）
--	--	---	---



5、开 关
站二次设备基
础施工 4 月 11
日开始施工，4
月 16 日完成静
电 地 板 敷 设
（除少许钢结
构未涂刷防腐
涂料，基本完
成）



6、各 屋
面接地施工于
4 月 22 日完成
（未完成接地
电阻测试）



7、本 月
19 日对 1#屋面
组 件 进 行 验
收，存在的问
题已下发监理
工作联系单及
20 日做出汇总
上报




8、2# 屋
面还未进行报
验



9、屋 面
桥架安装施工
于本月 22 日基
本完成敷设，
我部已要求对
桥架内线缆进
行整理，盖板
进行敷设，待
并网后，线缆
无问题，进行
桥架盖板固定

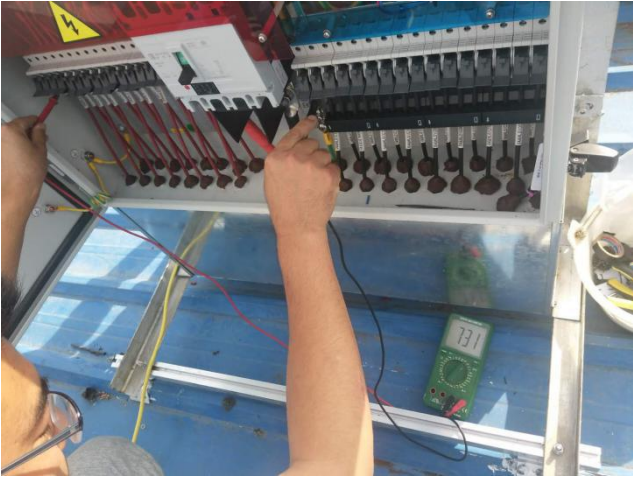

	 	10、设备 到货情况：4台逆变器于4月9日运至现场，4台箱变于4月22日运至现场（已完成屋面至逆变接线）一次仓、SVG、接地变于4月22日运至现场，未进行吊装，预计明日进行吊装（吊装方案多次修改）	
--	--	--	--



11、一次
仓、SVG、接地
变基础于4月
19日中午完成
浇筑，未达到
养护周期28d，
目前工期紧，
经多方商量，
决定对设备基
础进行加固处
理



12、汇 流
箱 安 装 及 接
线、封堵已基
本完成，屋面
各工序已进入
收尾工作

13、本 月
监 理 及 施 工 合
同 时 间 已 到
期，具体联系
单已得到批复



	设备交付进度	已于本月 25 日 全部到场	无
	图纸	项目存在多处 修改变更，我 部已要求设计 单位出具变更 单（暂未收到）	
	质量体系运作情况	目前质量运行 体系良好	加强对质量体 系管理
	施工图会审	无	
	设计交底	无	
	方案审查	本月审查施工 资料及设备吊 装专项方案	完成资料审核 及归档装订
	技术交底	无	
	设计变更	未出具变更单	
安全	安全培训情况	加强安全教育 工作，时刻提 醒施工人员注 意安全文明施 工。	无
	安全交底情况	\	
	安全措施落实情况	本月安全质量 情况较为良 好，但也存在 部分人员吸烟 等现象	严格落实安全 施工措施，做到 安全防患于未 然。
	安全文明施工情况	现场安全文明 施工良好，要	加强安全文明 施工巡查力度。

		求施工每天早 班对现场施工 人员进行安全 教育。	
质量	主要工序质量	组件安装存在 部分夹具松 动、倾斜等现 象，目前已完 成 1#屋面整改	电缆头制作及 耐压试验；箱式 变压器、逆变器 试验及调试。
	主要原材料质量	支架，组件外 观合格、电缆 合格	对新进场的材 料进行检查
	构（配）件质量	对进场材料质 量合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量	进行开箱检 验，对需要检 验的设备，要 求施工单位出 示检验报告。	进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	进行质量检查 评估，按标准 检查，是否符 合要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		27	1	3	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	要求施工单位合理调整上班时间，在人员方面合理安排，保证施工进度。	及时调整人力、物力。确保按期并网
安全管理	在早晨上班前对施工人员，进行安全教育。	认真落实安全教育，对施工现场加大安全隐患排查力度。
质量管理	做好现场巡视检查，控制各施工节点质量，把控施工质量。	控制各节点质量检查力度，做好平行检验及旁站记录
技术管理	要求施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	/	/
物资供应	协助建设单位、施工单位做好物资进场工作，保证物资管理及保管。	做好物资保管工作，合理安排物资使用情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发监理项目部

2018 年 04 月 24 日
