


编号：ZHJL-BFZGFDZ-02



正衡监理

监理月报

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

2018年4月第2期



项目监理部(章)

总监理工程师：苗守明

报告日期：2018年4月29日

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位联系单	1 份	工程暂停令	0 份
监理通知单	4 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	1 份

本月工程现场大事记

- 1、1-5#地块管桩全部施工完成；1#地块钢结构安装 80%，光伏组件开始安装；4#地块桩头钢板焊接 100%，钢梁组装 50%；3-1#桩头钢板焊接 50%。
- 2、升压站 1#楼主体完成，外墙水泥砂浆底层抹面完成；2#主体砼结构完成，砖基础完成 80%；主变基础、110KV 支架及断路器基础、事故油池、SVG 基础和避雷针基础砼施工完成。
- 3、光伏区箱逆变基础由于变更原因暂时停工，预计 5 月 1 日开工。
- 4、35KV 线路方案 4 月 30 日确定。
- 5、外线塔基 1#2#3#4#7#14#15#已完成，除 5#8#塔基正在协调地方问题外其余正在施工。

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	2次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	2次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	5项	其中一次验收合格计	5项
发出监理通知单（质量控制类）	2份		
工程质量情况简析（文字或图表）			
<p>1、桩头钢板焊接不饱满、凹凸不平、存在有结渣、气孔等现象，焊渣没经清理就开始涂防锈漆。</p> <p>2、管桩施工时个别部位中心线、垂直度和标高偏差大。</p> <p>3、升压站砖砌体没按规范要求《5M 设置构造柱。</p> <p>4、组件安装前钢结构个别部位没满焊。</p> <p>5、现场 C 型钢檩条采用电钻、等离子分割和液压打孔没经业主和设计单位书面确定。</p>			

下月质量情况预计和目标

- 1、要求现场负责人对管桩施工认真排查矫正报业主、监理验收后进行下道工序。
- 2、严格把控钢结构焊接工艺，对无证上岗的焊工清退。
- 3、针对 C 型钢檩条现场打孔召开专题会议，由业主、设计单位确定打孔方式。

本月费用控制情况评析


工程总投资额		18000 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
<p>由于本项目投资特殊业主没让监理参与工程费用控制</p>			
预计下月工程发生费用金额			
<p>无预计</p>			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2018 年 3 月 23 日	工程竣工日期	2018 年 6 月 30 日
本月计划完成至	30%		
本月实际完成至	10%		
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）			2 份

本月工程进度情况简析（文字或图表）

现场目前为止累计完成打桩 8826 根，占总量的 100%。钢结构安装 20%。开关站主要设备基础浇筑完毕。外线浇筑塔基 7 个，升压站 1#楼主体外墙抹灰完成，2#主体砼结构完成，主要设备基础完成。

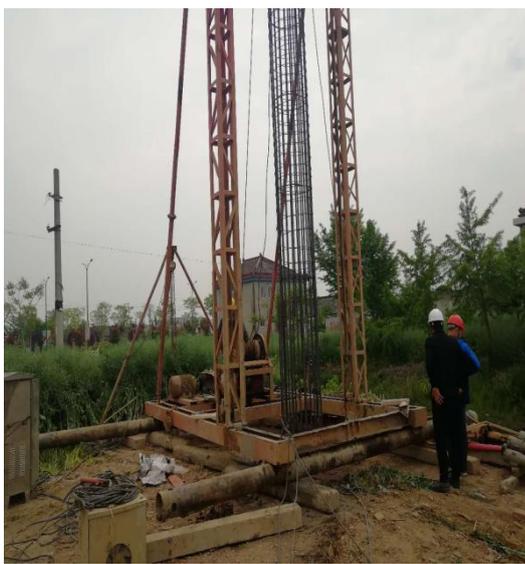

下月工程进度展望

1. 光伏区组件、汇流箱及电气接地工程和箱逆变器安装完成。
2. 外箱铁塔及架线完成。
3. 35KV 线路全部完成。
4. 对侧改造完成。

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	21 次
发出监理通知单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查安全帽佩戴，安全防护措施落实。 2. 检查临时用电规范化。 	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
<ol style="list-style-type: none"> 1、加强 对施工单位的安全教育的监管，召开专题监理例会。 2、消除安全工作中麻痹思想。 	

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-6

本月工程其它事项

暂无

江苏省住房和城乡建设厅监制
