

正衡监理

编号: ZHJL-BFZGFDZ-04

监理月报

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

2018 年 6 月第 4 期

项目监理部(章):

总监工程师: 葛定明



报告日期: 2018 年 6 月 30 日

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位联系单	0 份	工程暂停令	0 份
监理通知单	2 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	1 份	专题会议纪要	3 份

本月工程现场大事记

- 1 升压站、光伏区及 35kv 线路于 2018 年 6 月 16 日土建工程通过江苏省电力质监站验收。
2. 升压站、光伏区及 35KV 线路于 2018 年 6 月 18 日电气工程通过江苏省电力质监站验收。
- 3.2018 年 6 月 21 日盐城市电力公司领导、专家验收升压站、110kv 线路及对侧改造工程。
- 4.2018 年 6 月 26 日项目参建单位在盐城市电力公司召开启动运行前协调会。
- 5.2018 年 6 月 27 日项目参建单位在盐城市电力公司召开启动运行验收会。
- 6.2018 年 6 月 28 日项目倒送电成功。
- 7.2018 年 6 月 29 日项目全额并网成功。

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	43项	其中一次验收合格计	4 3 相
发出监理通知单（质量控制类）		2份	

工程质量情况简析（文字或图表）



升压站站用变下沉质量问题监理在监理例会中作为重点向业主提出，并且在监理例会前已以联系单形式通知业主且要求暂停施工，在站用变开始基础施工时监理向设计单位要设计图纸，肯能公司说没有，是电力公司设计及施工的，监理又咨询业主也没取到解决办法。

下月质量情况预计和目标
1. 针对升压站站用变质量问题征求业主处理意见。 2. 和业主沟通解决升压站给排水问题。 3. 整改消缺光伏区、升压站及外线验收所提问题，举一反三确保项目所有质量问题全部处理。


本月费用控制情况评析

工程总投资额		18000 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
由于本项目投资特殊业主没让监理参与工程费用控制			
预计下月工程发生费用金额			
无			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2018 年 3 月 23 日	工程竣工日期	2018 年 6 月 30 日
本月计划完成至	100%		
本月实际完成至	98%		
本月批准延长工期	本月已批准从 2018 年 6 月 22 日计算延期周期	累计延长工期	9 天
发出监理通知单（进度控制类）		1 份	

本月工程进度情况简析（文字或图表）

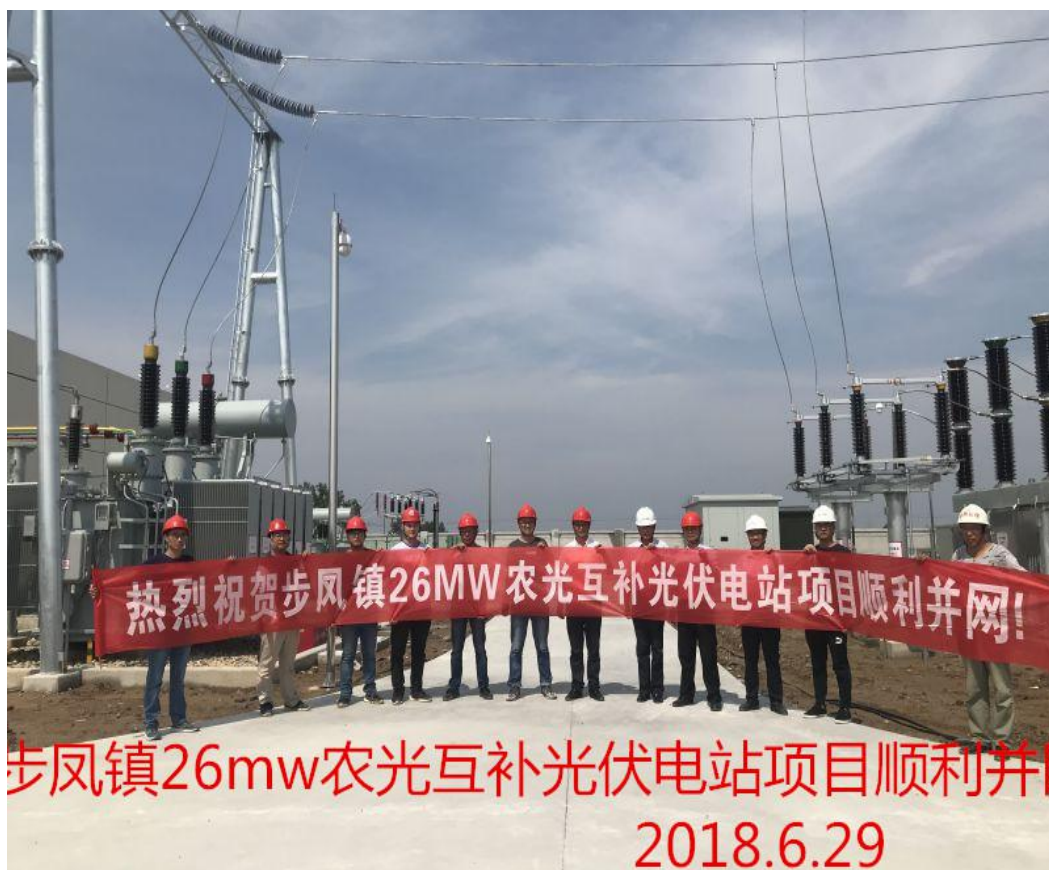

2018 年 6 月 29 日 15 时 36 分本站顺利并网

下月工程进度展望
1. 光伏区组件接地线、汇流箱封堵、桩基支架间加固及箱逆变基础工程完成。 2. 生压站剩余零星工程完成。 3. 光伏区道路工程完成。

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	22 次
发出监理通知单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴，安全防护措施落实。 2. 检查临时用电规范化。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、加强 对施工单位的安全教育的监管，召开专题监理例会。 2、消除安全工作中麻痹思想。	

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程其它事项

暂无

江苏省住房和城乡建设厅监制
