

编号: ZHJL-ZJTS-011

## 监 理 月 报

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

2019 年 8 月 第 11 期

总监理工程师: 刘 七 发



泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监理项目部 (章)

报告日期: 2019 年 8 月 31 日



由 扫描全能王 扫描创建

## 监 理 月 报

### 1 本月工程实施情况

#### 1.1 材料供应:

支架进场: 无

组件进场: 295W 组件 1440 块

箱变进场: 无

逆变器进场: 9 台

汇流箱进场: 3 台

#### 1.2 施工情况

##### (1) 光伏场区

##### 1 号地:

5#箱变:

7#箱变:

##### 2 号地:

6#箱变: 安装 1 台逆变器。

9#箱变:

##### 3 号地:

4、5 号地: 安装 2 台逆变器。

##### 6 号地:

12#箱变: 安装 4 台汇流箱, 12 台逆变器。

13#箱变: 安装 2 台逆变器。

##### 8 号地:

14#箱变: 安装 3 台汇流箱, 9 台逆变器。

##### (2) 35Kv 开关站

已于去年底并网投入运行。无施工人员施工, 土建部分消缺整改未完成。

##### (3) 35Kv 送电线路工程

由当地供电部门施工安装。

### 2 本月监理工作情况

#### 2.1 工程进度控制方面的工作情况



现场巡视检查施工进度和施工质量，督促施工单位合理安排施工计划，材料设备尽快进场，加快施工进度。

#### 2.2 工程质量控制方面的工作情况

现场巡视检查，要求施工单位抓好施工质量，必须按设计要求施工安装。

#### 2.3 安全生产管理方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工安全问题，如下：

部分施工人员未佩戴安全帽。

现场进行安全教育，并通知施工单位负责人要求整改。

#### 2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

施工单位为了申请工程款，提交业主的工程量清单签字确认。

#### 2.5 合同其他事项的管理工作情况

无

### 3 工程存在问题及建议

部分施工人员不佩戴安全帽，随处吸烟，存在安全隐患，要对进入现场的人员做好安全教育，加强管理，防止安全事故发生。

本月由于土地征用未落实和工程款结付的问题，现场施工干干停停，施工进度已严重滞后。

### 4 下月监理工作重点

#### 4.1 在工程管理方面的监理工作重点

下个月现场工作内容：巡视检查光伏区施工质量，督促完成整改工作。加强施工现场管理工作，控制好工程质量和安全，保证工程顺利进行。


#### 4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理人员施工现场巡视检查，发现质量问题要求施工单位立即整改，控制好施工质量与安全。加强内外部协调与沟通，更好地完成本项目工程监理工作。

### 5 相关照片





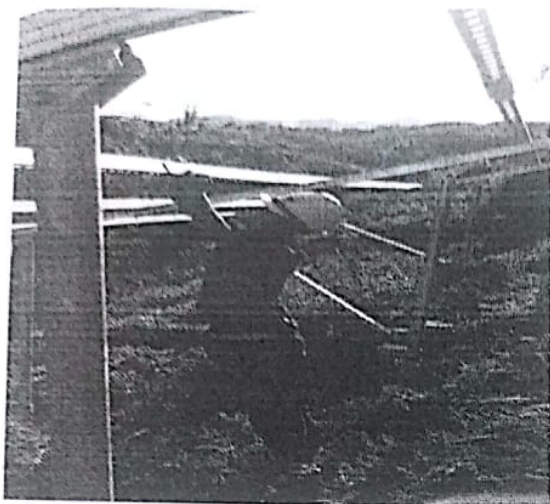


支架安装




组件安装



围栏安装

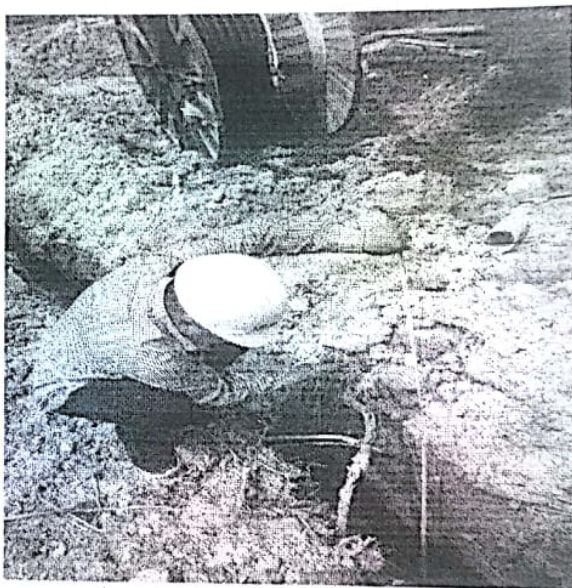

电缆沟检查

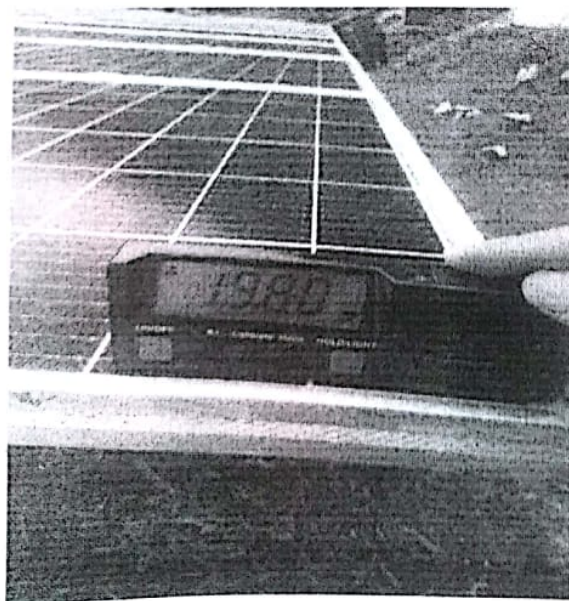

倾角度检查



接地扁钢焊接

