

编号: ZHSUP-WXAS-WRW02

无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶 光伏发电项目


监 理 周 报

2018 年 04 月 21 日 第 02 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:

报告日期: 2018 年 04 月 21 日



监 理 周 报

一、本周工程实施情况

1、施工进度：

201 车间屋面夹具基础，切割防水层施工完成约 50%，（约 3500 个，总数 8880 个）；

车棚基础开挖完成 34 个，完全浇筑完成 17 个，垫层基础浇筑完成 17 个。

2、设计图纸情况

图纸已交付现场，并完成图审，缺少箱变、SVG、高压配电房预制舱土建基础图。

3、工程资料情况

开工前期资料已上报，材料品牌选型已完成报审，未报审设备具体参数，已要求及时报审，要求总包方及时落实材料进场计划。

4、需协调事宜

无

二、本周监理工作情况及下周重点工作计划

专业	本周重点工作情况	下周重点工作计划
进度管理	我监理部和人员进驻项目以来，以工作联系单形式要求总包单位上报施工进度计划和材料进场计划，督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，但总包单位未响应，工程已延期。	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期；对车棚基础、上屋爬梯、箱变设备及高压配电房预制舱设备基础施工开挖、浇筑、回填、接地网敷设等各关键工序进行旁站及巡检；
安全管理	督促施工单位安委会定期对现场进行安全检查；要求施工单位做好施工现场安全技术交底，并对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，人证统一，现场特殊作业必须配备专业安全技术管理人员，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	现场执行情况良好	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报

理		送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	监督施工单位物资按计划供应连续，满足施工进度需要

常州正衡电力工程监理有限公司
无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目监理部
2018 年 04 月 21 日


图片附件：





屋面防水层施工工序示意



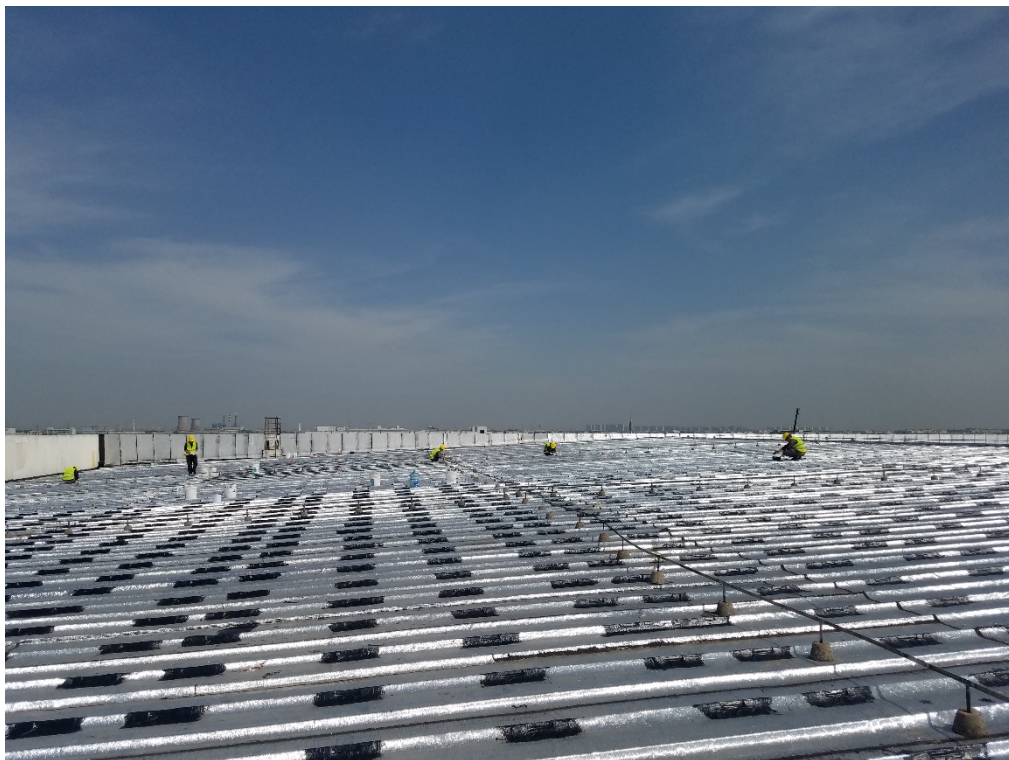

201 车间屋面夹具基础整体施工情况



新建停车场车棚基础垫层浇筑



新建停车场车棚基础基坑检查



新建停车场车棚基础浇筑



新建停车场车棚整体施工情况

—END—
