

编号: ZHSUP-WXAS-WRW08

无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶 光伏发电项目


监 理 周 报

2018 年 06 月 02 日 第 08 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:

报告日期: 2018 年 6 月 2 日



监 理 周 报

一、本周工程实施情况

1、施工进度：

201 车间屋面：

组件到场 3810 块，安装完成 100%；

接地扁铁吊装完成。

201 车间外爬梯：

爬梯基础基坑浇筑完成。

车棚：

由于材料及审批原因车棚本周未施工；

不合格问题未进行处理。

高压设备：

电缆全部到场。到场率约 100%.

电缆沟垫层铺沙完成约 80%.

镀锌管焊接处理完成 10%.

2、设计图纸情况

图纸已交付现场，并完成图审，（包括箱变、SVG、高压配电房预制舱土建基础图）

3、工程资料情况

开工前期资料部分已上报，要求总包方及时落实材料进场计划。（已多次要求报审但施工方一直敷衍。）

4、需协调事宜

无


二、本周监理工作及下周重点工作计划


专业	本周重点工作情况	下周重点工作计划
进度管理	我监理部和人员进驻项目以来，以工作联系单形式要求总包单位上报施工进度计划和材料进场计划，督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，但总包	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，确保工程计划工期；对车棚基础、上屋爬梯、箱变设备及高压配电房预制舱设备基础施工开挖、浇筑、回填、接地网敷设等各关键工序进行旁站及巡检；

	单位未响应，工程已延期。	
安全管理	督促施工单位安委会定期对现场进行安全检查；要求施工单位做好施工现场安全技术交底，并对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，人证统一，现场特殊作业必须配备专业安全技术管理人员，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	现场执行情况良好	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	监督施工单位物资按计划供应连续，满足施工进度需要



常州正衡电力工程监理有限公司
无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目监理部
2018年06月02日

图片附件：

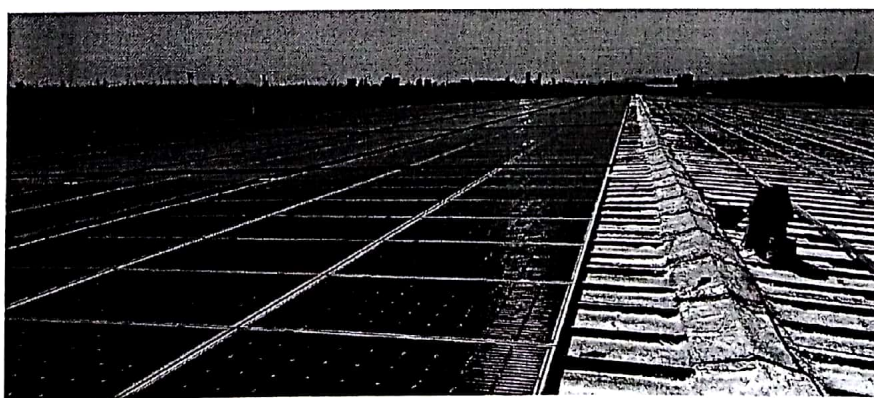

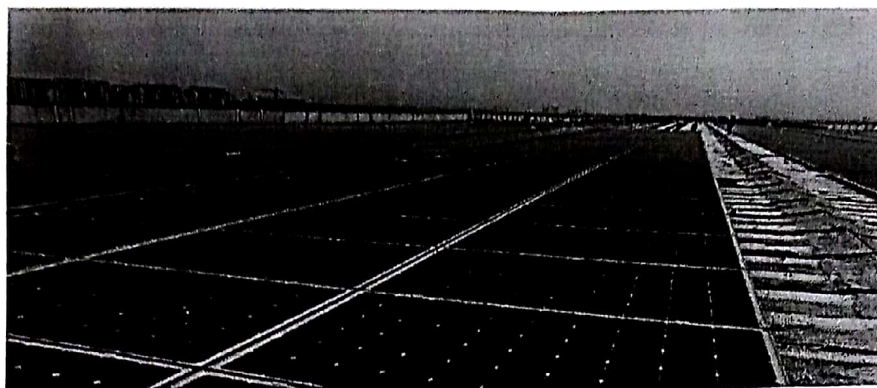



201 屋面组件安装

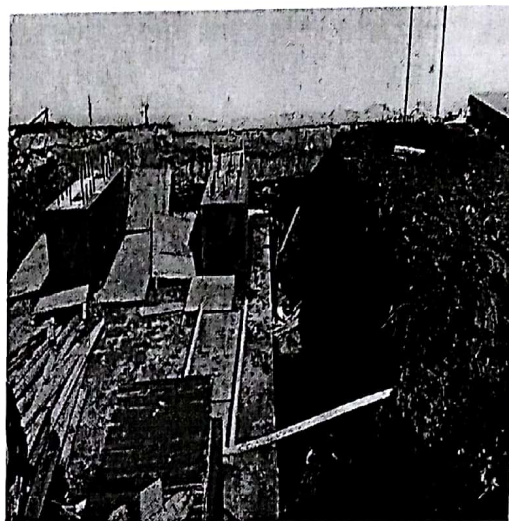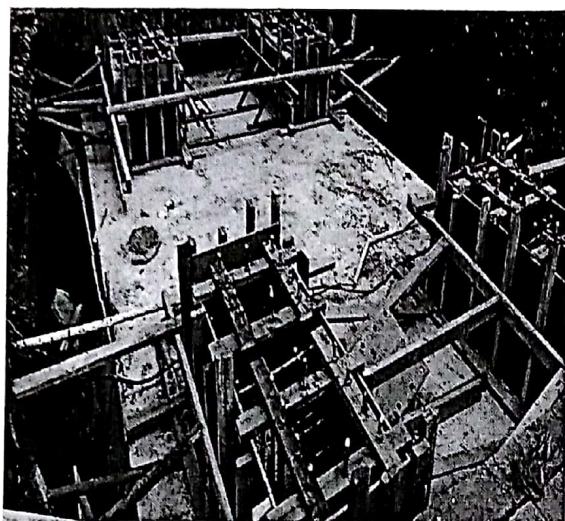

钢爬梯基础支模及浇筑



电缆沟垫层铺沙及镀锌管焊接

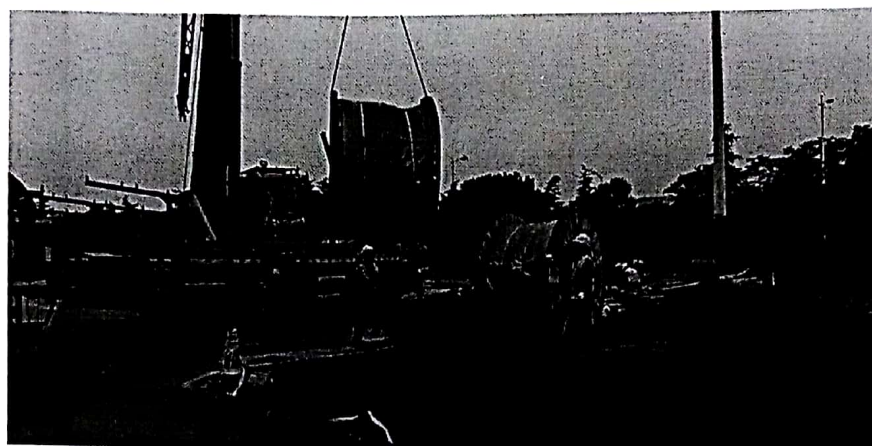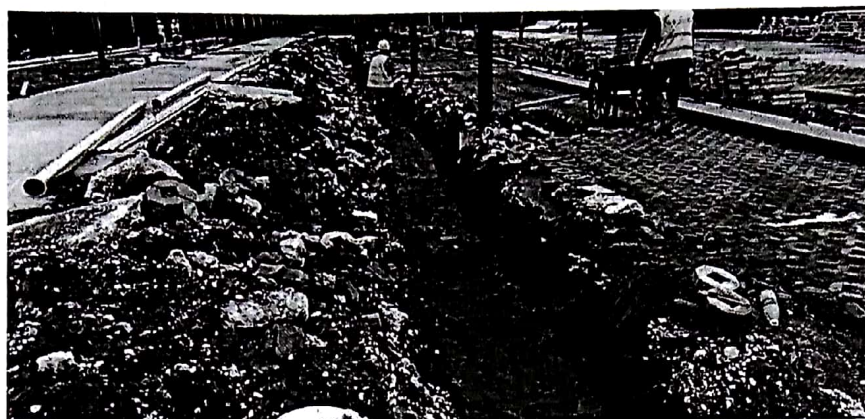

电缆沟施工及电缆到场示意图

—END—
