



编号: ZHJL-JLYB-001

监 理 月 报

工程名称: 宁波杭州湾新区跨境电商仓储(二期) 5.19MW 分
布式光伏发电项目

2018 年 03 月第 1 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 苗守明

报告日期: 2018 年 03 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目 月次 第 1 次 月报开

始时间 2018 年 03 月 15 日 结束日期 2018 年 03 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

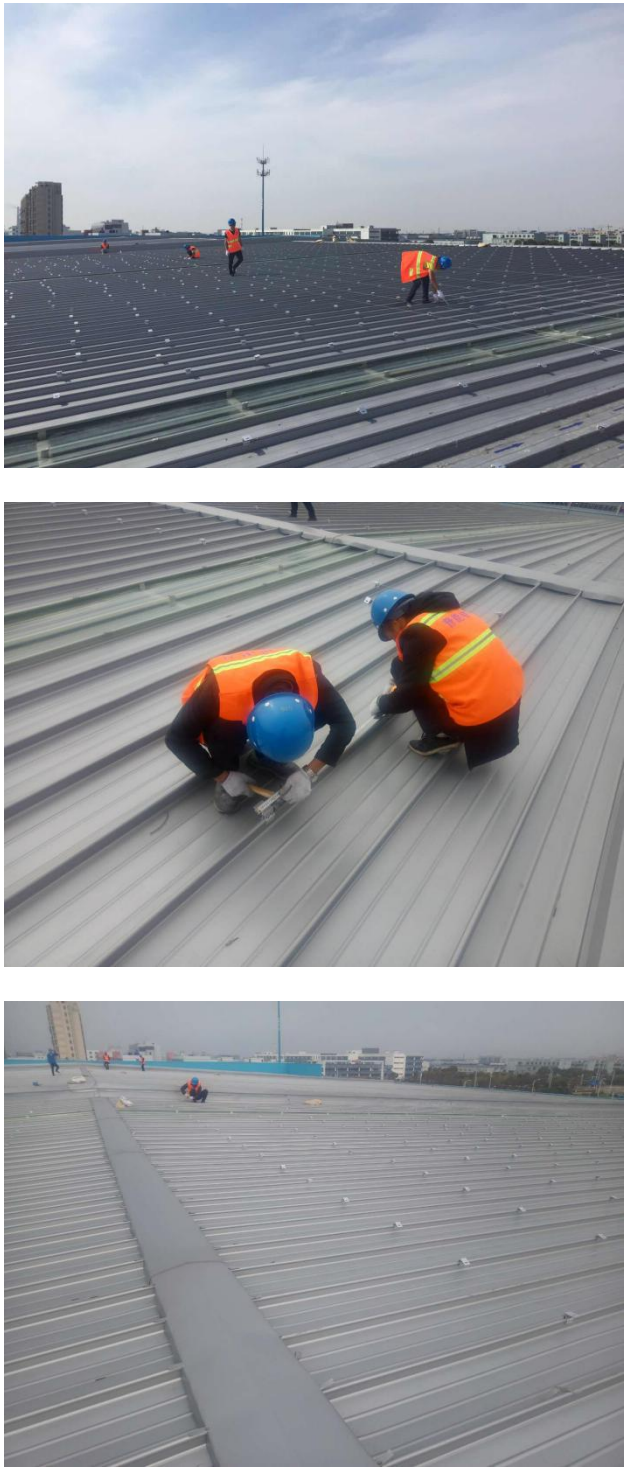
一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目		影像	7 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1、本项目共分为二期 1、二期 2 两个项目； 2、现屋面安全防护栏已安装完成； 3、目前该项目进场材料只有夹具，其它材料及设备还未进场； 4、目前 1#厂房屋面夹具安装共完成 75%，2#	1、厂区内材料及设备全部进场完毕； 2、1#、2#、3#、4#厂房屋面夹具、导轨、组件、桥架、汇流箱、逆变器全部安装完成； 3、土建部分，基础、电缆沟施工全部完成； 4、电缆敷设全部完成；

	  	厂房屋面夹具 安装完成 100%， 4#厂房屋面夹 具安装完成 50%； 5、我方监理每 天对现场进行 巡视检查，并做 好记录。	5、配电房设备 安装调试全部 完成； 6、本项目全部 并网发电。
--	--	---	---

			
	设备交付进度	目前只夹具进场	材料及设备全部进场完成
	设计交付进度	土建图纸还未交付	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，	落实质量保证

		运行良好	体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已进行图纸交底和会审	
	设计交底	已进行交底	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	未交底	督促施工方进行安全、技术交底
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	目前还未有质量问题	
	主要原材料质量	还未进场	已催促施工单位
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	未进场	

	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订中	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
普能新能源								
1	定位放线	2018.03.15	2018.03.20	2018.03.24	2018.3.31	5.19MW	5.19MW	
2	支架安装	2018.03.24	2018.04.10					
3	组件安装							
4	电缆桥架（直流）							
5	电缆桥架（高压）							
6	直流电缆 4mm ²							
7	直流电缆 2*70mm ²							
8	高压电缆 3*150/3*70 敷设							
9	高压电缆 3*150/3*70 安装							
10	箱式变压器安装							
11	逆变器安装							
12	SVG 补偿							

	装置安装							
13	一、二次室设备							
14	铁塔架设							

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
普能新能源								
1	支架安装	2018.04.01	2018.04.10			5.19MW		
2	组件安装	2018.4.5	2017.4.18			5.19MW		
3	电缆桥架（直流）	2018.4.17	2017.4.20			5.19MW		
4	电缆桥架（高压）	2018.4.17	2017.4.20			5.19MW		
5	直流电缆4mm2	2018.4.18	2018.4.22			5.19MW		
6	直流电缆70mm2	2018.4.18	2018.4.22			5.19MW		
7	高压电缆3*150/3*70 敷设	2018.4.18	2018.4.22			5.19MW		
8	高压电缆3*150/3*70 安装	2018.4.18	2018.4.22			安装完成		
9	箱变逆变器接线	2018.4.19	2018.4.23			4 台		
10	逆变器安装	2018.4.15	2018.4.22			104 台		
11	SVG 补偿装置安装	2018.4.22	2018.4.25			全部完成		
12	一、二次室设备	2018.4.22	2018.4.25			全部完成		
13	系统调试	2018.4.26	2018.4.29			全部完成		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事			分包队	分包队	系统外	系统外

伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍 数量	队伍人 数
无	无	无		25 人	2	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光
伏发电监理部

2018 年 03 月 31 日
