



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

监 理 月 报

常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面电站项目

批准: 李维军

审核: 刘士发

编辑: 刘瑞杰

2018 年 06 月第 03 期

报告日期: 2018 年 06 月 30 日



监 理 月 报

编号：ZHJL-YJ-YB-003

工程名称：常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面电站项目

月报开始时间：2018 年 06 月 01 日 结束日期：2018 年 06 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面电站项目		影像	9 张	

一、 监理重点工作情况

专业	项目进度照片	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	接地扁铁焊接安装作业 	1、本项目在亿晶直溪一期、二期（40+20MWp）光伏旁边扩建三期光伏，本期建设规模 40.4MWp，采用分区发电、集中并网方式。 2、本月主要工作为光伏并网区域全部完成，升压站电气设备调试全部完成，保证顺利并网发电。要求施工技术人员提前做好施	项目并网后整改，光伏区未安装完成区域全部完成。


光伏区汇流箱安装完成



高压电缆头制作安装



高压电缆头制作安装完成

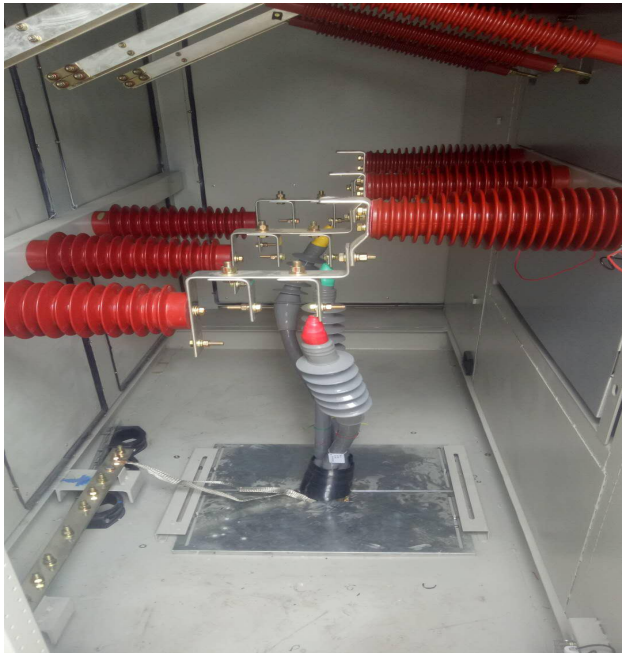

工技术交底工作。
要求施工人员安全
文明施工。

高压电缆耐压试验




质监站对本项目检查 2018.6.6



检查高压开关柜

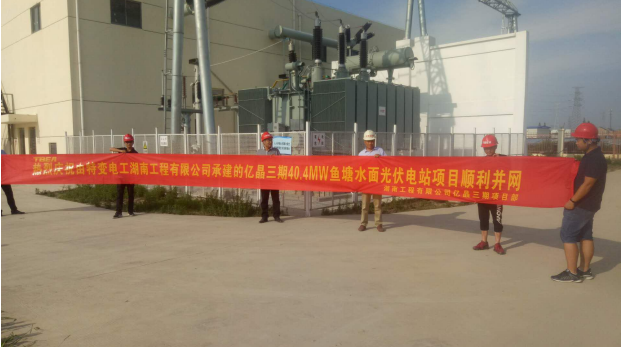

	高压开关柜检查  2018. 6. 25 项目成功并网 		
	设备交付进度	1、支架到货总量约为 100%。接地扁铁到货 100%。管桩到货 100%。组件到货 40MW，以每天 6 车组件到场。箱变到场 16 台，逆变器到场 16 台。高压电缆到货 100%。光伏专用电缆到货 100%。 所有电气设备材料已全部到场。	

		图纸完成	已完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	严格落实施工方案
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明施工良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	电气设备调试	升压站二次系统调试
	主要原材料质量	支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	进场设备质量合格	进行进场报验、开箱检查

	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全	施工人	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	策划文件	数	分包队	分包队	系统外包队	系统外队伍人
伤	备	故	（份）		伍数量	伍人数	伍数量	数
无	无	无		150 人	3	70	/	/

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	项目并网后整改，光伏区未安装完成区域全部完成。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工	督促施工单位按照施工规范和设计要求进行施工。

	项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

常州亿品金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面电站项目

2018年6月30日

