



监 理 月 报

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目工程

2018 年 6 月 第 1 期



总监理工程师：苗宇明

西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目工程监理项目部

报告日期：2018 年 6 月 25 日

监 理 月 报


工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目 月次 第1次 月报开始时间 2018年05月25日 结



束日期 2018年6月25日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	<u>西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目</u>	隆基绿能光伏工程有限公司	影像	6张	

1、 监理重点工作情况

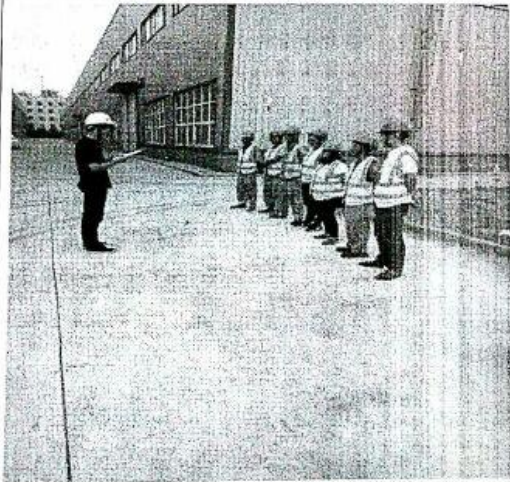专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		开工前施工现场准备及前期资料报审,及开工前的安全交底。爬梯及防护制作与吊装、夹具支架的安装等。	桥架敷设、组件安装、逆变器安装、电缆沟开挖、开关柜调试

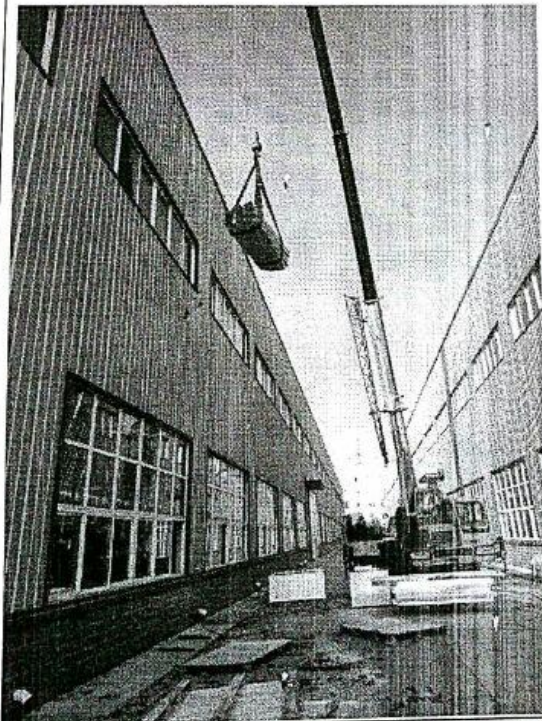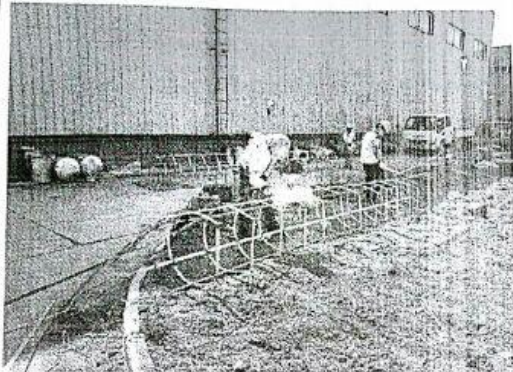

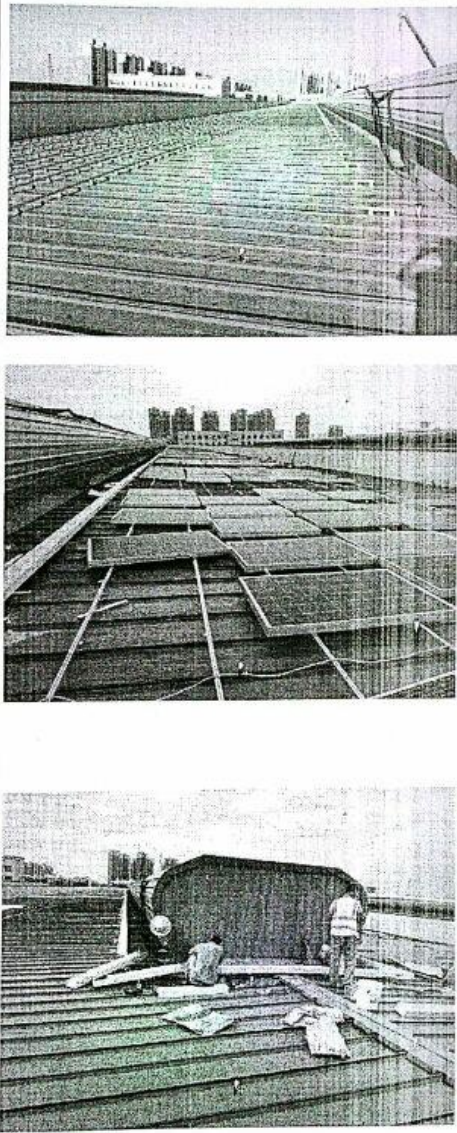		
设备交付进度	支架全部到场、 组件、桥架、等 部分进场	

	设计交付进度	图纸完整	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	无	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	变更	变更 1 次
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	夹具安装	夹具放线及安装
	主要原材料质量	夹具外观检查合格，电缆观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关

	设备质量	进行进场报验、 开箱检查	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查 力度，加大工 序报验抽查力 度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始 时间	计划结束 时间	施工开始 日期	施工结束 日期	本月实 际完成 (完成 量 / 总 量)	累 计 完 成 (完成 量 / 总 量)	备注
1	定位放线	2018. 5. 31	2018.6.2	2018.5.31	2018.6.2	100%	100%	
2	支架安装	2018. 6. 1	2018. 6.7	2018. 6. 17	2018.6.25	80%	80%	
3	组件安装	2018. 6. 7	2018. 6. 12			0%	0%	
4	电缆桥架 (直流)	2018.6.12	2018.6.14	2018.6.24		25%	25%	
5	直流电缆 4mm2							
6	直流电缆 3*35mm/ 3*50mm							
7	高压电缆 3*95/3*7 0 敷设							
8	逆变器安 装	2018.6.13	2018.6.14			0%	0%	
9	开关柜	2018.6.13	2018.6.15			0%	0%	
10	二次室设 备	2018.6.13	2018.6.15			0%	0%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	备注
1	定位放线							单位为 厂房
2	支架安装							单位为 厂房
3	组件安装							单位为 厂房
4	电缆桥架 (直流)							单位为 米数
5	直流电缆 1*4						/	单位为 米数
6	直流电缆 3*35mm/ 3*50mm						/	单位为 米数
7	高压电缆 3*95/3*7 0敷设				/		/	
8	逆变器安 装							
9	10KV 开关 柜			/	/		/	
10	二次室设 备				/			

四、 安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		10人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	本月完成了全部夹具安装及支架 (80%)、 桥架安装 50% 另外对更换后的组件进行 吊装但组件未进行安装	下月主要进行组件安装, 交流电缆敷设接地环网 是施工等配合业主及各方完成并网。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制 度》, 安委会要定期对现场进行安全检查; 对施工人员进行安全培训、考试, 提高作 业人员安全防范意识, 落实安全文明施工 措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部 施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资 格证明文件, 实施安全监理, 发现问题及时提出 整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查; 单位工程重点部 位施工进行旁站; 督促施工单位质量通病 防治措施; 监督施工项目部落实强制性条 文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及正泰的 规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底, 现场检查施工人员是否按照技术交底内 容进行施工。	参与过程中重要 (关键) 环节的施工技术交底会, 监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量, 及时审核施工项目部报送的 工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作, 督 促施工单位做好物资保管工作, 要求施工 单位安排人员对施工现场进行巡查, 确保 物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求, 安排人员、 机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目监理部

2018 年 6 月 25 日
