

SHPDDE-B19-003



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目工程

2018年8月 第1期

监理项目部（章）

总监理工程师： 



西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目工程监理项目部

报告日期： 2018 年 8 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目 第3次 月报开始时间 2018年06月25日 结束日

期 2018年8月25日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目	隆基绿能光伏工程有限公司	影像	6张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		本月项目因国家政策原因组件价格不稳定，组件未到场，无施工项。	剩余 95% 组件安装



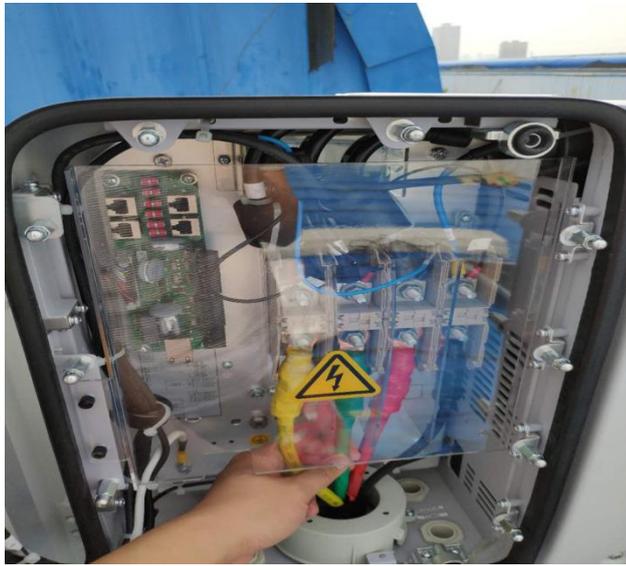

			
设备交付进度		支架全部到场、 组件、桥架、等 部分进场	
设计交付进度		图纸完整	
质量体系运作情况		质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运 行情况进行检 查
施工图会审		完成	
设计交底		无	
方案审查		完成	督促施工单位 报审其他资料
技术交底		完成	
设计变更		变更	变更 1 次
安全	安全培训情况	新进场员工已进 行安全培训	督促施工单位 对进场新员工

			进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	夹具安装	夹具放线及安装
	主要原材料质量	夹具外观检查合格，电缆观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	进行进场报验、开箱检查	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2018. 5. 31	2018.6.2	2018.5.31	2018.6.2	100%	100%	
2	支架安装	2018. 6. 1	2018. 6.7	2018. 6. 17	2018.6.25	100%	100%	
3	组件安装	2018. 6. 7	2018. 6. 12			5%	5%	
4	电缆桥架	2018.6.12	2018.6.14	2018.6.24		100%	100%	
5	直流电缆 4mm ²							
6	直流电缆 3*35mm/ 3*50mm							
7	高压电缆 3*95/3*7 0 敷设							
8	逆变器安装	2018.6.13	2018.6.14			100%	100%	
9	开关柜	2018.6.13	2018.6.15			100%	100%	
10	二次室设备	2018.6.13	2018.6.15			0%	0%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线							单位为 厂房
2	支架安装							单位为 厂房
3	组件安装	2018. 6. 7	2018. 6. 12	2018.6.20				单位为 厂房
4	电缆桥架 (直流)							单位为 米数
5	直流电缆 1*4						/	单位为 米数

6	直流电缆 3*35mm/ 3*50mm						/	单位为 米数
7	高压电缆 3*95/3*7 0 敷设				/		/	
8	逆变器安 装							
9	10KV 开关 柜			/	/		/	
10	二次室设 备				/			

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		10 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	本月完成了全部夹具安装及支架（100%）、桥架安装 100%另外对更换后的组件进行吊装但组件未进行安装	下月主要进行组件安装，配合业主及各方完成并网。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及正泰的规范要求施工

	文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目监理部

2018年8月25日
