



正衡监理

编号: WH-JL.YB-002

## 监 理 月 报

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

2018 年 6 月第 2 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2018 年 6 月 30 日



由 扫描全能王 扫描创建

# 监 理 月 报

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JLYB-002

## 一、工程形象进度 (形象进度表、照片)



形象进度表



| 分项名称            | 施工工序        | 完成情况       | 备注                                     |
|-----------------|-------------|------------|----------------------------------------|
| 光伏区             | 定位放线        | 完成 12MW    | 2018 年 05 月 15 日<br>开始施工<br>光伏区容量 50MW |
|                 | 预制桩打桩       | 完成 10080 根 |                                        |
|                 | 组件安装        | 完成 10MW    |                                        |
|                 | 支架安装        | 完成 10MW    |                                        |
|                 | 电气施工        | 完成 4MW     |                                        |
| 110KV 开关站       | 管理区围墙砌筑     | 完成 80%     |                                        |
|                 | 主控室 配电室     | 完成 80%     |                                        |
|                 | SVG 基础      | 完成 100%    |                                        |
|                 | 生活辅助厂房      | 完成 60%     |                                        |
|                 | 一二次设备       | 完成 100%    |                                        |
| 110KV 外线        | 线路复测        | 完成 100%    |                                        |
|                 | 基础开挖        | 完成 100%    |                                        |
|                 | 基础浇筑        | 完成 100%    |                                        |
|                 | 塔材 导线 金属等材料 | 完成 100%    |                                        |
| 10KV 临时用电<br>线路 | 水泥杆安装       | 完成 0%      |                                        |
|                 | 变压器 吕线等材料   | 完成 0%      |                                        |







由 扫描全能王 扫描创建

形象照片

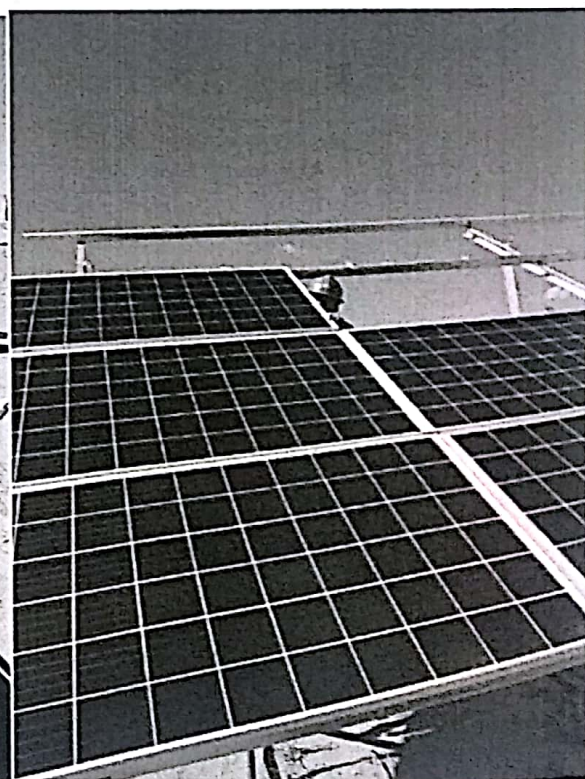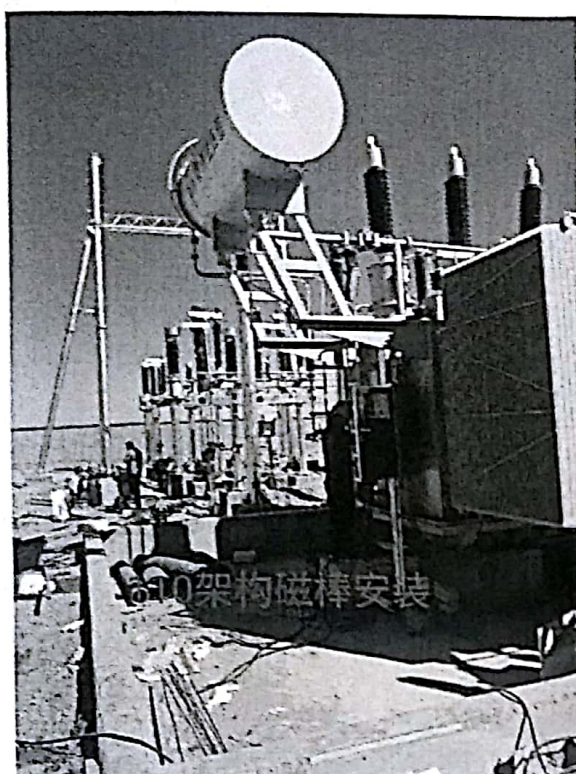

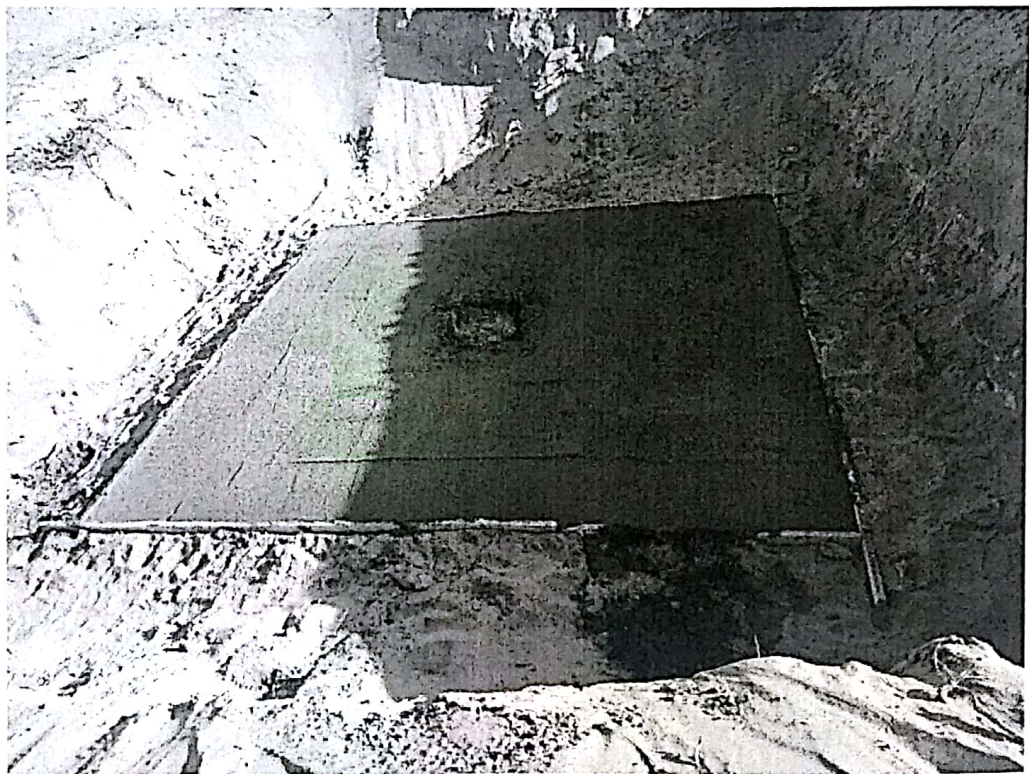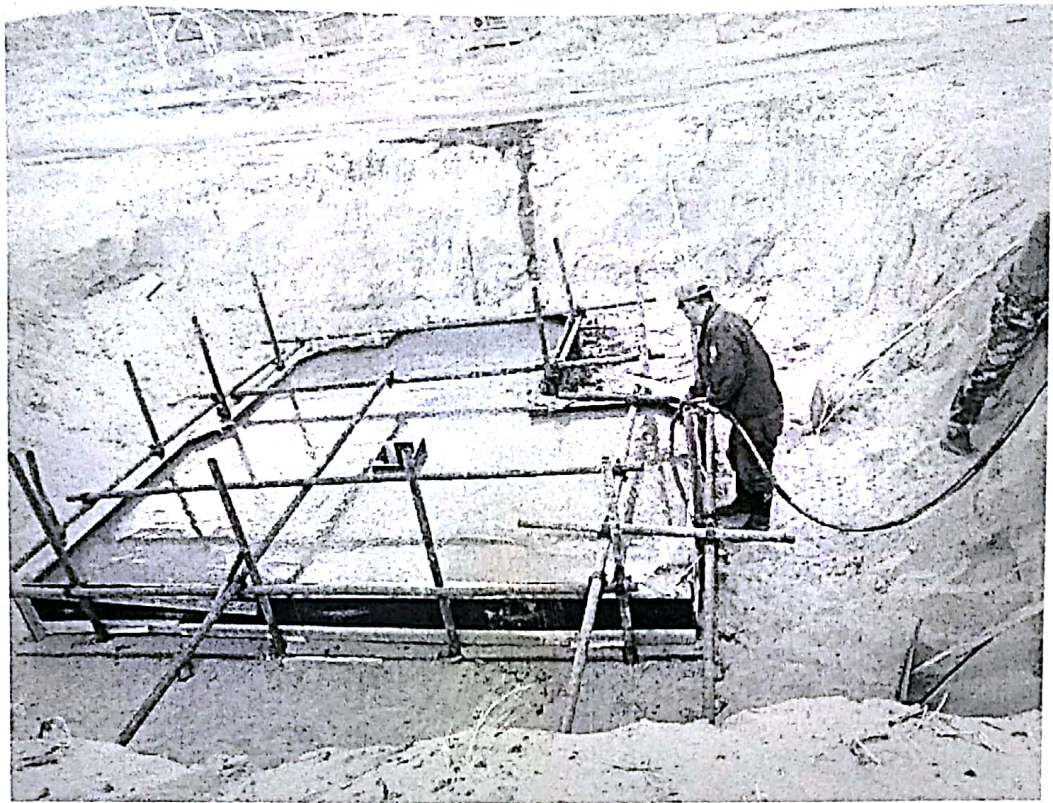

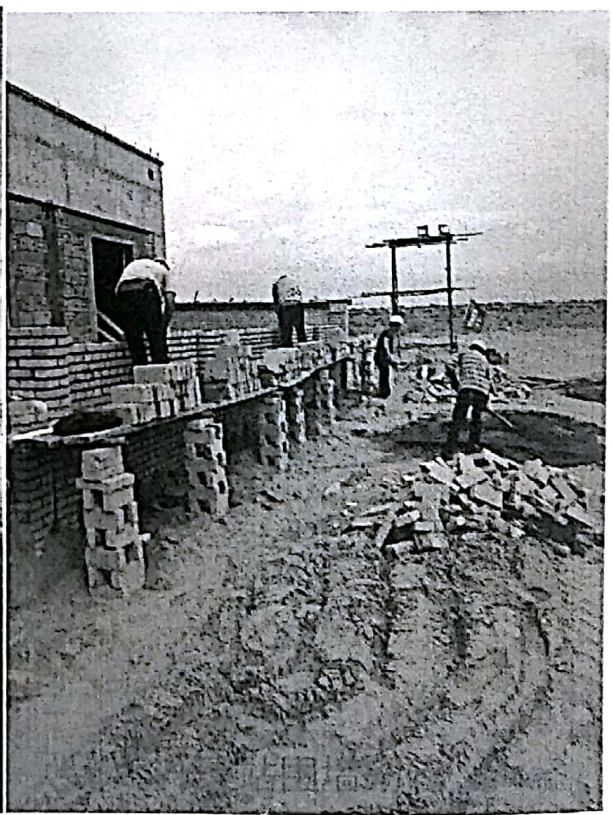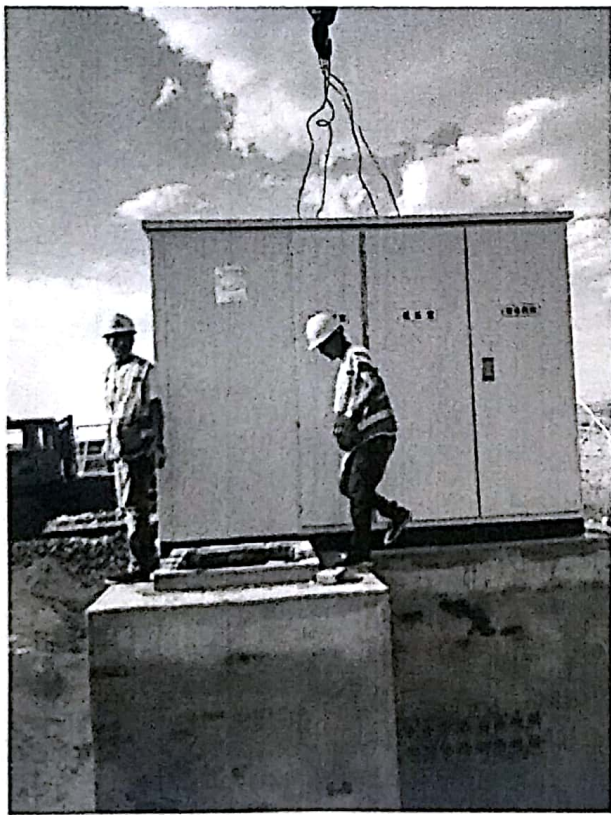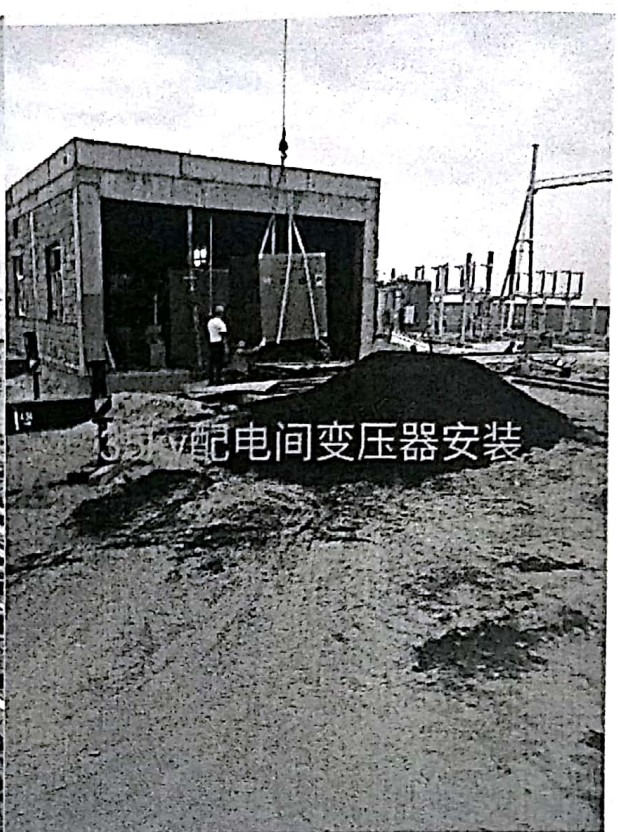


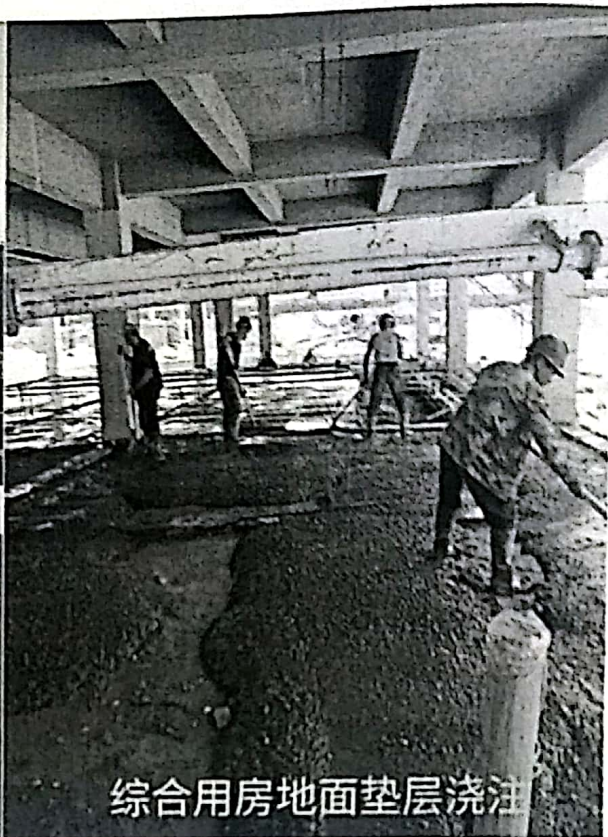

综合用房地面垫层浇注





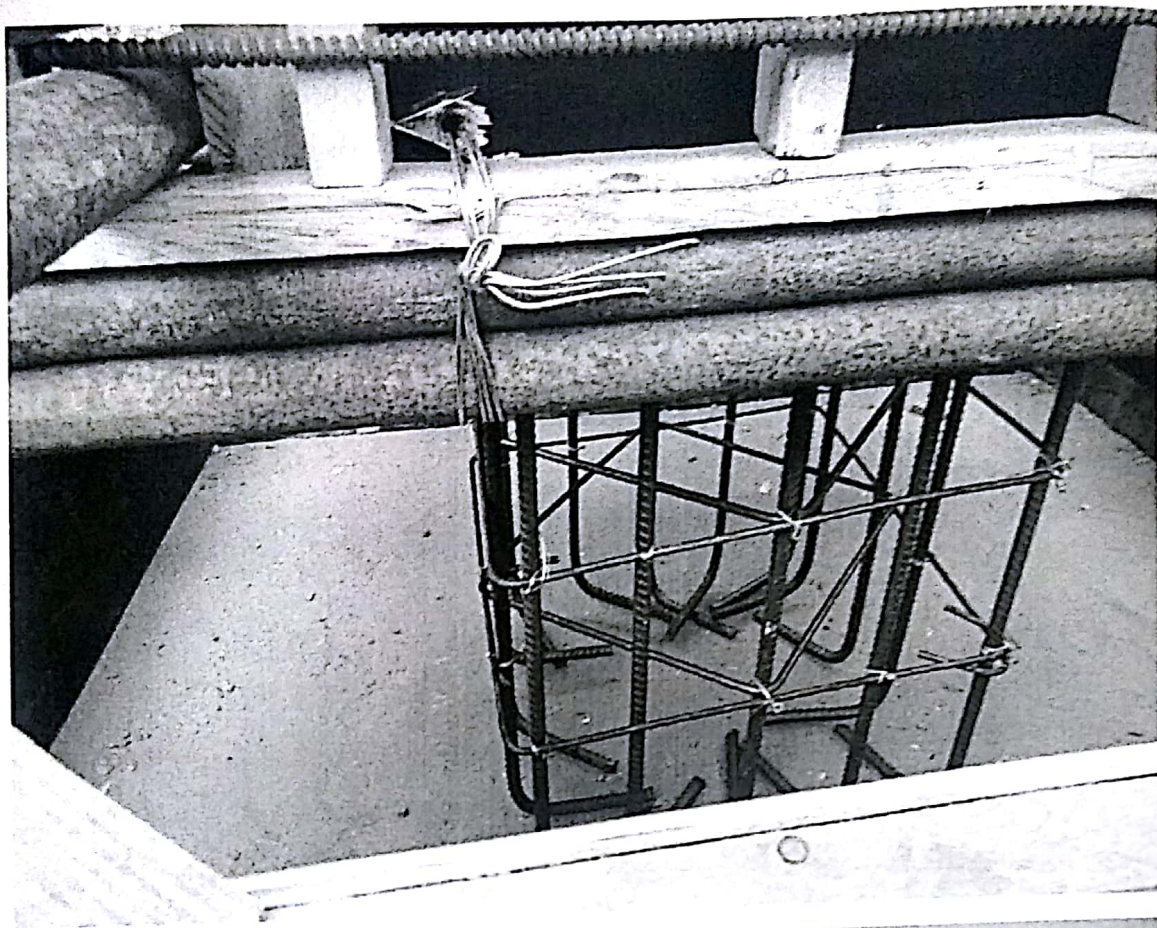

### 一、主要监理工作（质量、安全、进度、投资）

在监理过程中，认真执行监理规范的要求，严格按监理规划、监理细则进行操作，按照有关规范的要求对工程质量、安全、进度、等方面进行全面控制，并严格按监理程序进行。

为保证工程质量，督促施工单位及时上报工程资料，并对提交的工程资料进行了认真、严格审核；监理部定期召开监理工地例会，对上周工作进行总结，并安排下周工作，对出现的问题进行协调解决，如现场出现特殊问题立即召开专题会议，尽快解决，并将会议纪要整理打印发于各单位。平时通过检查、旁站、巡视、验收，杜绝出现失控现象。在实际操作过程中严格执行验收程序，原材料不经监理验收合格，严禁进场使用，对需复试的原材料严格执行见证取样制度，待复试合格后方可进场使用。上道工序尤其是隐蔽和关键工序验收不合格严禁进入下道工序施工，并且在砼施工过程中进行全程旁站监理，发现问题及时处理，并做好旁站记录。对工程中出现的质量问题认真对待，由各方共同商定处理方案，并督促其按处理方案进行整改，并再次验收合格后方可进行下道工序施工，确保质量符合要求。

本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，汇同各方检查了现场的机械设备、临时用电、消防、场容场貌等项目，针对存在安全隐患的，立即发出监理通知单要求整改，在监理的督促下和各方配合下，本月安全文明生产状况良好，施工现场未发生任何人身伤亡和设备损坏事故。

进度方面督促帮助施工单位合理安排好人力、物力，积极的做好消缺工作。另外本监理部及时对现场情况（如质量、安全、进度等）进行总结，并编制监理周报、月报，较好地促进了工程项目的实施。

### 三、工程存在问题及建议

在参建各方的共同努力下，本月质量、安全文明总体良好：

- 1、光伏区并网发电 2MWp，仍有 10MWp 未并网发电，38MWp 的施工用地业主正在协商。
- 2、一、二次设备基本安装结束，但所有线缆未封堵。
- 3、外线及开关站一次设备塔杆的接地标识均为做。
- 4、开关站内综合用房、35KV 配电室、站内道路的土建及二次装修均未完成。

针对以上的情况，监理部在现场及时指出并下发监理工作联系单及罚款单，要求施工方项目部加强管理和安全技术交底工作，并且增加施工人员与机械确保施工顺利进行。

### 四、下月监理工作安排

下月工作任务：站内光伏区组件、支架、管桩安装，开关站及外线施工进入整改消缺，要求施工单位及时提交与工程相关的资料，做到资料与工程同步，同时控制好施工安全和质量，对影响质量、安全的因素进行严格控制。



## 项目监理大事记

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号: WH-JLDSJ-002

### 主要内容

- 1、2018 年 06 月 03 日监理单位组织召开第 9 次工程例会。
- 2、2018 年 06 月 06 日监理单位组织召开第 10 次工程例会。
- 3、2018 年 06 月 15 日监理单位组织召开第 11 次工程例会。
- 4、2018 年 06 月 18 日监理单位组织召开第 12 次工程例会。
- 5、2018 年 06 月 20 日监理单位组织召开第 13 次工程例会。

总监理工程师: 刘士发

2018 年 6 月 30 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 1 份。

