



正衡监理

编号: WH-JLYB-005

监 理 月 报

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

2018 年 9 月第 5 期



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2018 年 9 月 30 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JLYB-005

一、工程形象进度 (形象进度表、照片)





形象进度表

分项名称	施工工序	完成情况	备注
光伏区	定位放线	完成 12MW	2018 年 05 月 15 日 开始施工 光伏区容量 50MW
	预制桩打桩	完成 11496 根	
	组件安装	完成 10.5MW	
	支架安装	完成 10.5MW	
	电气施工	完成 10.5MW	
110KV 开关站	管理区围墙砌筑	完成 100%	
	主控室 配电室	完成 90%	
	SVG 基础	完成 100%	
	生活辅助用房	完成 85%	
	一二次设备	完成 100%	
	厂区道路	完成 90%	
110KV 外线	线路复测	完成 90%	
	基础开挖	完成 100%	
	基础浇筑	完成 100%	
	塔材、导线、金属等材料	完成 100%	
10KV 备用电源线路	水泥杆安装	完成 0%	
	变压器、铝线等材料	完成 0%	






由 扫描全能王 扫描创建




形象照片

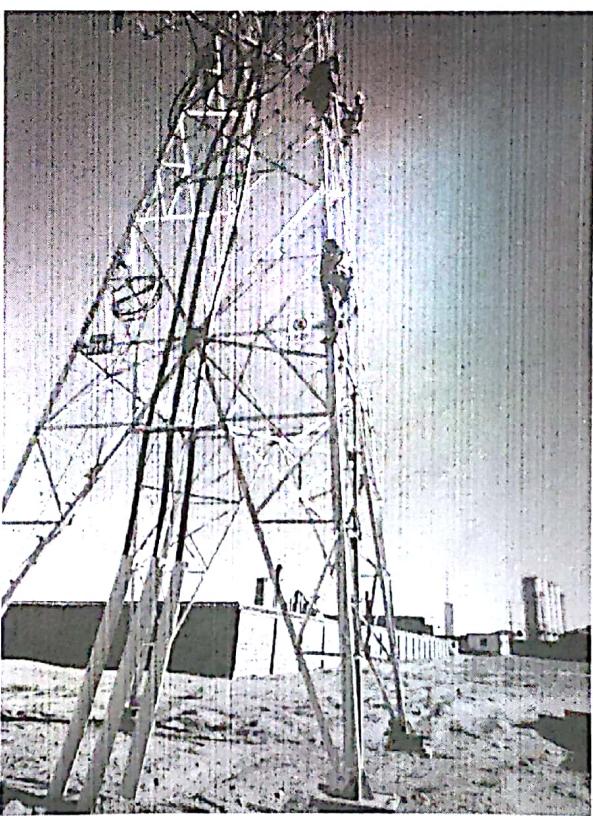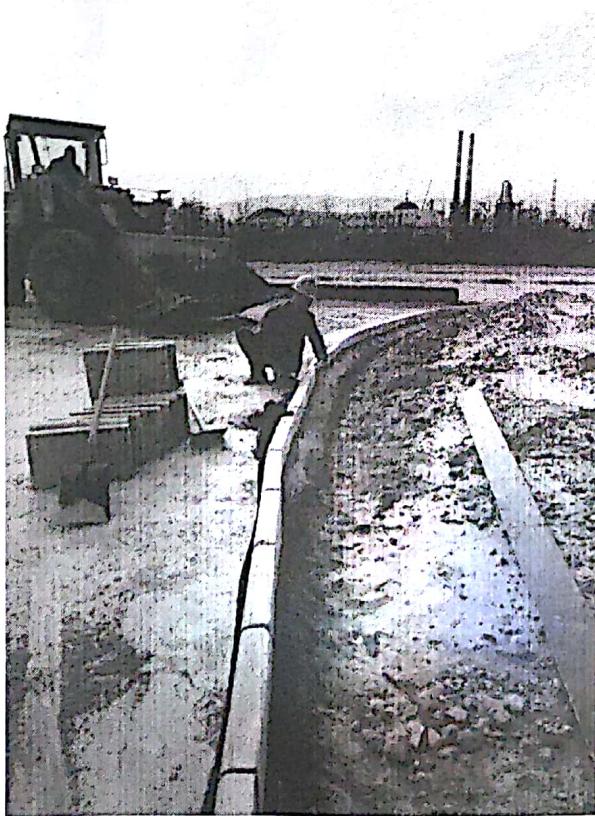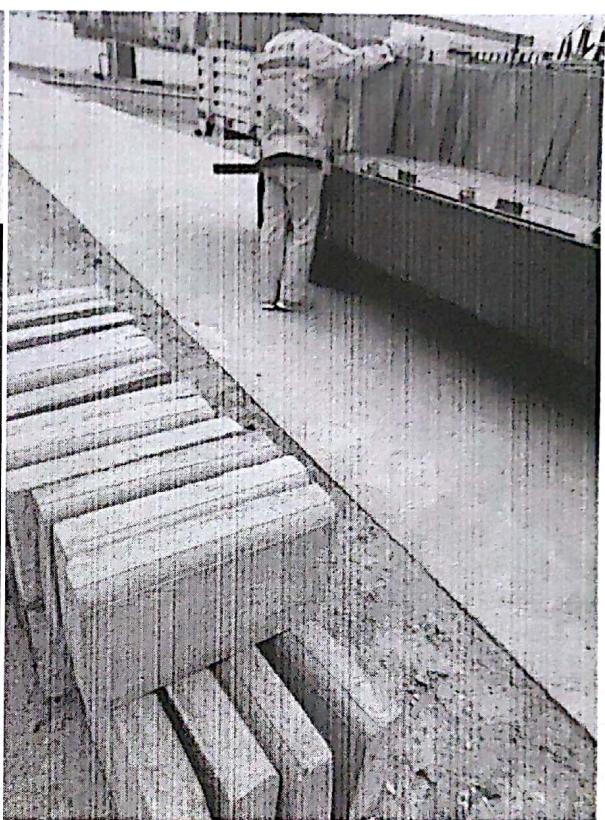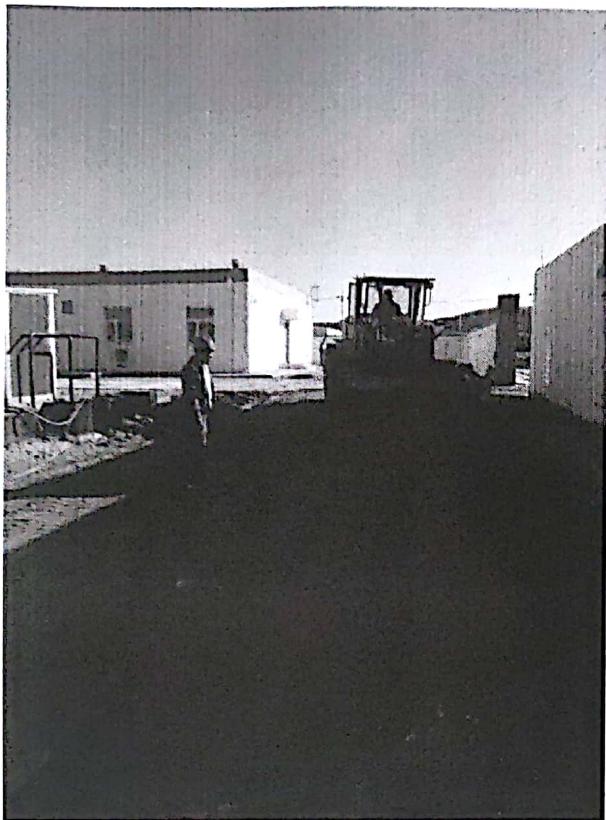


由 扫描全能王 扫描创建

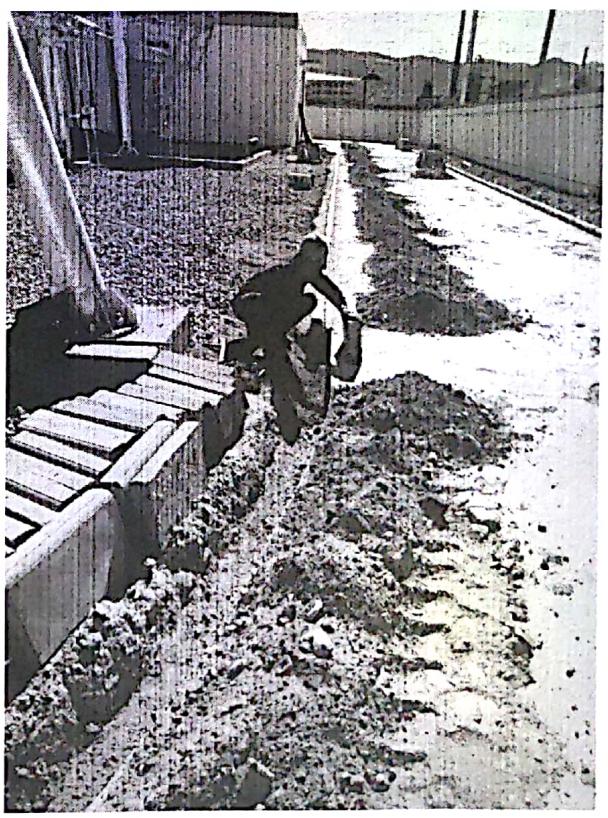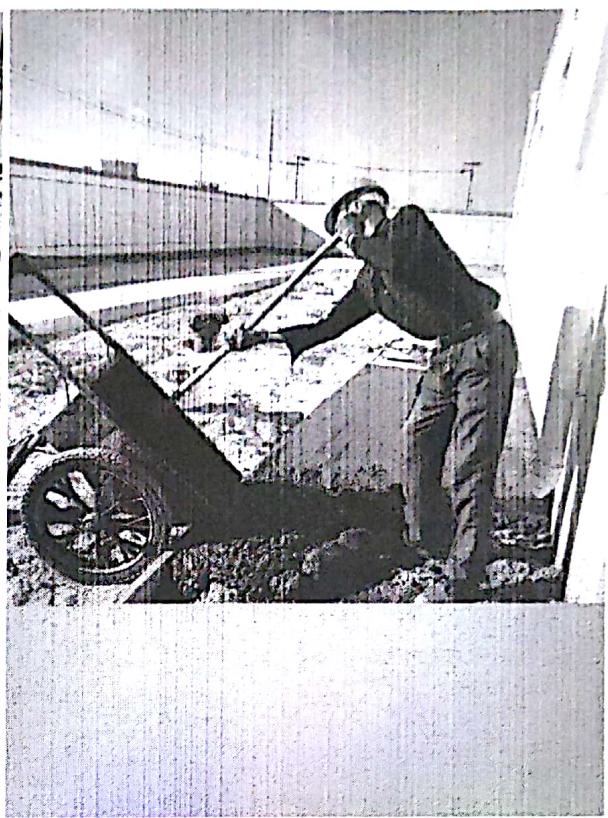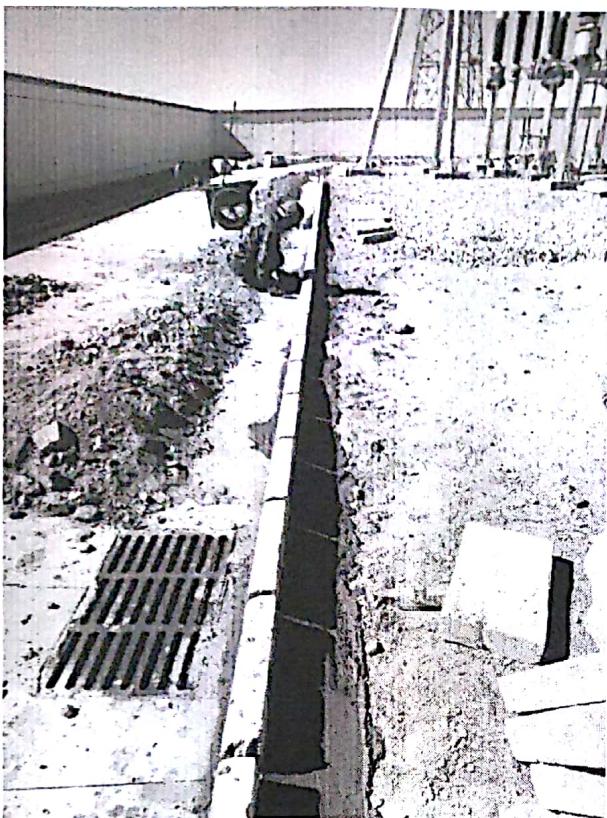


由 扫描全能王 扫描创建

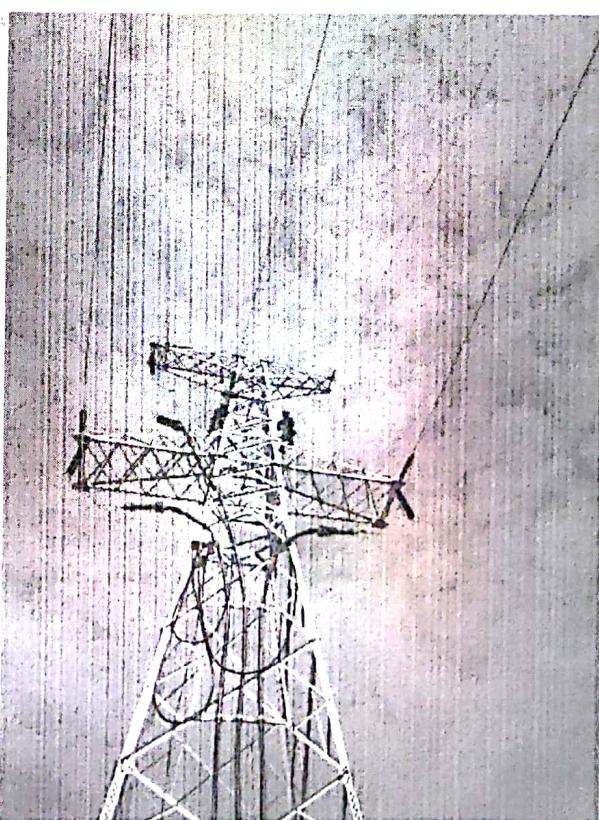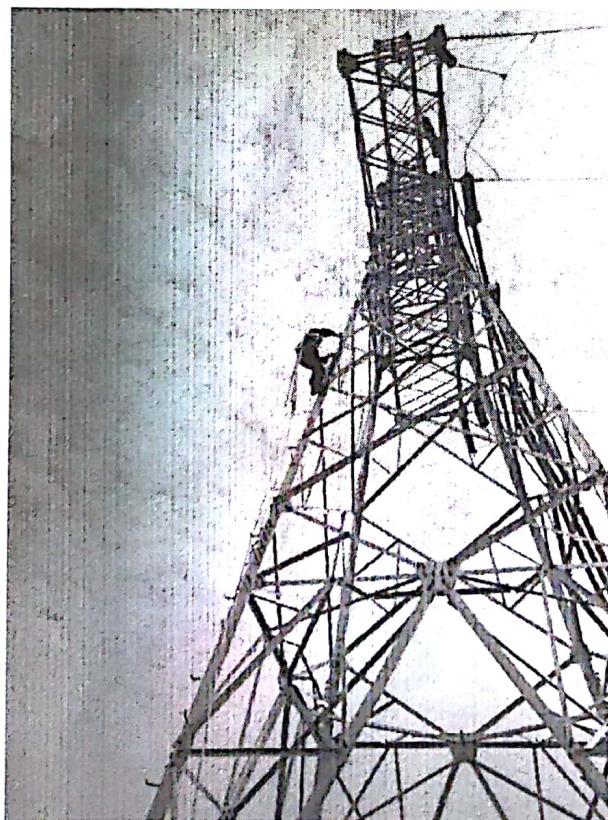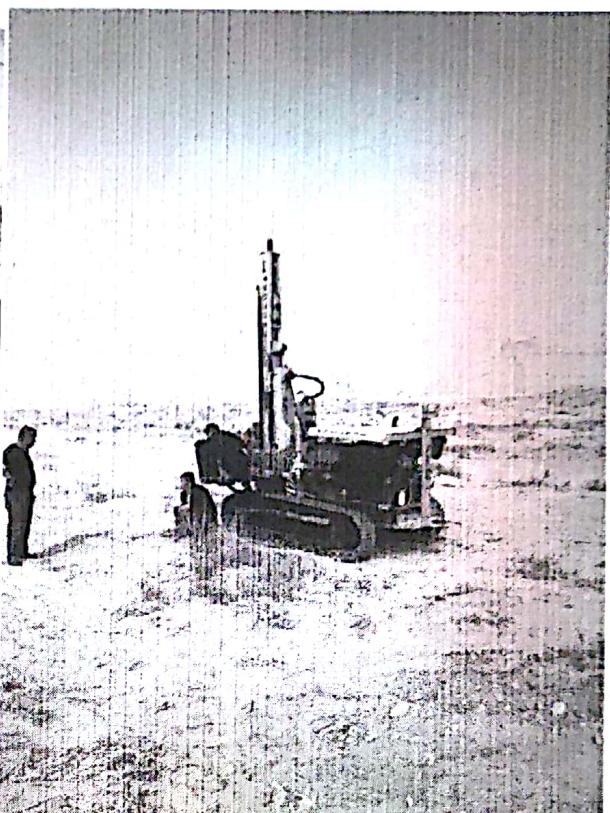


由 扫描全能王 扫描创建

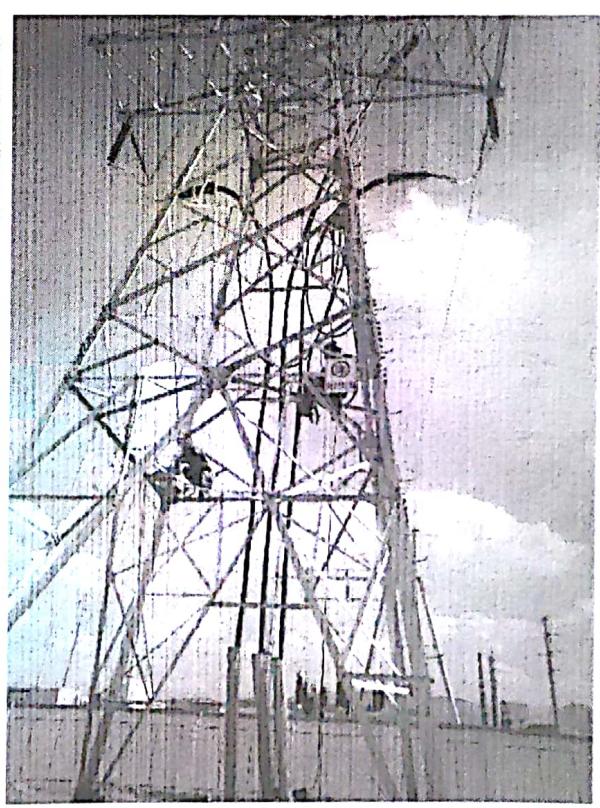

由 扫描全能王 扫描创建

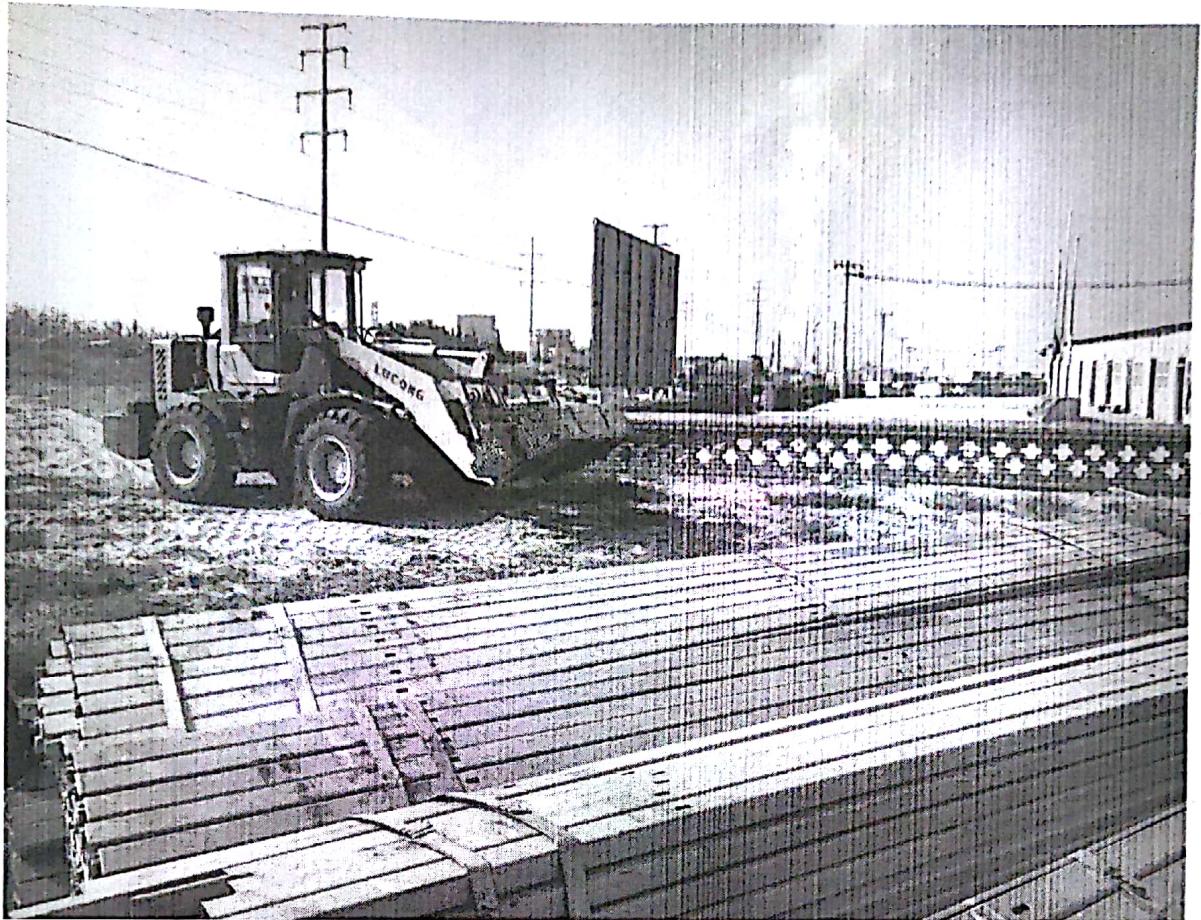

由 扫描全能王 扫描创建

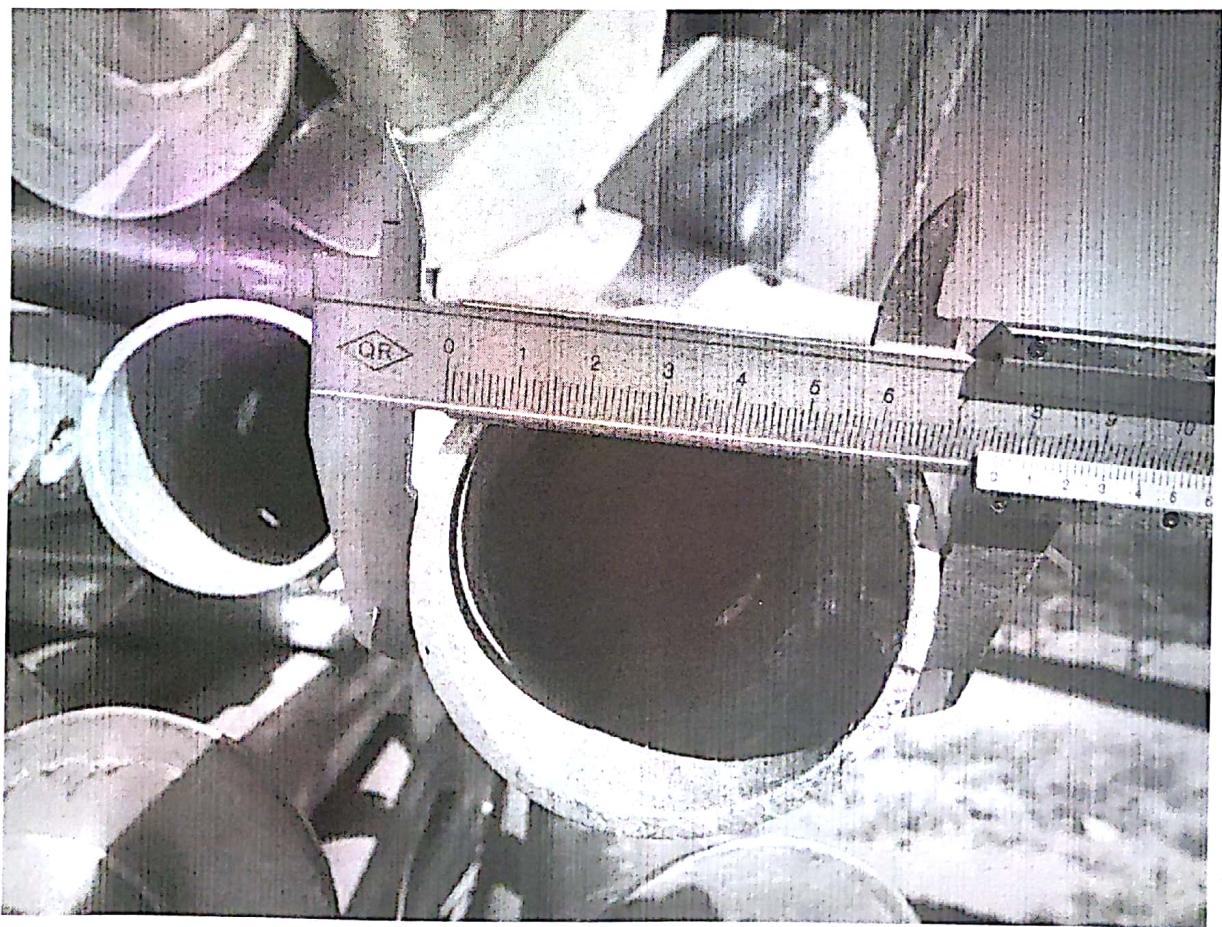

由 扫描全能王 扫描创建



一、 主要监理工作（质量、安全、进度、投资）

在监理过程中，认真执行监理规范的要求，严格按监理规划、监理细则进行操作，按照有关规范的要求对工程质量、安全、进度、等方面进行全面控制，并严格按监理程序进行。

为保证工程质量，督促施工单位及时上报工程资料，并对提交的工程资料进行了认真、严格审核；监理部定期召开监理工地例会，对上周工作进行总结，并安排下周工作，对出现的问题进行协调解决，如现场出现特殊问题立即召开专题会议，尽快解决，并将会议纪要整理打印发于各单位。平时通过检查、旁站、巡视、验收，杜绝出现失控现象。在实际操作过程中严格执行验收程序，原材料不经监理验收合格，严禁进场使用，对需复试的原材料严格执行见证取样制度，待复试合格后方可进场使用。上道工序尤其是隐蔽和关键工序验收不合格严禁进入下道工序施工，并且在砼施工过程中进行全程旁站监理，发现问题及时处理，并做好旁站记录。对工程中出现的质量问题认真对待，由各方共同商定处理方案，并督促其按处理方案进行整改，并再次验收合格后方可进行下道工序施工，确保质量符合要求。



由 扫描全能王 扫描创建

本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，汇同各方检查了现场的机械设备、临时用电、消防、场容场貌等项目，针对存在安全隐患的，立即发出监理通知单要求整改，在监理的督促下和各方配合下，本月安全文明生产状况良好，施工现场未发生任何人身伤亡和设备损坏事故。

进度方面督促帮助施工单位合理安排好人力、物力，积极的做好消缺工作。另外本监理部及时对现场情况（如质量、安全、进度等）进行总结，并编制监理周报、月报，较好地促进了工程项目的实施。

二、工程存在问题及建议

在参建各方的共同努力下，本月质量、安全文明总体良好，但仍有以下问题：

- 1、光伏区料场材料需尽快整理，并对缺失材料进行重新采购。
 - 2、尽快对光伏区逆变器等设备进行清理维修，并提供检测证书等，确保施工顺利进行。
 - 3、总包单位需尽快提供外线图纸，对端间隔设备需尽快安装。
 - 4、开关站综合用房卫生间洁具、空调、厨房设备、中控台等设备工具尽快采购安装，运维人员于9月25日入住前具备入住条件。
 - 5、总包单位需尽快检修光纤，确保光纤具备并网条件。
 - 6、现场至今未安装备用电源，需总包单位尽快安装10KV备用电源。
 - 7、总包单位光伏区施工要配备专人，每天监督管理，确保工程质量。
 - 8、因为现场工期紧任务重，总包单位需增加施工人员、施工器械，确保施工质量与施工进度。
- 三、下月监理工作安排
- 下月工作任务：光伏区定位放线，组件、支架、管桩安装，箱逆变基础及安装，35KV集电线路，开关站及外线施工整改消缺，10KV备用电源安装等。按照施工计划总包单位加紧施工11月15日须项目并网发电且冻土之前土建部分全部完成，11月30日须全部完工，要求施工单位及时提交与工程相关的资料，做到资料与工程同步，同时控制好施工安全和质量，对影响质量、安全的因素进行严格控制。



由 扫描全能王 扫描创建

项目监理大事记

工程名称：东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号：WH-JLDSJ-005

主要内 容

- 1、2018年09月05日监理单位组织召开第18次工程例会。
- 2、2018年09月10日监理单位组织召开第19次工程例会。
- 3、2018年09月17日监理单位组织召开第20次工程例会。
- 4、2018年09月29日监理单位组织召开第21次工程例会。

总监理工程师: 刘生发

2018年9月30日

本表由项目监理部填写，项目监理部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建
