



正衡监理

编号: WH-JLYB-007

监 理 月 报

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

2018 年 11 月第 7 期



报告日期: 2018 年 11 月 30 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JLYB-007

一、工程形象进度(形象进度表、照片)


形象进度表

分项名称	施工工序	完成情况	备注
光伏区	定位放线	完成 45MW	2018 年 05 月 15 日 开始施工 光伏区容量 50MW
	预制桩打桩	完成 44676 根	
	组件安装	完成 40MW	
	支架安装	完成 45MW	
	电气施工	完成 25MW	
110KV 开关站	管理区围墙砌筑	完成 100%	
	主控室 配电室	完成 98%	
	SVG 基础	完成 100%	
	生活辅助用房	完成 100%	
	一二次设备	完成 100%	
	厂区道路	完成 100%	
110KV 外线	线路复测	完成 95%	
	基础开挖	完成 100%	
	基础浇筑	完成 100%	
	塔材、导线、金属等材料	完成 100%	
10KV 备用电源线路	水泥杆安装	完成 0%	
	变压器、铝线等材料	完成 0%	




由 扫描全能王 扫描创建



形象照片

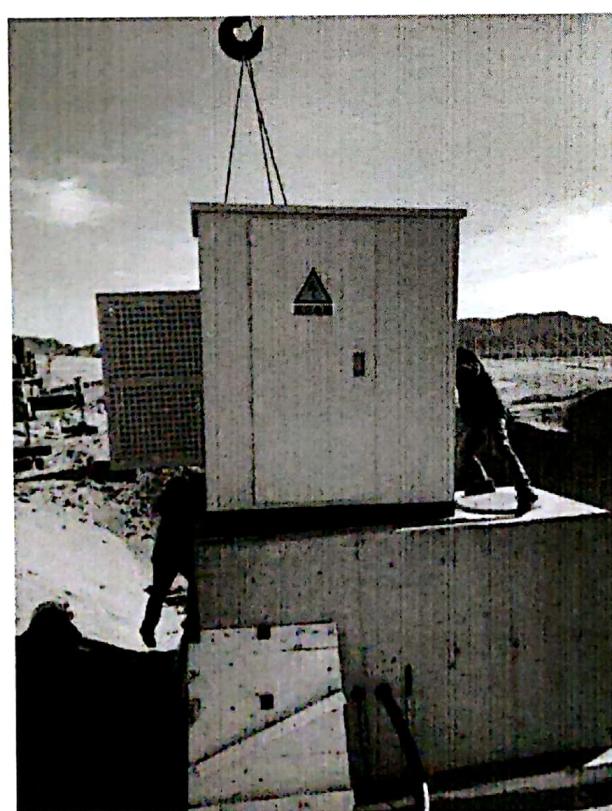



由 扫描全能王 扫描创建

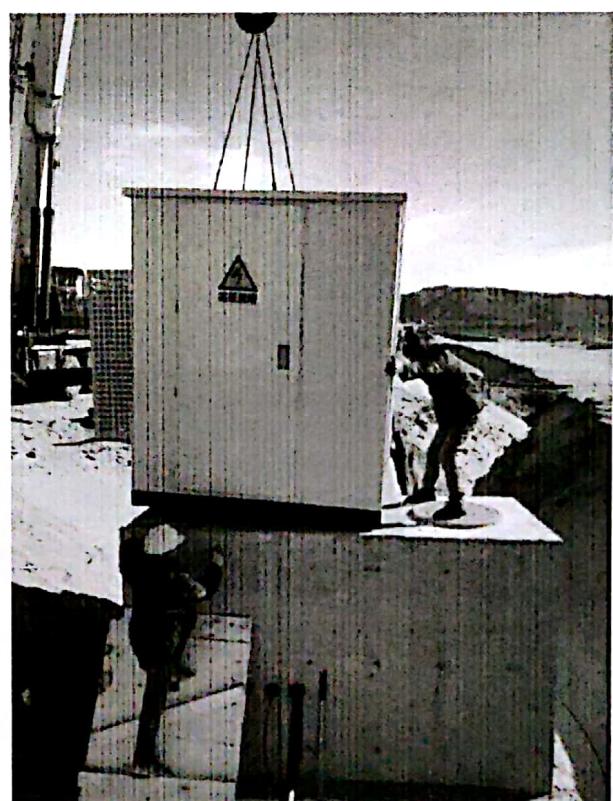



由 扫描全能王 扫描创建

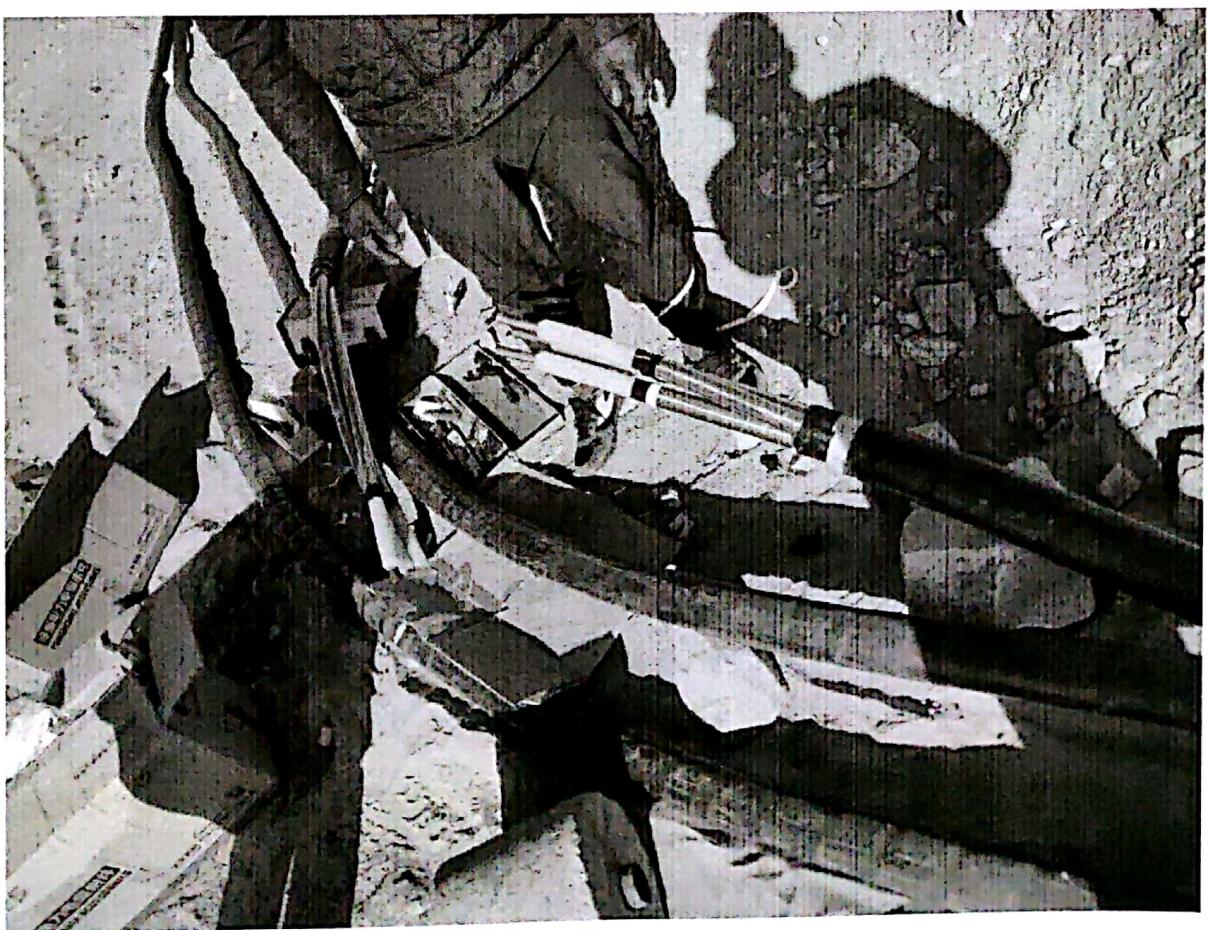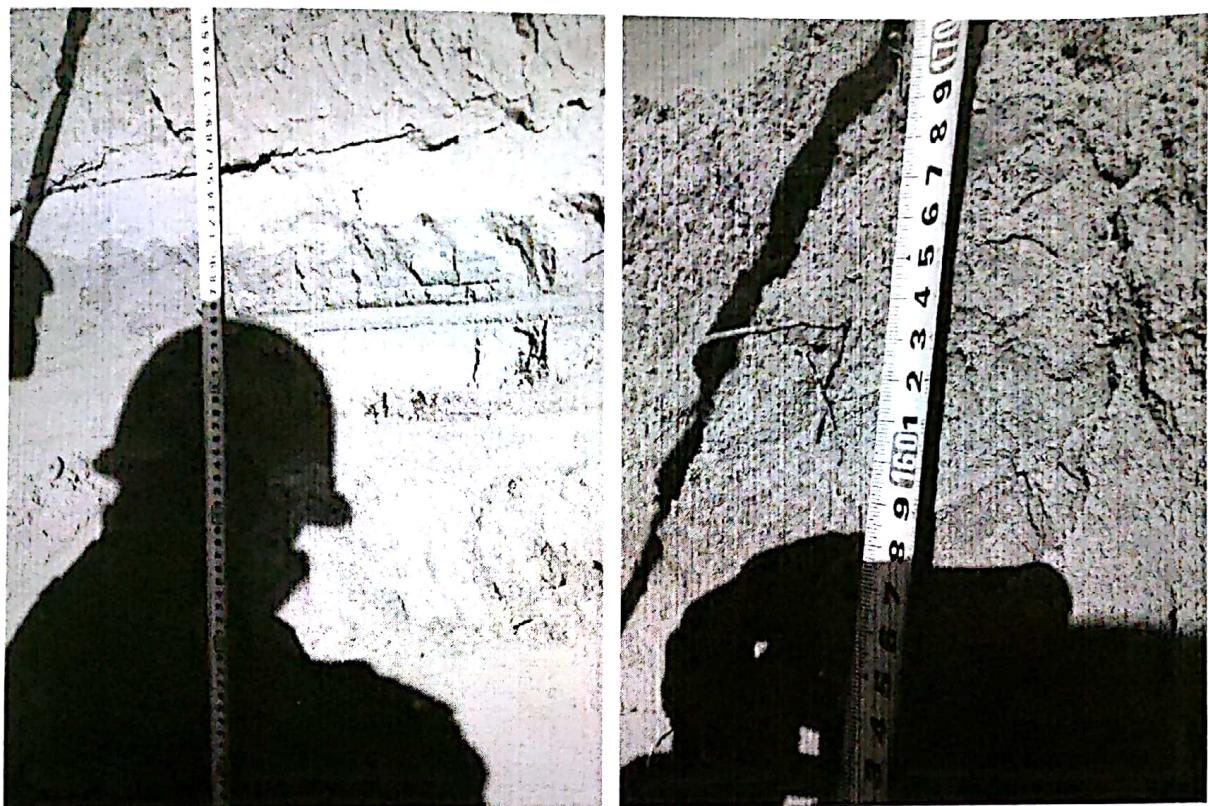

由 扫描全能王 扫描创建

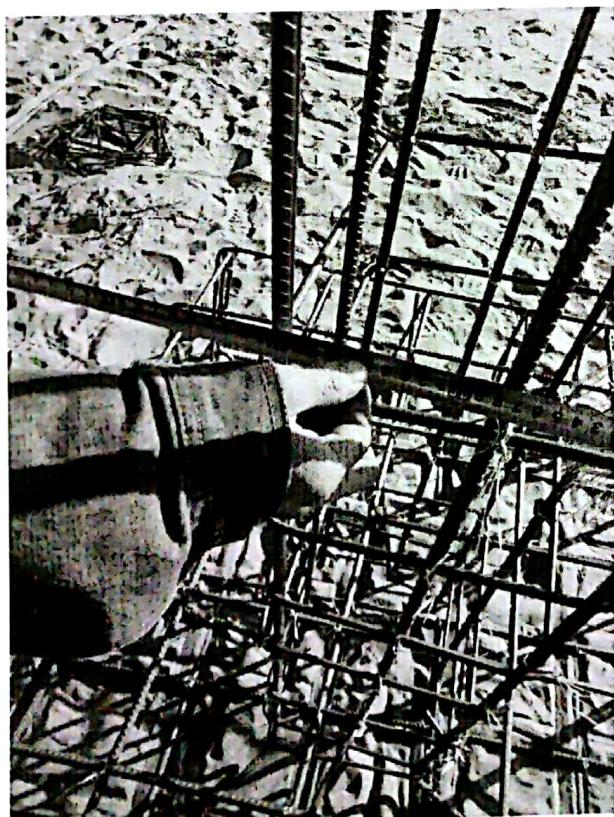

由 扫描全能王 扫描创建

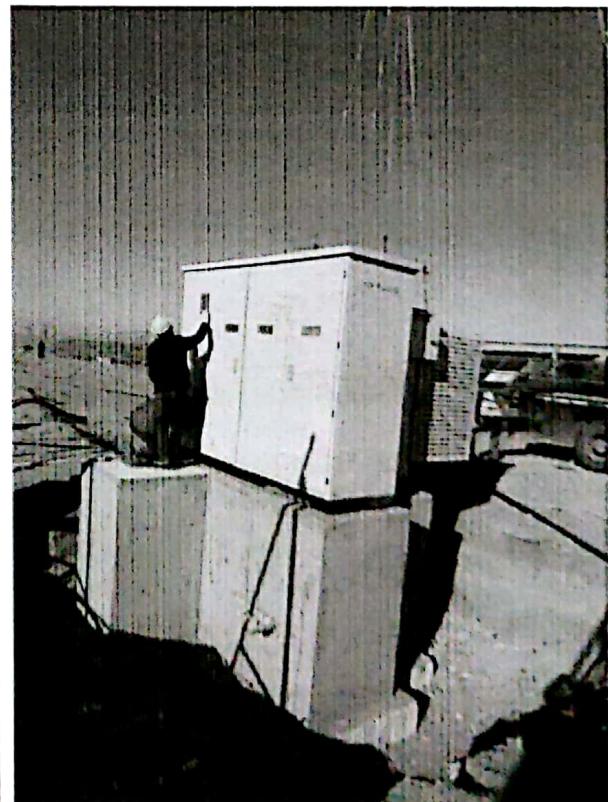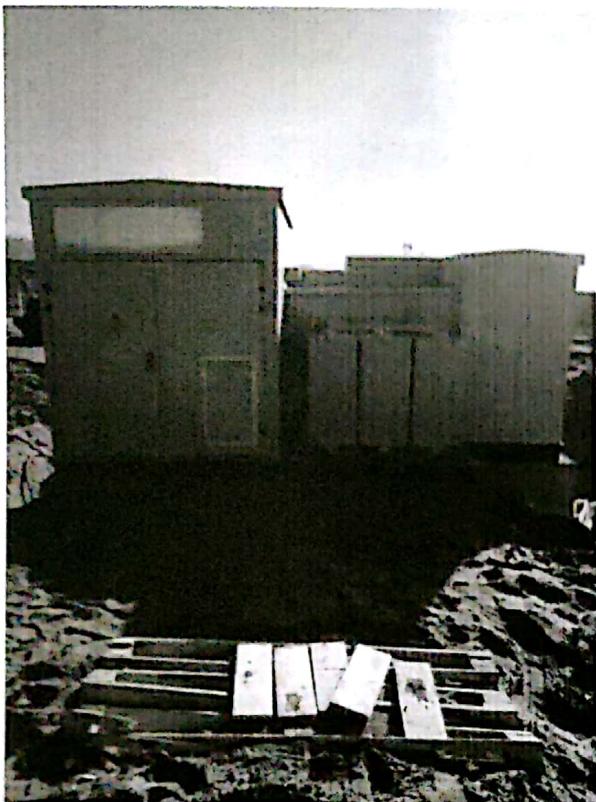

由 扫描全能王 扫描创建



一、 主要监理工作（质量、安全、进度、投资）

在监理过程中，认真执行监理规范的要求，严格按监理规划、监理细则进行操作，按照有关规范的要求对工程质量、安全、进度、等方面进行全面控制，并严格按监理程序进行。

为保证工程质量，督促施工单位及时上报工程资料，并对提交的工程资料进行了认真、严格审核；监理部定期召开监理工地例会，对上周工作进行总结，并安排下周工作，对出现的问题进行协调解决，如现场出现特殊问题立即召开专题会议，尽快解决，并将会议纪要整理打印发于各单位。平时通过检查、旁站、巡视、验收，杜绝出现失控现象。在实际操作过程中严格执行验收程序，原材料不经监理验收合格，严禁进场使用，对需复试的原材料严格执行见证取样制度，待复试合格后方可进场使用。上道工序尤其是隐蔽和关键工序验收不合格严禁进入下道工序施工，并且在砼施工过程中进行全程旁站监理，发现问题及时处理，并做好旁站记录。对工程中出现的质量问题认真对待，由各方共同商定处理方案，并督促其按处理方案进行整改，并再次验收合格后方可进行下道工序施工，确保质量符合要求。



由 扫描全能王 扫描创建

本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，汇同各方检查了现场的机械设备、临时用电、消防、场容场貌等项目，针对存在安全隐患的，立即发出监理通知单要求整改，在监理的督促下和各方配合下，本月安全文明生产状况良好，施工现场未发生任何人身伤亡和设备损坏事故。

进度方面督促帮助施工单位合理安排好人力、物力，积极的做好消缺工作。另外本监理部及时对现场情况（如质量、安全、进度等）进行总结，并编制监理周报、月报，较好地促进了工程项目的实施。

二、工程存在问题及建议

在参建各方的共同努力下，本月质量、安全文明总体良好，但仍有以下事宜：

- 1、 外线、升压站施工已完成，消缺基本完成，但供电局仍有问题提出，要求施工单位尽快整改。
- 2、 光伏区施工低压电缆敷设材料浪费严重，且施工工序不对，必须先开挖再进行敷设，敷设完必须报监理单位进行验收才可进行下道工序。
- 3、 光伏区箱变基础浇筑必须用震荡棒进行震荡，现个别箱变基础出现蜂窝麻面、露筋现象，要求施工单位施工必须符合设计要求。
- 4、 光伏区组件安装必须齐整，保证组件受力均匀，组件安装紧固螺丝。
- 5、 光伏区高压电缆敷设必须按照图纸设计要求及国家规范。
- 6、 光伏区逆变器、汇流箱安装必须符合设计要求，逆变器离地 100mm，汇流箱离地 130mm。

三、下月监理工作安排

下月工作任务：光伏区定位放线，组件、支架、管桩安装，箱、逆变安装，35KV 集电线路，开关站及外线施工整改消缺，10KV 备用电源安装等，要求施工单位及时提交与工程相关的资料，做到资料与工程同步，同时控制好施工安全和质量，对影响质量、安全的因素进行严格控制。



由 扫描全能王 扫描创建

项目监理大事记

工程名称：东方日升乌海 50MW_p 光伏发电项目

编号：WH-JLDSJ-007

主要内 容

- 1、2018年11月05日监理单位组织召开第26次工程例会。
- 2、2018年11月19日监理单位组织召开第27次工程例会。

总监理工程师

刘士发

2018年11月26日

本表由项目监理部填写，项目监理部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建
