



正衡监

编号: WH-JLYB-008

监 理 月 报

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

2018 年 12 月第 8 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2018 年 12 月 31 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JLYB-008

一、工程形象进度（形象进度表、照片）


形象进度表



分项名称	施工工序	完成情况	备注
光伏区	定位放线	完成 50MW	2018 年 05 月 15 日 开始施工 光伏区容量 50MW
	预制桩打桩	完成 59576 根	
	组件安装	完成 48MW	
	支架安装	完成 49MW	
	电气施工	完成 35MW	
110KV 开关站	管理区围墙砌筑	完成 100%	
	主控室 配电室	完成 98%	
	SVG 基础	完成 100%	
	生活辅助用房	完成 100%	
	一二次设备	完成 100%	
	厂区道路	完成 100%	
110KV 外线	线路复测	完成 95%	
	基础开挖	完成 100%	
	基础浇筑	完成 100%	
	塔材、导线、金属等材料	完成 100%	
10KV 备用电源线路	水泥杆安装	完成 0%	
	变压器、铝线等材料	完成 0%	





由 扫描全能王 扫描创建


形象照片



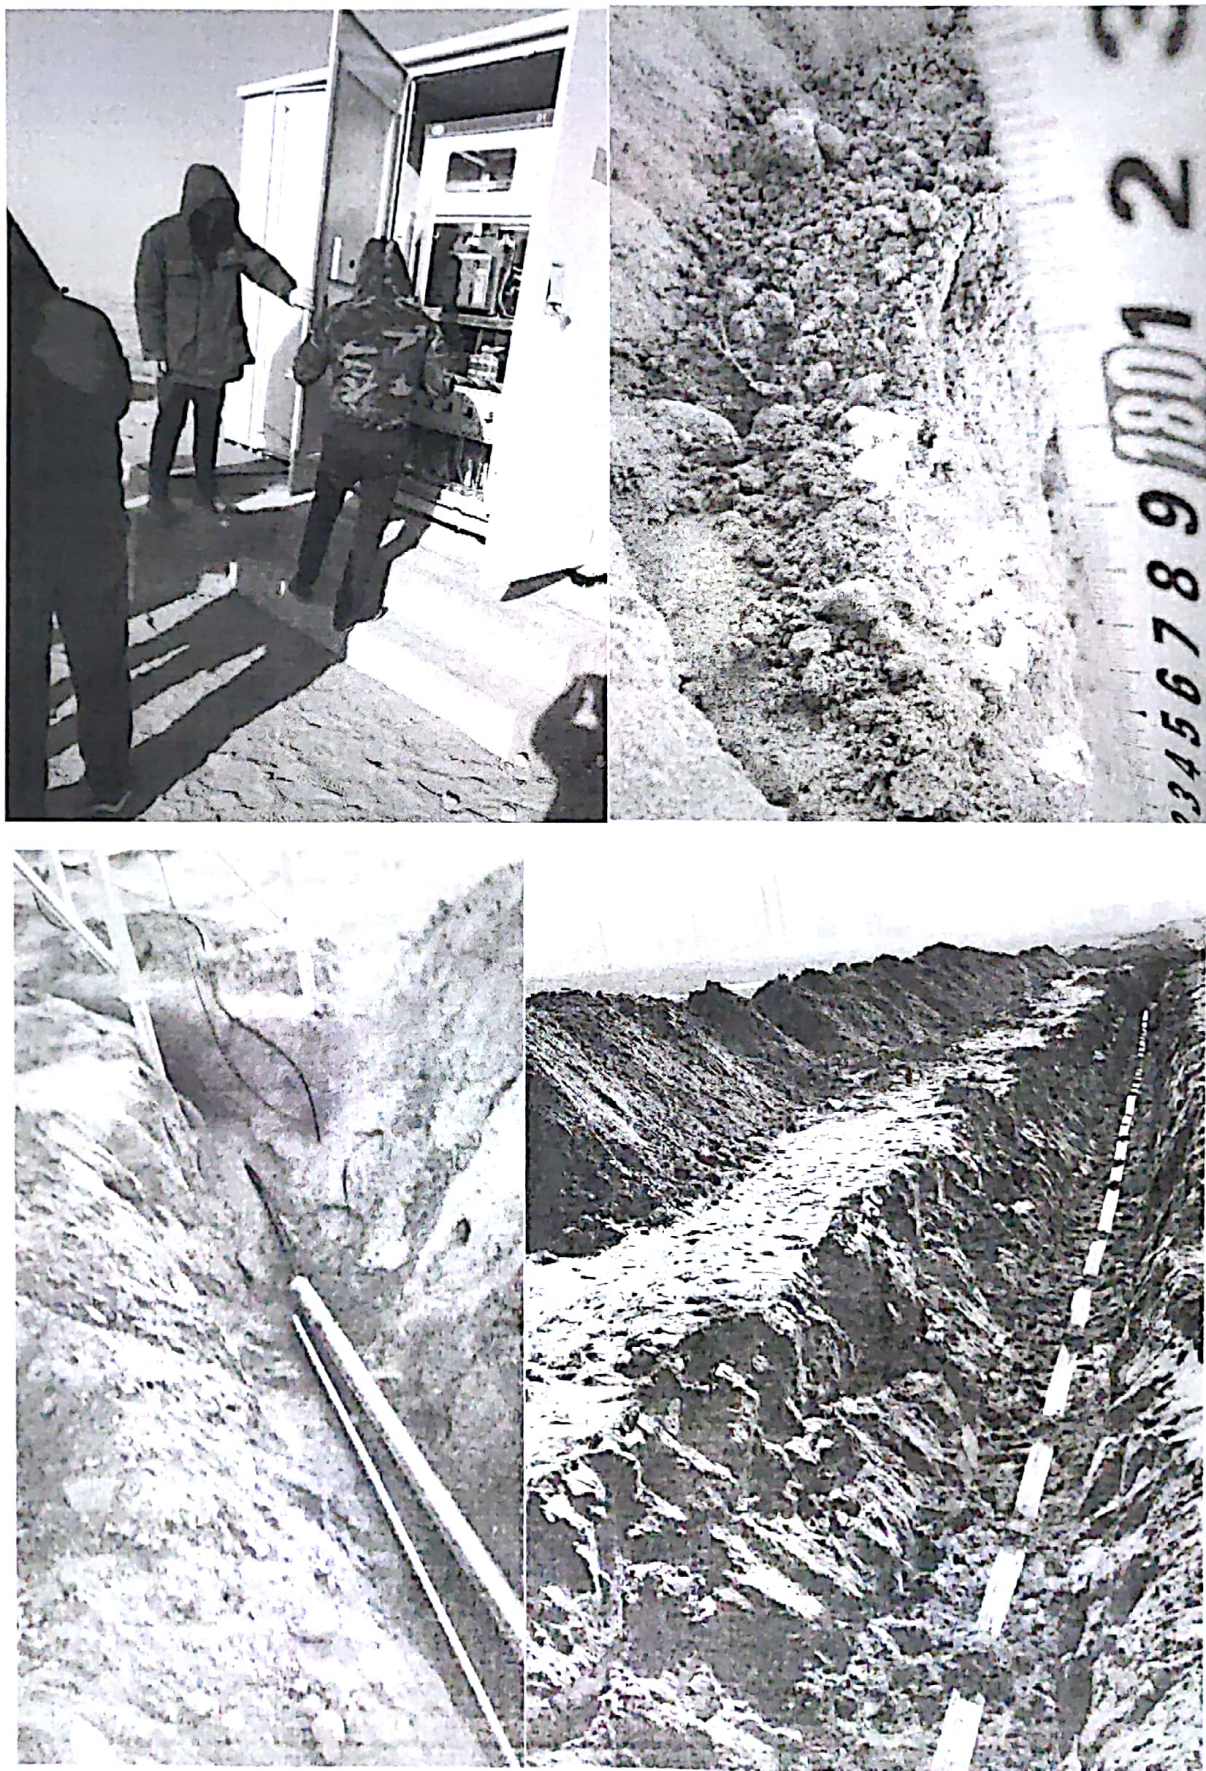


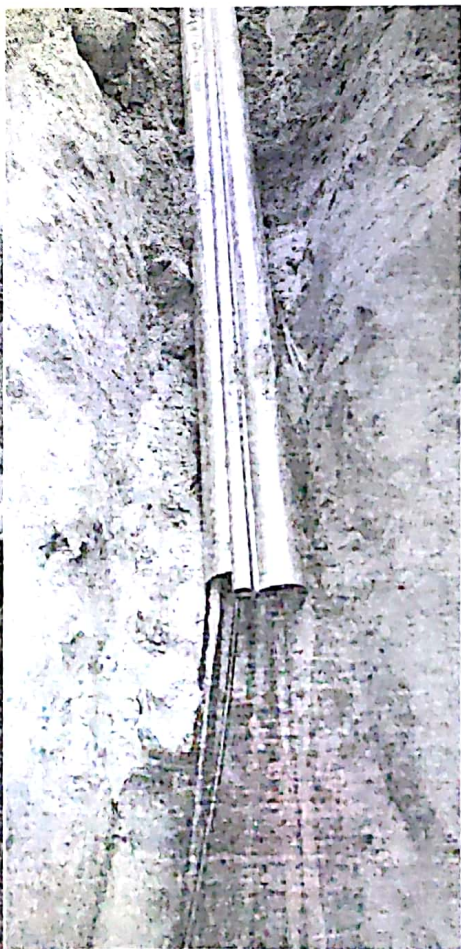
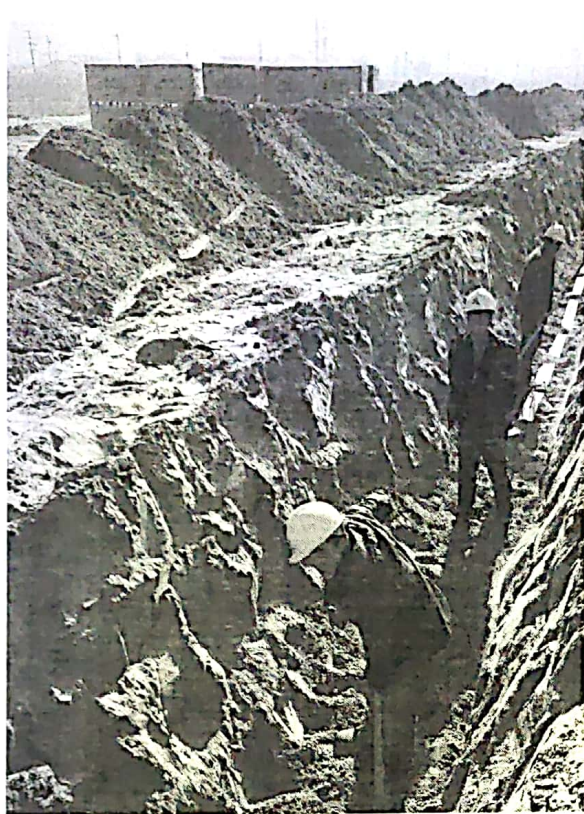






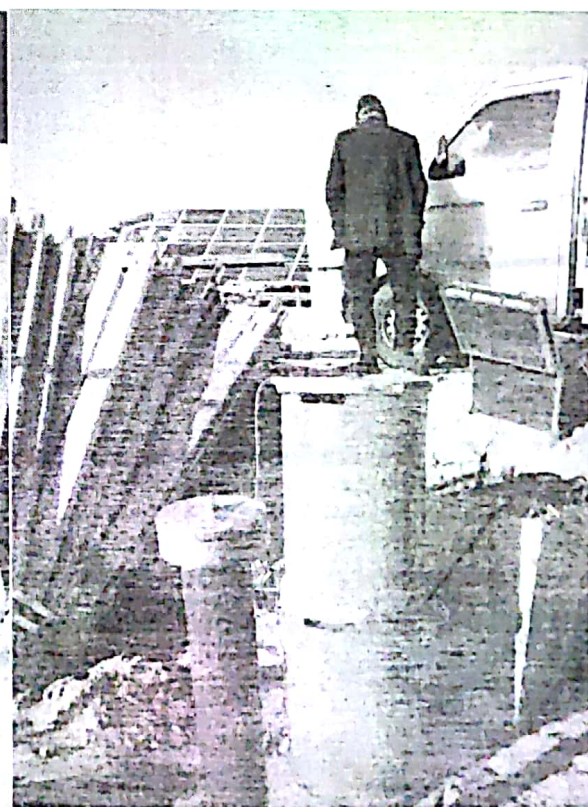
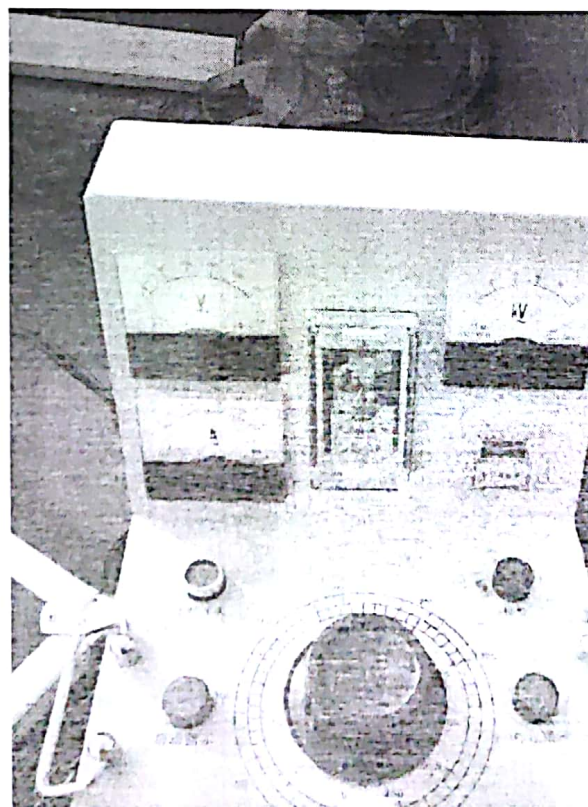


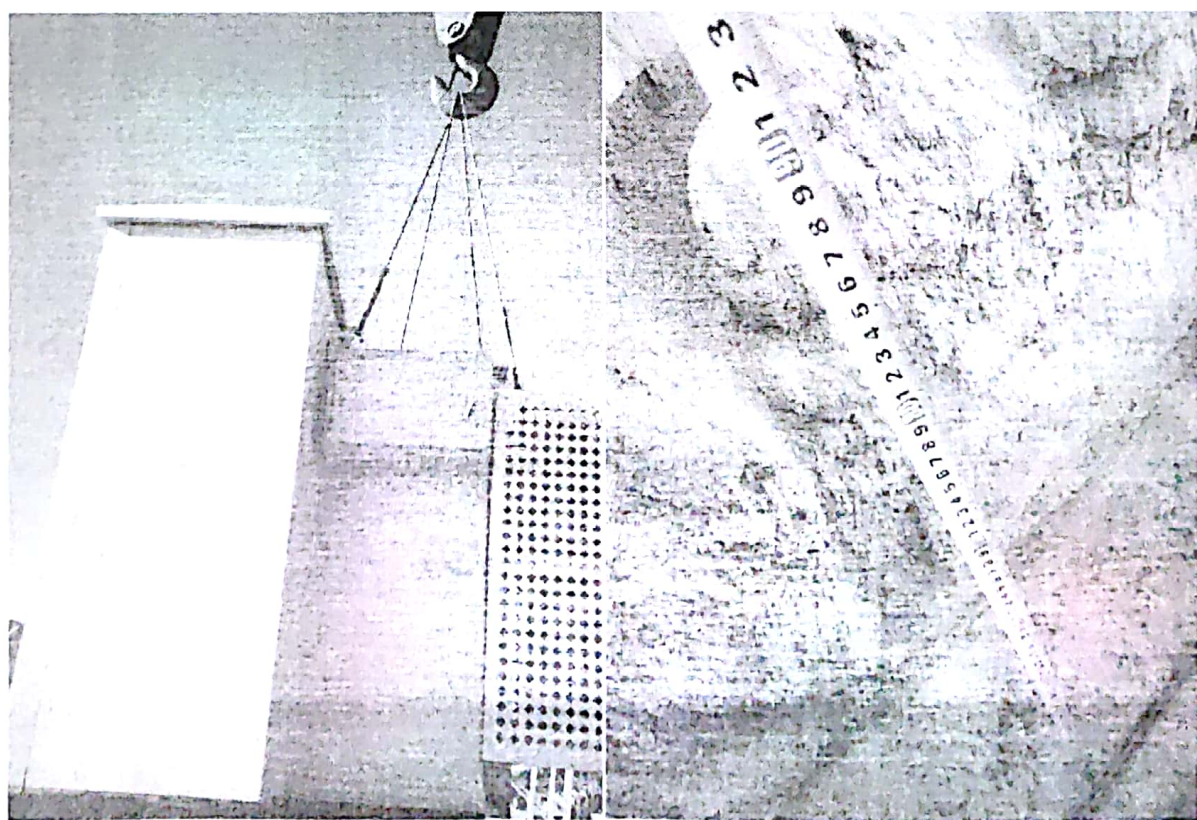

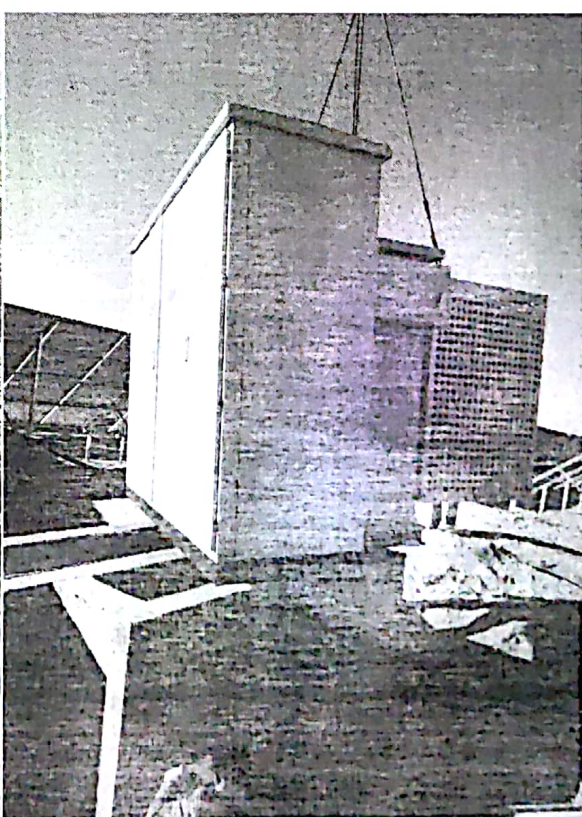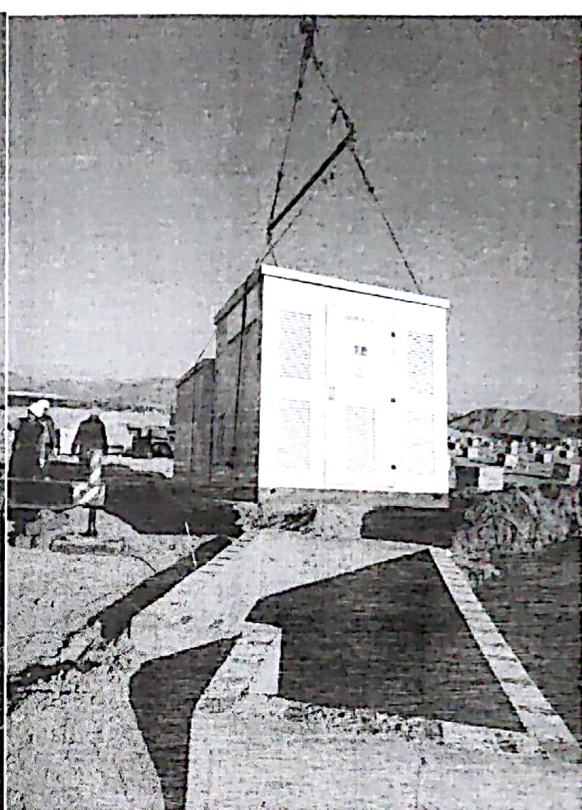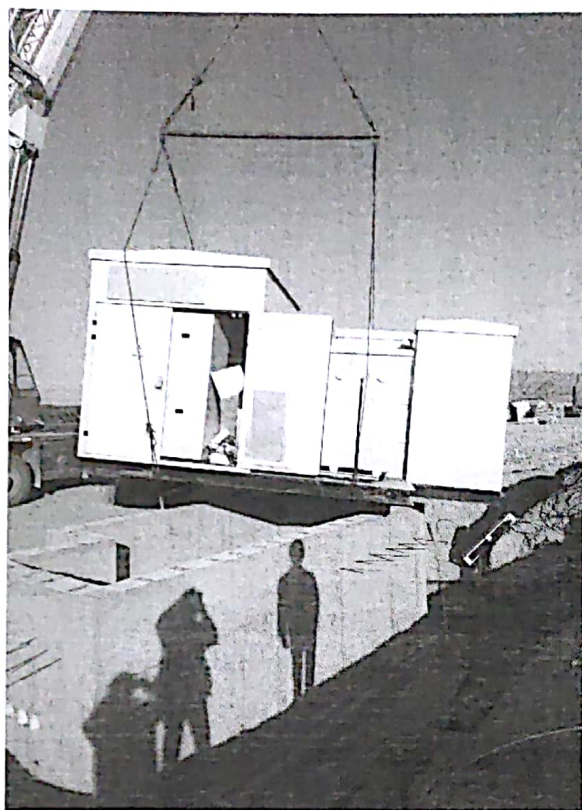

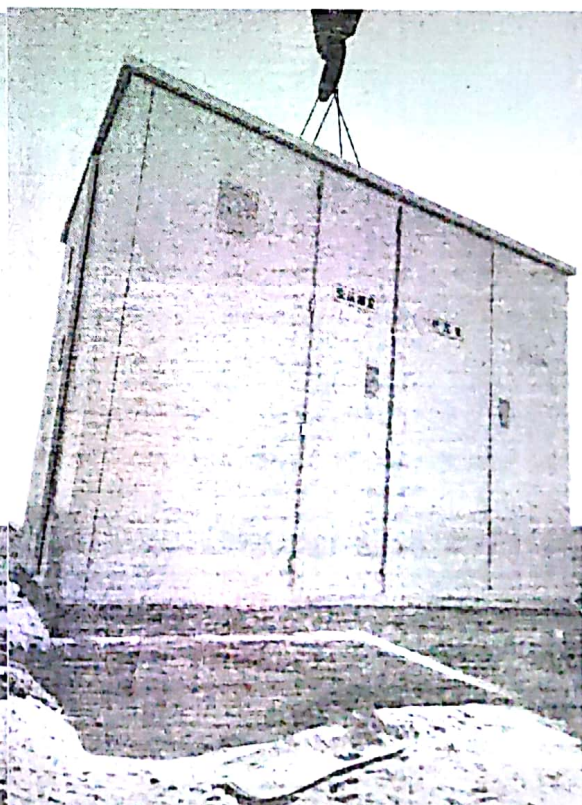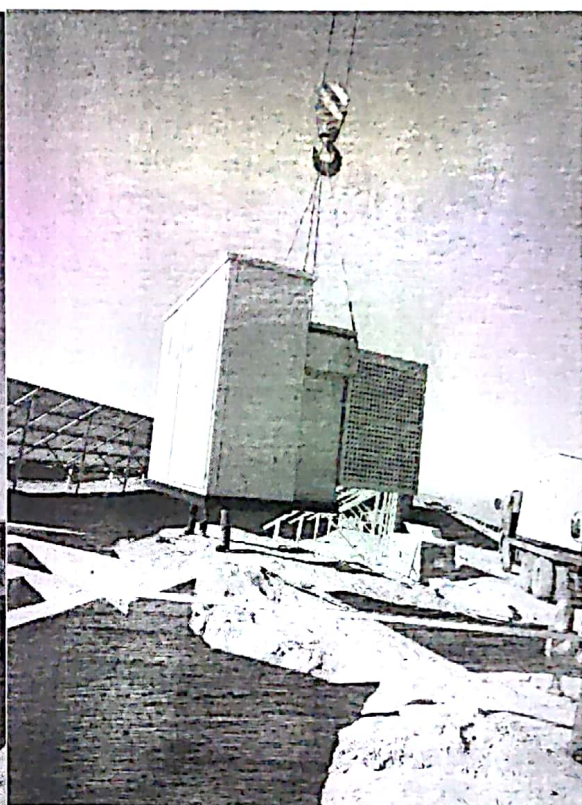

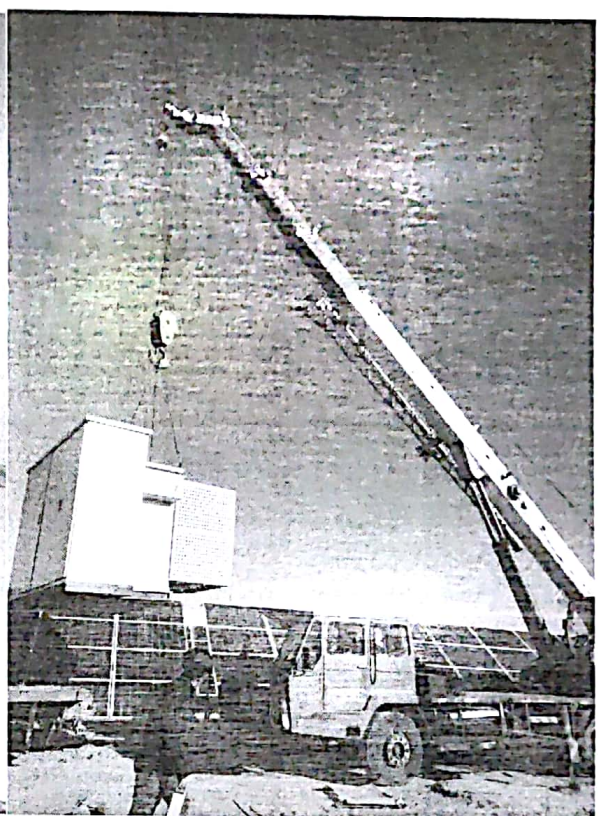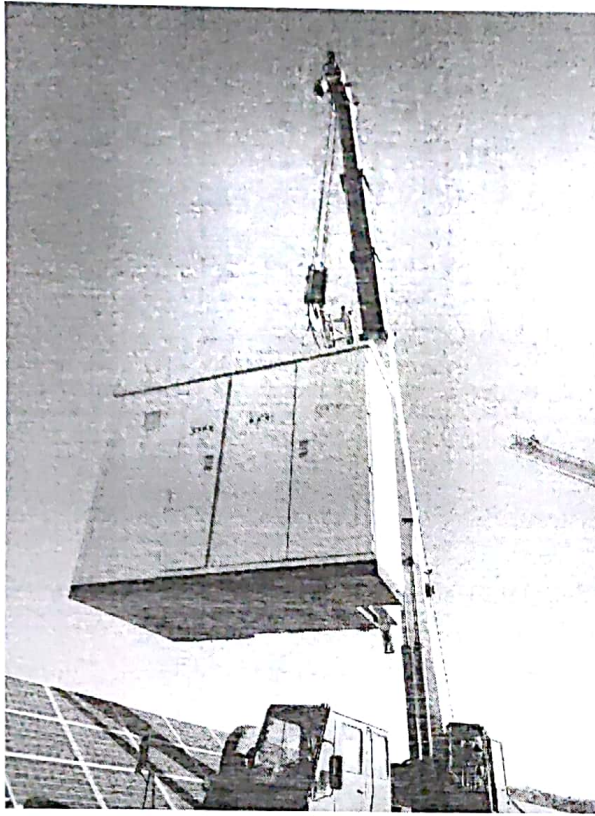

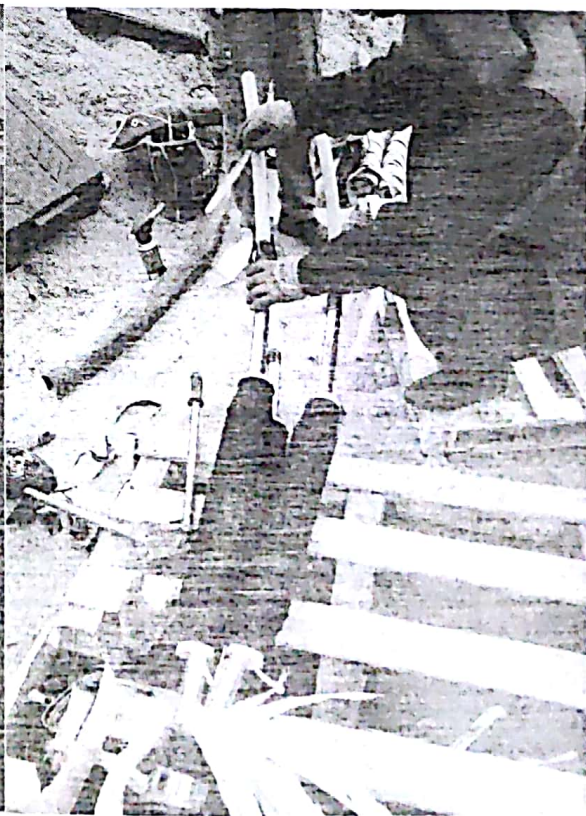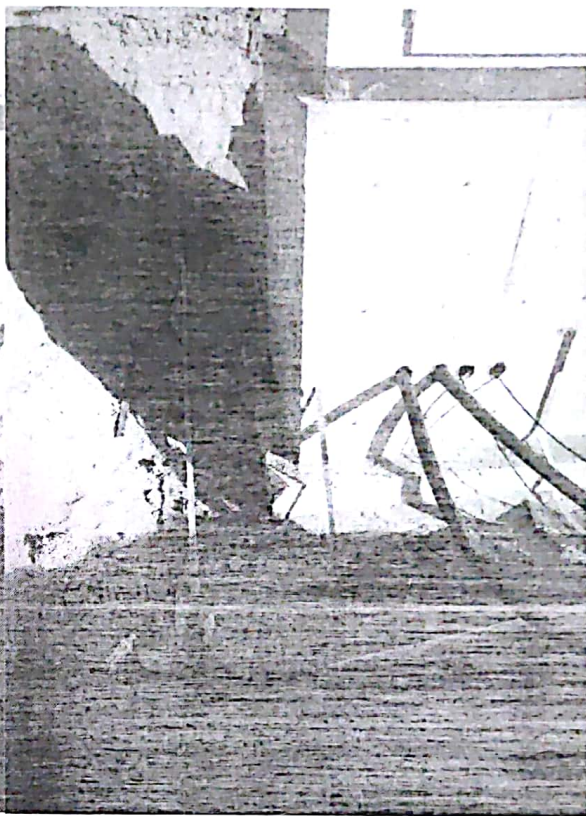



一、 主要监理工作（质量、安全、进度、投资）

在监理过程中，认真执行监理规范的要求，严格按监理规划、监理细则进行操作，按照有关规范的要求对工程质量、安全、进度、等方面进行全面控制，并严格按监理程序进行。

为保证工程质量，督促施工单位及时上报工程资料，并对提交的工程资料进行了认真、严格审核；监理部定期召开监理工地例会，对上周工作进行总结，并安排下周工作，对出现的问题进行协调解决，如现场出现特殊问题立即召开专题会议，尽快解决，并将会议纪要整理打印发于各单位。平时通过检查、旁站、巡视、验收，杜绝出现失控现象。在实际操作过程中严格执行验收程序，原材料不经监理验收合格，严禁进场使用，对需复试的原材料严格执行见证取样制度，待复试合格后方可进场使用。上道工序尤其是隐蔽和关键工序验收不合格严禁进入下道工序施工，并且在砼施工过程中进行全程旁站监理，发现问题及时处理，并做好旁站记录。对工程中出现的质量问题认真对待，由各方共同商定处理方案，并督促其按处理方案进行整改，并再次验收合格后方可进行下道工序施工，确保质量符合要求。

本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，汇同各方检查了现场的机械



设备、临时用电、消防、场容场貌等项目，针对存在安全隐患的，立即发出监理通知单要求整改，在监理的督促下和各方配合下，本月安全文明生产状况良好，施工现场未发生任何人身伤亡和设备损坏事故。

进度方面督促帮助施工单位合理安排好人力、物力，积极的做好消缺工作。另外本监理部及时对现场情况（如质量、安全、进度等）进行总结，并编制监理周报、月报，较好地促进了工程项目的实施。

二、工程存在问题及建议

在参建各方的共同努力下，本月质量、安全文明总体良好，但仍有以下事宜：

- 1、现场已经进入冬季施工要求总包单位对施工人员的三级安全教育，做好安全教育记录。
- 2、要求总包单位与施工单位对光伏区围栏施工进行核对，确定施工时间。
- 3、要求总包单位对现场进水损坏设备出具第三方检测报告，并且对进水设备重新进行编号，制作清单，于1月20日前提交业主单位。
- 4、现场开会决定12月30日集电线路送电，集电线路中间电缆头砌筑电缆井，要求施工单位尽快砌筑。
- 5、升压站10KV备用电源因设计院方案问题，现定于明年进行施工。
- 6、升压站水管可能存在破损问题，总包单位于12月底前完成检查修复。
- 7、光伏区部分区域支架存在斜撑、对穿螺丝未安装现象，要求施工单位尽快检查安装。

三、下月监理工作安排

下月工作任务：光伏区定位放线，组件、支架安装，逆变器、汇流箱安装，光伏区低压电缆敷设，箱、逆变设备连接，10KV备用电源定于明年施工等，要求施工单位及时提交与工程相关的资料，做到资料与工程同步，同时控制好施工安全和质量，对影响质量、安全的因素进行严格控制。现场开会决定项目于1月10日停止施工，各单位做好后续整理工作，1月20日撤场。



项目监理大事记

工程名称：东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号：WH-JLDSJ-008

主要内容

- 1、2018 年 12 月 03 日监理单位组织召开第 29 次工程例会。
- 2、2018 年 12 月 06 日监理单位组织召开第 30 次工程例会。
- 3、2018 年 12 月 10 日监理单位组织召开第 31 次工程例会。
- 4、2018 年 12 月 17 日监理单位组织召开第 32 次工程例会。
- 5、2018 年 12 月 21 日监理单位组织召开第 33 次工程例会。
- 6、2018 年 12 月 24 日监理单位组织召开第 34 次工程例会。

总监理工程师：

年 月 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建
