



编号: JLYB-QDHS-01

监 理 月 报

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748KW 屋顶分布式光
伏发电电站项目

2018 年 6 月第 1 期

项目监理单位(章):



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2018 年 06 月 26 日

监 理 月 报

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kw 屋顶分布式光伏发电电站项目 月次 第 1 次 月报

开始时间 2018 年 6 月 1 日 结束日期 2018 年 6 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	亨氏(青岛)食品有限公司 748KW 屋顶分布式光伏发电电站项目		影像	20 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		底梁安装 压载安装	



压载安装
导轨安装
组件安装



组件安装
桥架安装



组件吊运



下墙桥架安装



桥架安装



直流电缆敷设




接地扁钢焊接



逆变器支架安
装



逆变器开箱

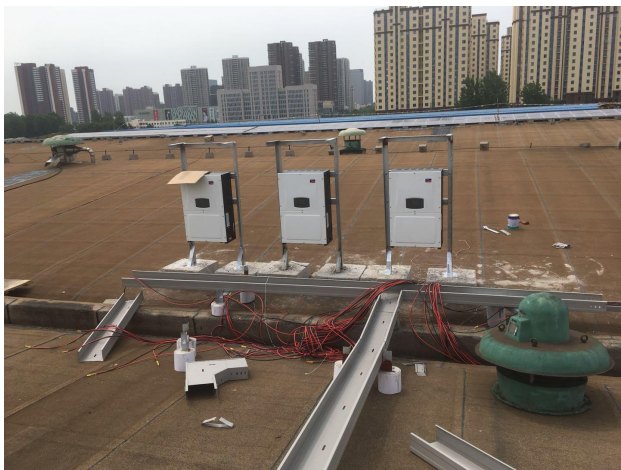

逆变器安装

		逆变器直流侧 终端头制作	
		逆变器交流侧 接线	
		交流电缆敷设	
设备交付进度	底梁、导轨、组件、桥架、电缆、逆变器、汇流箱等进场		
设计交付进度	图纸完成	图纸完成	

	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	督促施工单位报审其他资料	
	技术交底	完成	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	压载及组件安装，电缆桥架安装，电缆敷设、逆变器安装	汇流箱安装 开关柜安装
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关

	设备质量		进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
西门子电力自动化有限公司								
1	底梁放线				2018.6.18	100%	100%	
2	底梁安装				2018.6.18	100%	100%	
3	压载安装				2018.6.18	100%	100%	
4	导轨安装				2018.6.18	100%	100%	
5	组件安装				2018.6.19	100%	100%	
6	电缆桥架（直流）				2018.6.24	100%	100%	
7	电缆桥架（交流）		2018.6.28			95%	95%	
8	直流电缆敷设				2018.6.24	100%	100%	
9	交流电缆敷设		2018.7.6			65%	65%	
10	接地扁钢焊接		2018.6.28			95%	95%	
11	逆变器安装				2018.6.25	14/14	14/14	
12	汇流箱安装		2018.6.30			0/5	0/5	
13	0.4KV 开关柜		2018.7.11			0/2	0/2	开关柜未进场

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成	本月实际完成（完成	权值
----	------	--------	--------	--------	--------	-----------	-----------	----

						量 / 总量)	量 / 总量)	
西门子电力自动化有限公司								
1	底梁放线				2018.6.18	0%	100%	
2	底梁安装				2018.6.18	0%	100%	
3	压载安装				2018.6.18	0%	100%	
4	导轨安装				2018.6.18	0%	100%	
5	组件安装				2018.6.19	0%	100%	
6	电缆桥架 (直流)				2018.6.24	0%	100%	
7	电缆桥架 (交流)		2018.6.28			5%	95%	
8	直流电缆 敷设				2018.6.24	0%	100%	
9	交流电缆 敷设		2018.7.6			35%	65%	
10	接地扁钢 焊接		2018.6.28			5%	95%	
11	逆变器安 装					0/14	14/14	
12	汇流箱安 装		2018,6.30			5/5	0/5	
13	0.4kv 开 关柜安装					2/2	0/2	

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		12 人	1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置， 充分调动施工人员的积极性	配合做好并网前准备工作。要求施工单位合理安 排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部

	度》，定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
物资供应	督促做好物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照进度计划中并网日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

亨氏（青岛）食品有限公司 748KW 屋顶分布式光伏发电电站项目
目监理部

2018 年 6 月 25 日
