



编号: ZJTZ-YB-20180531

监 理 月 报

工程名称: 宁波慈溪汇丽2138.4KWp、翔环1354.32KWp
分布式光伏电站项目

2018年5月第1期



总监理工程师: 胡德林

报告日期: 2018年05月31日

监 理 月 报

工程名称: 宁波慈溪汇丽2138.4KWp、翔环1354.32KWp分布式光伏电站项目

2018年05月 第1次 月报


月报开始时间 2018年5月2日 结束日期 2018年5月31日



监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	慈溪鼎晖汇丽2138.4KWp、翔环1354.32KWp分布式光伏电站项目	宁波慈溪汇丽2138.4KWp、翔环1354.32KWp分布式光伏电站项目	影像	40 张	

二、监理重点工作情况

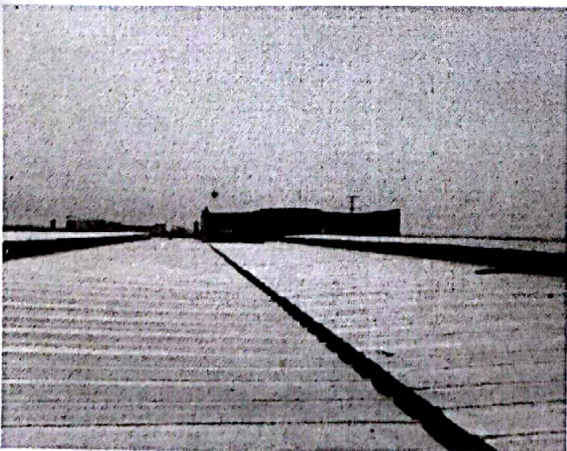专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		翔环项目大铸造车间换瓦完成 7500 平方, 小铸造车间完成 800 平方, 汇丽项目换瓦完成五号楼, 七号楼完成 50% 六号楼完成 500 平方。 汇丽现场制瓦完成 50%.	彩钢瓦屋顶更换 6 月 14 日计划完成, 钢结构加固 6 月 25 日计划完成, 设计 6 月 13 日计划完成.

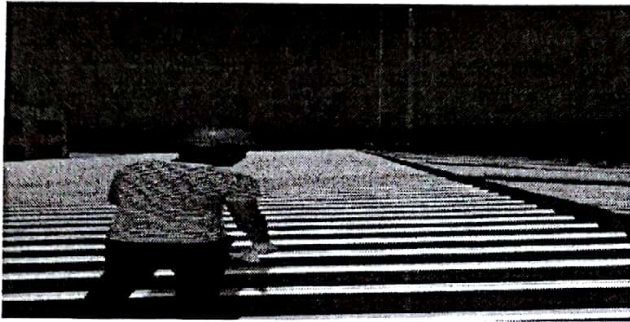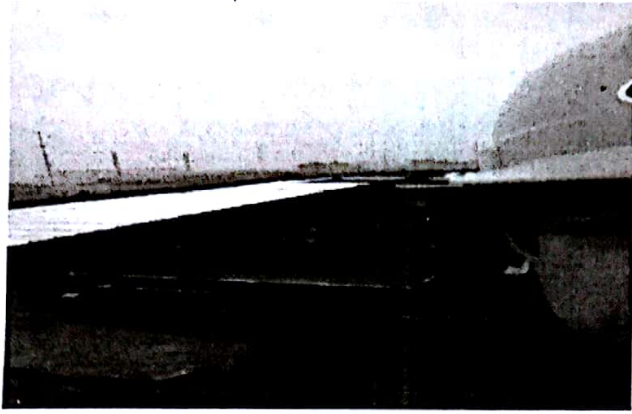

	设备交付进度	无	/
	设计交付进度	图纸未完成	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	暂未会审	/
	设计交底	暂未交底	/
	方案审查	暂未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	暂未交底	暂未交底
	设计变更	无	无
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架组件安装、电缆桥架安装、电缆敷设、接地	监督施工单位施工，保证施工质量
	主要原材料质量	组件观感质量合格、支架外观检查合格、电缆外观质量合格、	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
合同	设备质量	/	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/

	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

宁波慈溪汇丽2138.4KWp、翔环1354.32KWp分布式光伏电站项目 进度百分比			
序号	名称	总预算金额（元）	完工百分比
1			
2			
3			

四、安全文明施工情况

事故（起） 无			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	3 份	15 人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求

	位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

宁波慈溪汇丽2138.4KWp、翔环1354.32KWp

分布式光伏电站项目

2018年5月31日
