



正衡监理

编号: YCGF-YB-008

监 理 月 报

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW_p 光伏发电项目

2018 年 12 月

项目监理部 (章):

总监理工程师: 苟才

日期: 2018 年 12 月 31 号



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

开始时间 2018 年 12 月 1 日 结束日期 2018 年 12 月 31 日

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工序工作	1、张集乔集 65MW 现场组件安装基本结束，进入整改消缺；利民镇 45MW 光伏区整改消缺 2、开关站、升压站、110Kv 线路、35Kv 线路整体验收	1、利民镇 45MW 光伏区整改消缺。 2、张集、乔集整改消缺，施工资料完善归档
	设备交付进度	利民镇光伏区设备已全部交付；张集乔集镇设备交付	张集、乔集、利民镇光伏区进行整改消缺。
	设计交付进度	图纸完成	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	资料正在审查	审查完毕
	技术交底	完成	
	设计变更		
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	场地围栏安装及用电安全都已落实	防火、带电设备安全警示
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	现阶段，要求质量严格按照业主要求监管。	强制性质量问题绝不放过
	主要原材料质量	主要材料进行质量检查	把控好材料进场质量问题



构(配)件质量	把控好进场材料质量关	严抓构配件质量问题
设备质量	按照要求进行质量验收	查看进场设备合格证书
质量验评情况	将不符合设计要求的地方,要求施工方进行整改,然后进行一次验收。	施工方整改后,进行二次验收。

二、本月进度情况

利民镇光伏区消缺整改。

升压站:

1、生产楼进行消缺整改。

张集、乔集光伏区:

张集镇、乔集乡 60MW 光伏区:

本月完成管桩 1986 根, 共计完成管桩 39425 根, 完成总工作量的 100%。箱变平台累计浇筑完成 48 个单元, 完成总工作量的 100%。

本月支架安装 362 组, 支架共计安装 4927 组(约 59.52MW), 完成总工作量的 99.2%。

本月组件安装 340 组, 组件共计安装 4884 组(约 59.1MW), 完成总工作量的 98.5%。

围栏共计完成 8000 米, 完成总工作量的 90%。

场区道路修建 0m², 场区道路共计修建 23326m², 完成总工作量的 74%。

电气部分: 汇流箱接线共计完成 632 台, 完成总工作量的 93%。箱逆变共计安装 48 台, 完成总工作量的 100%。高压电缆敷设共计 9000 米, 完成总工作量的 100%。

2. 截止到目前已进场材料: 太阳能板 58.2MW, 支架 60MW, 汇流箱 672 台, 箱变 48 台(含报废 8 台), 逆变 48 台。

35KV 外线: 消缺整改。

开关站: 消缺整改。

三、下月进度计划



利民镇光伏区：整改消缺。

升压站：消缺整改完成。

张集、乔集光伏区：

1. 场区道路修建 3500m²，占总量 10%。
2. 已送电区域汇线绑扎，消缺整改，桩头防腐，警示标示张贴，质量安全检查。
3. 视频监控施工。
4. 箱逆变围栏门安装。
5. 施工资料完善。

开关站：消缺整改。

35KV 外线：消缺整改。

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	施工 单位 数量
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			
无	无	无	2 份	80 人	2


五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	支架、组件安装。	检查整改消缺项完成情况
安全管理	组件安装、施工人员安全帽佩戴	高空作业、临时用电、场区带电设备标识牌



质量管理	发现有质量问题并要求施工方更改。	进行安全查验。
技术管理	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。	检查张集、乔集镇整改消缺
造价管理	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单	
物资供应	督促施工单位进行	保证施工进度

附图

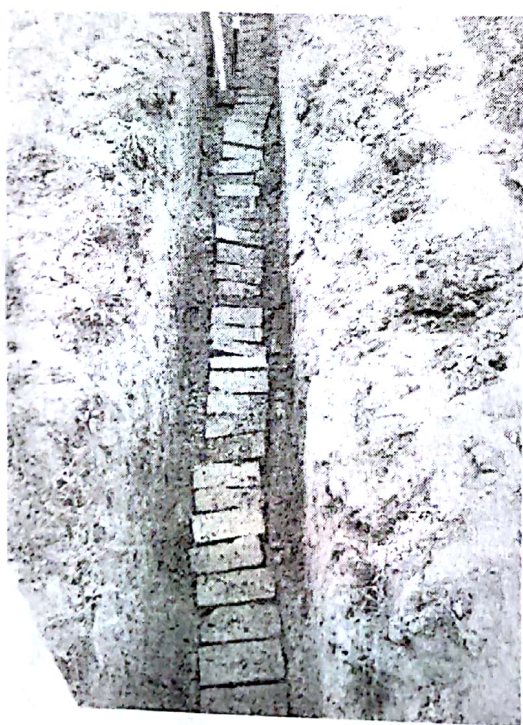

42 区直流电缆沟回填






43 区直流电缆沟验收



49 区支架验收



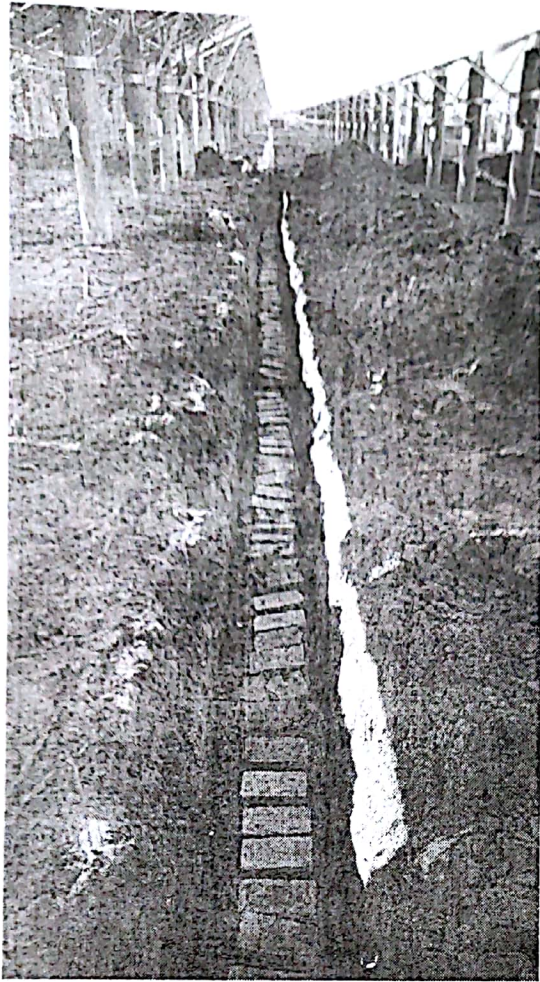

47-48 区高压电缆沟验收





49-50 区高压电缆沟验收





49#接地扁铁沟验收



常州正衡电力工程监理有限公司

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目监理部

2018 年 12 月

