



正衡监理

编号: YCGF-YB-004

## 监 理 月 报

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目

2018 年 8 月

项目监理部 (章)

总监理工程师



日期: 2018 年 8 月 31 号



由 扫描全能王 扫描创建

# 监 理 月 报

开始时间 2018 年 8 月 1 日 结束日期 2018 年 8 月 31 日

## 一、 监理重点工作情况

| 专业 | 事项       | 本月重点工作情况                                                                                           | 下月重点工作计划                                   |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 进度 | 主要工序工作   | 1、张集乔集 65MW 现场巡查<br>2、利民镇 45MW 光伏区整改消缺；升压站生产综合楼施工。<br>3、35KV 外线消缺。<br>4、开关站设备、住人预制舱安装，剩余工作，一个星期结束。 | 1、利民镇 45MW 光伏区整改消缺。<br>2、张集乔集施工质量、进度，现场督察。 |
|    | 设备交付进度   | 利民镇光伏区设备已全部交付；张集乔集镇设备交付 55%。                                                                       | 督促张集乔集镇保证施工质量、进度；利民镇光伏区进行整改消缺。             |
|    | 设计交付进度   | 图纸完成                                                                                               |                                            |
|    | 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好                                                                                        | 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查                        |
|    | 施工图会审    | 完成                                                                                                 |                                            |
|    | 设计交底     | 完成                                                                                                 |                                            |
|    | 方案审查     | 资料正在审查                                                                                             | 审查完毕                                       |
|    | 技术交底     | 完成                                                                                                 |                                            |
|    | 设计变更     |                                                                                                    |                                            |
|    |          |                                                                                                    |                                            |
| 安全 | 安全培训情况   | 进场员工已进行安全培训                                                                                        | 督促施工单位对进场新员工进行安全教育                         |
|    | 安全交底情况   | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底                                                                                 | 继续督促施工单位进行班前交底                             |
|    | 安全措施落实情况 | 场地围栏安装及用电安全都已落实                                                                                    | 吊装、防火、带电设备安全警示                             |
|    | 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好                                                                                        | 加强现场安全管理力度                                 |
| 质量 | 主要工序质量   | 现阶段，要求质量严格按照业主要求监管。                                                                                | 强制性质量问题绝不放过                                |
|    | 主要原材料    | 主要材料进行质量检查                                                                                         | 把控好材料进场质量问题                                |



|         |                                 |                |
|---------|---------------------------------|----------------|
| 质量      |                                 |                |
| 构(配)件质量 | 把控好进场材料质量关                      | 严抓构配件质量问题      |
| 设备质量    | 目前未进场                           |                |
| 质量验评情况  | 将不符合设计要求的地方,要求施工方进行整改,然后进行一次验收。 | 施工方整改后,进行二次验收。 |

## 二、本月进度情况

利民镇光伏区 20、26 区补桩,组件支架安装,其它发电单元消缺整改。围栏施工累计完成 9000 米。箱变基础平台翻沿整改;箱变基础围栏和爬梯施工;箱变防水封堵。1-13 区支架组件整改;19-36 区电气消缺施工。

升压站:

1、生产楼屋梁模板安装完成,屋面梁板钢筋加工及安装,电工顶板敷设电线穿管及线盒。

张集、乔集光伏区:

张集镇、乔集乡 60MW 光伏区:

1、已打管桩 26553 根(累计完成比 66.1%),围栏完成 1660 米,箱变基础浇筑完成 27 个单元(累计完成比 56.2%),支架安装 1532 组(累计完成比 30.8%),组件安装 848 (17%) 组;安装人员总计 380 人。

1、截止到目前已进场材料:  $\Phi 300$  的 5M 长 13859 根、 $\Phi 300$  的 10M 长 4132 根、 $\Phi 400$  的 5 米 299 根、 $\Phi 400$  的 10 米 10 根、 $\Phi 400$  的 11 米 72 根、组件到货 15.6MW,支架到货 18.6MW。

35KV 外线:浇筑完成 60 基;立塔施工完成 58 基。接地完成 53 基;放线完成 14-40#。



### 三、下月进度计划

利民镇光伏区：消缺整改。

升压站：生产综合楼竣工交付。

张集、乔集光伏区：

- 1、箱逆变基础平台浇筑完成。
- 2、九月十号保证 10 个单元发电。
- 3、管桩打桩工程结束，支架安装 90%，组件安装 75%。（征地问题解决情况下）

开关站：消缺整改。

35KV 外线：消缺整改。

### 四、安全文明施工情况

| 事故（起） |     |     | 编制安全策  | 施工       | 施工 |
|-------|-----|-----|--------|----------|----|
| 人身重   | 机械设 | 电网事 | 划文件(份) | 人数       | 单位 |
| 伤     | 备   | 故   |        |          | 数量 |
| 无     | 无   | 无   | 2 份    | 280<br>人 | 2  |

### 五、施工重点工作情况


| 专业   | 本月重点工作情况         | 下月重点工作计划          |
|------|------------------|-------------------|
| 进度管理 | 支架、组件安装。         | 检查支架、组件施工质量       |
| 安全管理 | 组件安装、施工人员安全帽佩戴   | 高空作业、临时用电、带电设备标识牌 |
| 质量管理 | 发现有质量问题并要求施工方更改。 | 更改完成，进行查验。        |



|      |                                 |                 |
|------|---------------------------------|-----------------|
| 技术管理 | 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。 | 检查张集、乔集镇施工质量    |
| 造价管理 | 对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单      |                 |
| 物资供应 | 督促施工单位进行                        | 及时联系供货厂家，保证施工进度 |

附图



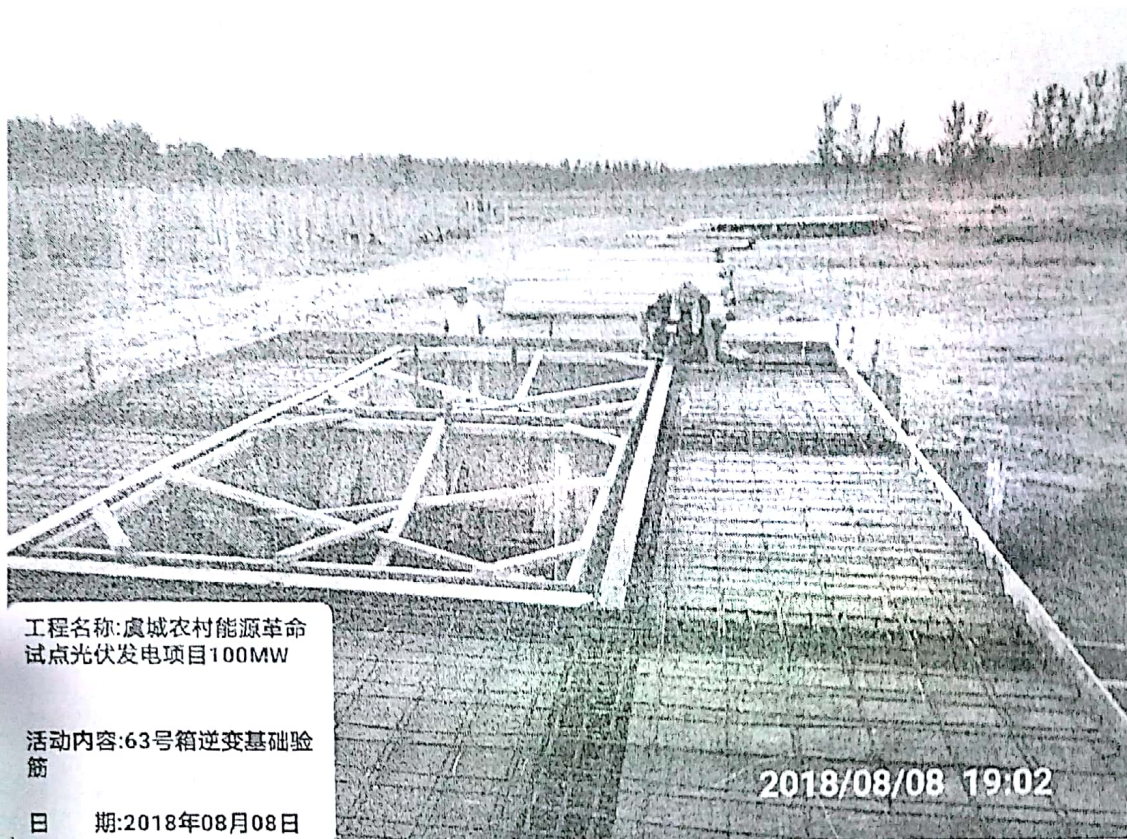

工程名称:虞城农村能源革命  
试点光伏发电项目100MW

活动内容:63号箱逆变基础验  
筋

日期:2018年08月08日

2018/08/08 19:02



工程名称:虞城农村能源革命  
试点光伏发电项目100MW


活动内容:68箱逆变基础浇筑

日期:2018年08月07日

2018/08/07 08:24





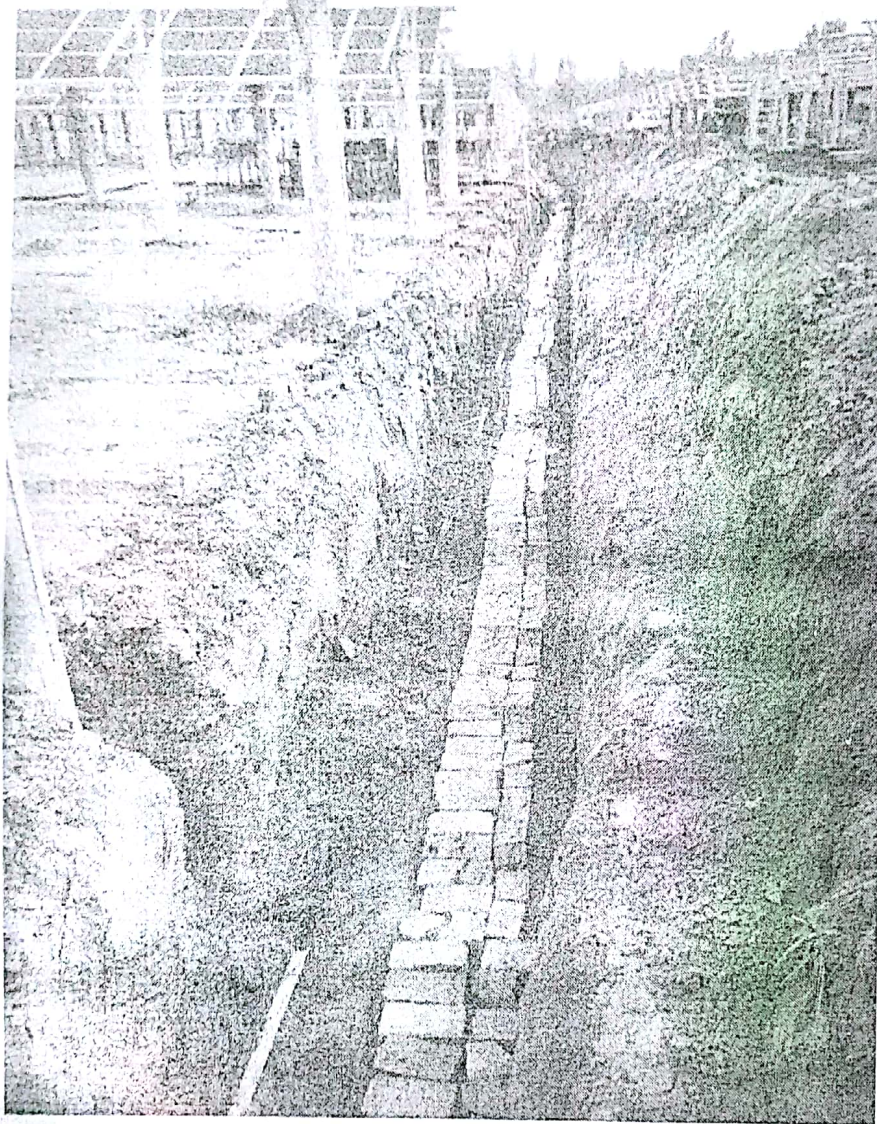

常州正衡电力工程监理有限公司

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目监理部

2018 年 8 月

