



正衡监理

编号: YCGF-YB-001

监 理 月 报

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目

2018 年 5 月 第 1 期



项目监理部 (章):

总监理工程师: 苗守刚

日期: 2018 年 5 月 31 号



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

开始时间 2018 年 5 月 1 日 结束日期 2018 年 5 月 31 日

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工序工作	1、召开第一次工地例会 2、质检站来第一次检查 3、对现场施工进行管控	1、督促施工单位抓紧时间，630前并网。 2、紧抓工程质量，不能因为赶工期，工程质量就下降。
	设备交付进度	目前管桩一天到货数量严重不足，可能会影响 630 并网。	督促施工方抓紧时间将管桩问题解决，并如期并网。
	设计交付进度	图纸完成	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	前期资料正在审查	审查完毕
	技术交底	完成	
	设计变更		
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	场地围栏安装及用电安全都已落实	吊装、防火
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	现阶段，由于赶工期，一些质量通病，并网后再消缺整改	强制性质量问题绝不放过
	主要原材料质量	主要材料进行质量检查	把控好材料进场质量问题
	构（配）件质量	把控好进场材料质量关	严抓构配件质量问题



	设备质量	目前未进场	
	质量验评情况	将不符合设计要求的地方，要求施工方进行整改，然后进行一次验收。	施工方整改后，进行二次验收。

二、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	定位放线	2018.5.5	2018.5.29	2018.5.5				
2	基础打桩	2018.5.9	2018.6.5	2018.5.9				
3	支架安装	2018.5.16	2018.6.22	2018.5.18				
4	组件安装	2018.5.17	2018.6.25	2018.6.25				
5	接地扁铁安装	2018.5.25	2018.6.13					
6	逆变、汇流箱安装	2018.5.30	2018.6.5					
7	电缆敷设安装	2018.6.6	2018.6.25					
8	并网线路接入	2018.6.11	2018.6.15					
9	系统调试	2018.6.15	2018.6.17					
10	道路、围栏	2018.5.17	2018.6.11					
11	并网验收	2018.6.20						

三、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
----	------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------------	----



						量)		
1	管桩	2018.5.9	2018.6.5	2018.5.9				
2	支架安装	2018.5.16	2018.6.22	2018.5.16				
3	组件安装	2018.5.17	2018.6.25	2018.5.17				

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	施工 单位 数量
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			
无	无	无	2份	130 人	2

五、施工重点工作情况


专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	管桩、支架及构配件到货、组件到场、进行抽检。	检查到货质量、数量
安全管理	管桩、支架、组件卸货吊装	吊装、高空作业、临时用电
质量管理	发现有质量问题并要求施工方更改。	更改完成，进行查验。
技术管理	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。	
造价管理	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单	



物资供应	督促施工单位进行	
------	----------	--

附图



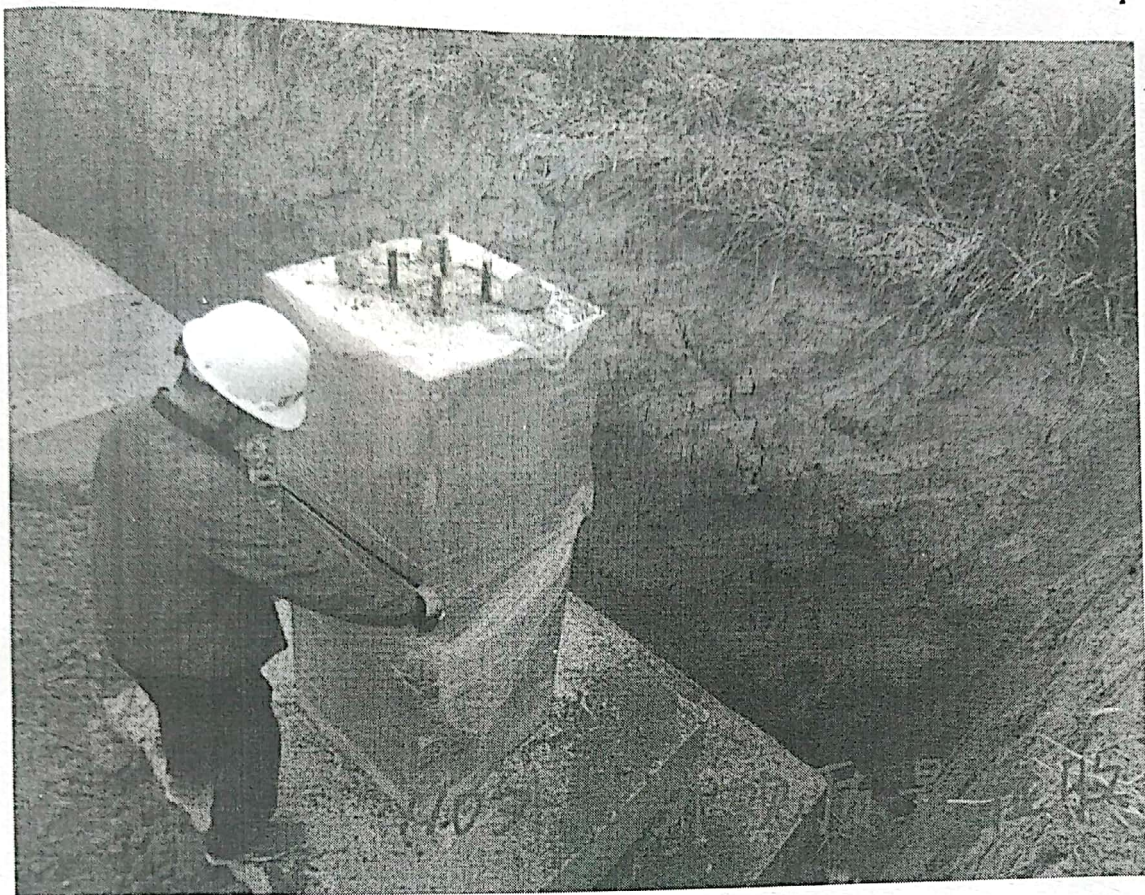



工程名称:虞城县农村能源革命试点100MW集中式光伏发电项目

施工部位:110kv外线, 塔吊装现场

2018/05/20 09:05

日期:2018年05月20日



工程名称:虞城县农村能源革命试点100MW集中式光伏发电项目

施工部位:升压站, 事故油池开始浇筑砼, 监理旁站!

2018/05/21 10:03

日期:2018年05月21日



常州正衡电力工程监理有限公司

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目监理部

2018 年 5 月

