



编号: YCGF-YB-003

监 理 月 报

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目

2018 年 7 月



项目监理部 (章): 阿特斯 100MW
监理项目部

总监理工程师:

苗守明

日期: 2018 年 7 月 31 号



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

开始时间 2018 年 7 月 1 日 结束日期 2018 年 7 月 31 日

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工序工作	1、张集乔集 65MW 现场巡查 2、利民镇 45MW 光伏区整改消缺；升压站生产综合楼施工。 3、35KV 外线基础浇筑，立塔、放线、接地。	1、利民镇 45MW 光伏区整改消缺。 2、张集乔集施工质量、进度，现场督察。
	设备交付进度	利民镇光伏区设备已全部交付；张集乔集镇设备交付 45%。	督促张集乔集镇保证施工质量、进度；利民镇光伏区进行整改消缺。
	设计交付进度	图纸完成	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	资料正在审查	审查完毕
	技术交底	完成	
	设计变更		
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	场地围栏安装及用电安全都已落实	吊装、防火、带电设备安全警示
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	现阶段，要求质量严格按照业主要求监管。	强制性质量问题绝不放过
	主要原材料质量	主要材料进行质量检查	把控好材料进场质量问题



构(配)件质量	把控好进场材料质量关	严抓构配件质量问题
设备质量	目前未进场	
质量验评情况	将不符合设计要求的地方,要求施工方进行整改,然后进行一次验收。	施工方整改后,进行二次验收。

二、本月进度情况

利民镇光伏区 20、26 区补桩,组件支架安装,其它发电单元消缺整改。围栏施工累计完成 9000 米。箱变基础平台翻沿整改;箱变基础围栏和爬梯施工;箱变防水封堵。1-13 区支架组件整改;19-36 区电气消缺施工。

升压站:

1、生产楼屋梁模板安装完成,屋面梁板钢筋加工及安装,电工顶板敷设电线穿管及线盒。

张集、乔集光伏区:

1、已打管桩 7750 根(合计 12MW),围栏完成 1660 米,箱变基础浇筑完成 5 个单元,支架安装 100 组,组件安装 39 组;安装人员总计 110 人,65 区水平接地完成。

截止到目前已进场材料: $\Phi 300$ 的 5M 长 13859 根、 $\Phi 300$ 的 10M 长 4132 根、 $\Phi 400$ 的 5 米 299 根、 $\Phi 400$ 的 10 米 10 根、 $\Phi 400$ 的 11 米 72 根、组件到货 15.6MW,支架到货 18.6MW。

开关站:一二次设备、住人预制舱到货安装。

35KV 外线:浇筑完成 60 基;立塔施工完成 58 基。接地完成 53 基;放线完成 14-40#。



三、下月进度计划

利民镇光伏区：利民镇光伏区组件安装完成。利民镇光伏区支架安装完成。汇流箱接线完成；防雷接地施工完成；直流电缆敷设、接线完成。箱逆变平台栏杆安装完成。

升压站：生产综合楼竣工交付。

张集、乔集光伏区：

1、管桩定位放线全部施工完成，打桩全部完成，支架组件安装 80%，围栏安装完成。

2、箱逆变基础平台浇筑完成。

开关站：设备安装调试完成，站内施工。

35KV 外线：现场所有材料均已到场，在保证安全的情况下，完成全部施工任务。

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	施工 单位 数量
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			
无	无	无	2 份	350 人	2

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	支架、组件安装。	检查支架、组件施工质量



安全管理	组件安装、施工人员安全帽佩戴	高空作业、临时用电、带电设备标识牌
质量管理	发现有质量问题并要求施工方更改。	更改完成，进行查验。
技术管理	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。	检查张集、乔集镇施工质量
造价管理	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单	
物资供应	督促施工单位进行	及时联系供货厂家，保证施工进度

附图



塔基验收





升压站站内道路



开关站平台验收





工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯100MWP光伏发电项目

施工部位:接地整改

日期:2018年07月22日

2018/07/22 15:21




工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯100MWP光伏发电项目

施工部位:生产楼

日期:2018年07月24日

2018/07/24 06:34



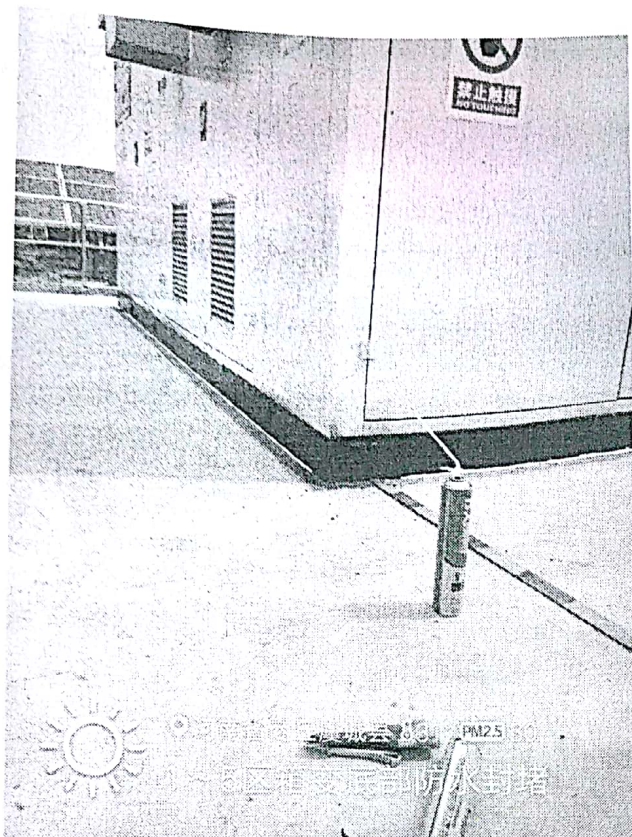

常州正衡电力工程监理有限公司

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目监理部

2018 年 7 月



由 扫描全能王 扫描创建
