



正衡监理

编号: JL- (RJPK) -02

监 理 月 报

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

2018年8月第2期

项目监理部 (章)

总监理工程师: 苗守明



报告日期: 2018 年 08 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程 月次 第 2 次 月报开始时间 2018 年 8 月 1 日

结束日期 2018 年 8 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程		影像	31 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程 检查料场物料20180801  瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程 光伏支架20180802	1、红都兴厂房屋顶电缆桥架、直流电缆敷设正在施工中;光伏组件已进场,准备施工。 2、圆鑫标准厂房屋顶光伏组件已进场,正在施工中。 3、凯斯特厂房屋顶光伏组件正在安装中。 4、金富电力厂房屋顶逆变器、汇流箱、配电箱已安装完成,准备并网发电。 5、海润服饰	1、现有厂房屋顶的光伏组件全部完成安装工作。 2、已完成安装工作的厂房屋顶光伏电站,准备并网试运行工作。

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
圆鑫标准厂房屋顶接地焊接施工20180803



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
圆鑫标准厂房接地焊接施工20180804



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
圆鑫标准厂房光伏支架20180805

厂房屋顶光伏组件已进场，正在施工中。

6、凯迪电子（金一珠宝）厂房屋顶光伏组件已安装完成。

7、瑞京鸿兴厂房屋光伏组件正在施工中。

8、瑞谷科技厂房屋顶逆变器、汇流箱、配电箱已完成安装，准备并网发电。

9、金字电线电缆厂房屋顶光伏组件已进场，准备施工安装。

10、江雄管道厂房屋顶光伏支架已完成安装；接地网焊接已完成；电缆桥架、直流电缆敷设已完成；光伏组件暂未进场。

11、诚顺钟表厂房屋顶模板已进场，正在施工中。

弘冠发制品厂房屋顶，条形基础尚未浇筑完成。



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
凯迪电子厂房接地施工20180806



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶电站接地施工20180807



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶接地焊接施工20180808


瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶接地焊接施工20180809



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
电站接地焊接处做防腐处理20180810




瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
凯迪电子厂房屋顶电缆敷设20180811

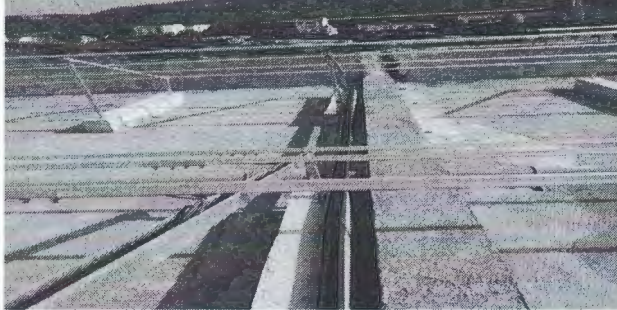

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
瑞谷科技厂房屋顶电缆敷设20180812



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶直流电缆敷设20180813

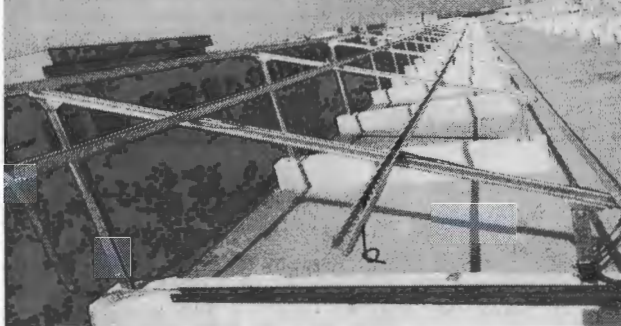

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
瑞瑞厂房屋顶垃圾20180814



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
诚顺钟表厂房清理垃圾20180815

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶电缆桥架施工20180816



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶直流电缆敷设20180817



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶电缆桥架安装20180818





瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
瑞谷科技厂房屋顶光伏组件安装20180822




瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
瑞谷科技厂房屋顶光伏组件安装20180823



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
凯斯特厂房屋顶光伏组件安装20180824



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
金富电力厂房屋顶光伏组件20180825

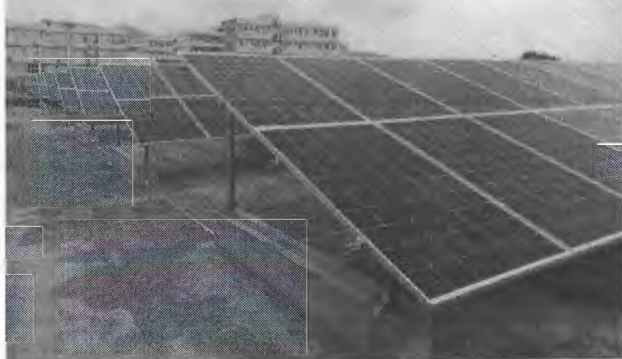


瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
与业主方、施工方三方共同巡视电站施工现场20180827



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
金富电力厂房屋顶逆变器安装20180828



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件吊运20180829

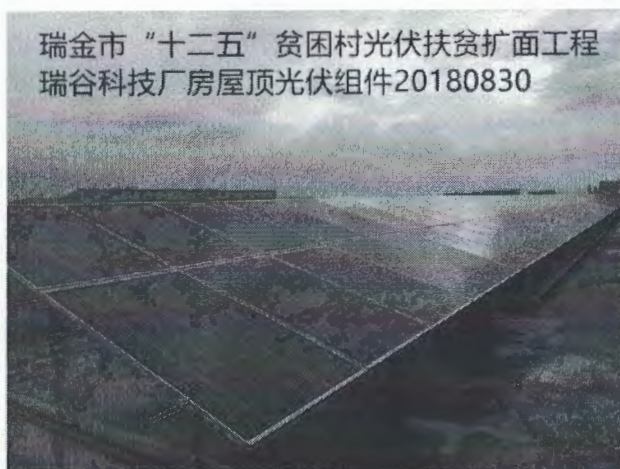

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
瑞谷科技厂房屋顶光伏组件20180830

			
	设备交付进度	支架、连接件、组件等材料已陆续进场。	支架、组件、电缆、计量柜等材料进场全部安装完成并验收
	设计交付进度	图纸未完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底

	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架安装	支架安装完成
	主要原材料质量	支架外观检查 合格	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量		进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
抚州市中海建设有限公司								
1	支架安装	20180611		20180611		2.245MW/3.585MW	2.245MW/3.585MW	
2	组件安装					0MW/3.5	0MW/3.	

						85MW	585MW	
3	逆变器安 装					10 台	10 台/28 台	
4	并网计量 柜					2 台	2 台 /28 台	
5	并网验收					0MW/3.5 85MW	0MW/3. 585MW	

三、 下月进度计划

序 号	任 务 名 称	计划开始时间	计划结束 时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	支架安装					3.585MW /3.585MW		
2	组件安装					3.585MW /3.585MW		
3	逆变器安 装					28 台		
4	并网计量 柜					28 台		
5	并网验收					3.585MW /3.585MW		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		20 人		/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及国家电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照施工合同的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程监理项目部

2018 年 8 月 31 日
