



编号: JL- (RJPK) -04

监 理 月 报

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

2018 年 10 月第 4 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 黄守明



报告日期: 2018 年 10 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程 月次 第 4 次 月报开始时间 2018 年 10 月 1 日

结束日期 2018 年 10 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程		影像	31 张	


一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	1、红都兴厂房屋顶电缆桥架、直流电缆敷设正在施工中;光伏组件正在安装中。 2、圆鑫标准厂房光伏电站已并网发电试运行。 3、凯斯特光伏电站已并网发电试运行。 4、金富电力光伏电站已并网发电试运行。 5、海润服饰光伏电站已并网发电试运行。	1、已完成安装工作的厂房屋顶光伏电站,准备并网试运行工作。 2、全部电站要安装完成并且要并网发电。

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
金字电线电缆厂房屋顶光伏组件20181003



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件20181004

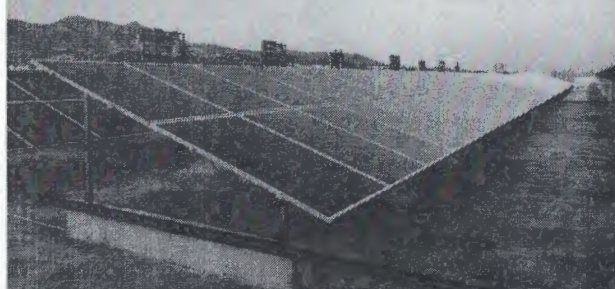

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
希艺欧厂房屋顶光伏支架安装20181006



6、凯迪电子
(金一珠宝)

厂房屋顶光伏电站已并网发电试运行。

7、瑞京鸿兴光伏电站已并网发电试运行。

8、瑞谷科技光伏电站已并网发电试运行。

9、金字电线电缆光伏电站已并网发电试运行。

10、江雄管道光伏电站建设已完成，等待并网发电。


11、美家照明光伏电站已并网发电试运行。

12、诚顺钟表光伏电站已并网发电试运行。


13、乐群塑胶厂房屋顶光伏组件已完成安装。

14、弘冠发制品光伏电站已并网发电试运行。


15、希艺欧厂房屋顶光伏组件正在安

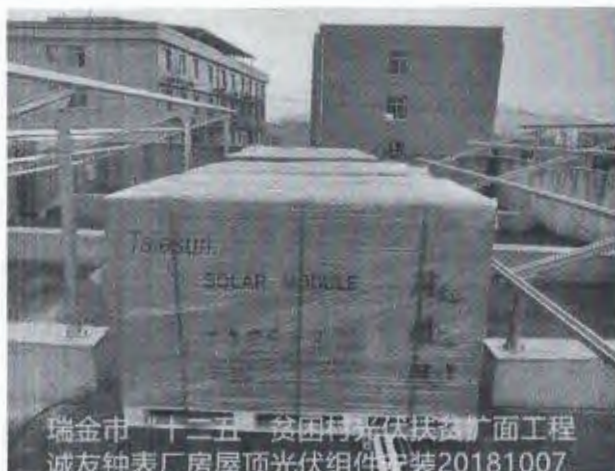

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
诚友钟表厂房屋顶光伏组件安装20181007

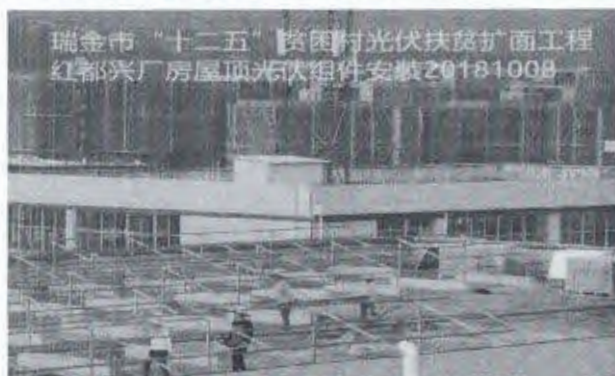

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件安装20181008

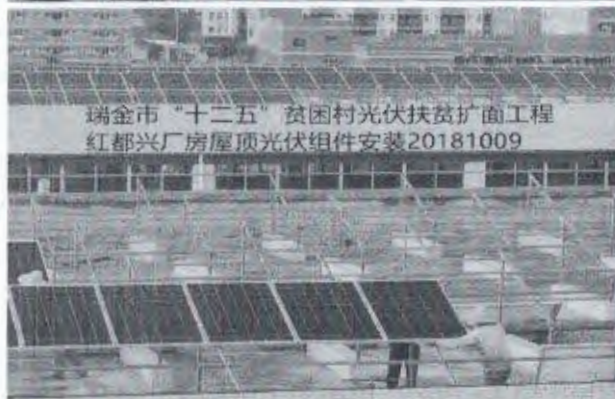

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件安装20181009



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件20181010

装中。



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
光伏电站屋顶光伏组件20181015



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
美家照明厂房屋顶光伏组件等位线安装20181016



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件20181017




瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
乐群塑胶屋顶光伏组件安装20181018



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
乐群塑胶厂房屋顶光伏组件安装20181019



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
乐群塑胶厂房屋顶光伏组件安装20181020

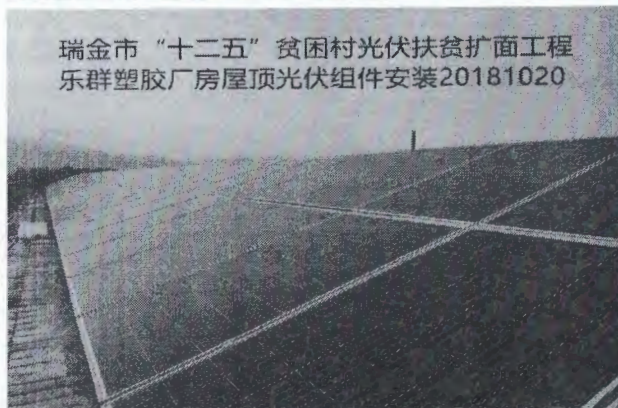

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
金字电缆厂房屋顶光伏组件20181021




瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
乐群塑胶厂房屋顶光伏组件安装20181022



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
乐群塑胶厂房屋顶电缆敷设20181023




瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件安装20181024

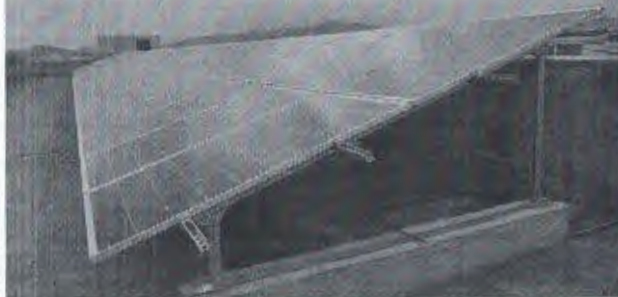


瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
希艺欧厂房屋顶光伏支架安装20181025




瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件20181026

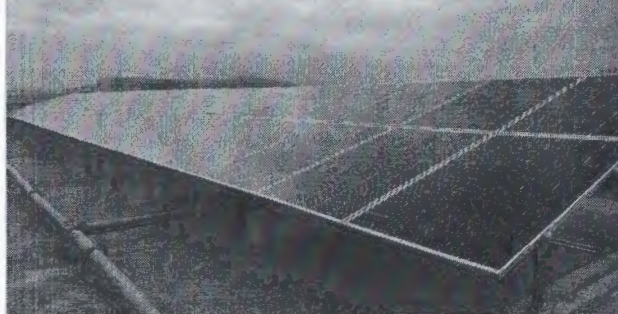

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
希艺欧厂房屋顶光伏组件安装20181027

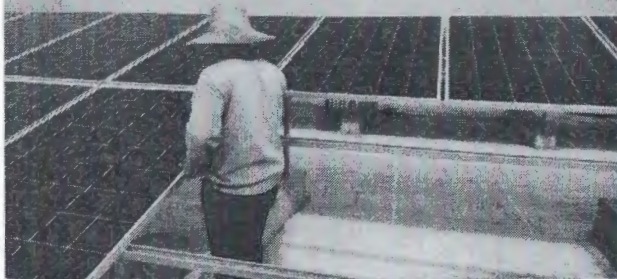

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
希艺欧厂房屋顶光伏组件20181028



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件安装20181029



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件安装20181030



			
	设备交付进度	支架、连接件、组件等材料已陆续进场。	支架、组件、电缆、计量柜等材料进场全部安装完成并验收
	设计交付进度	图纸未完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已	监督施工单位

		要求施工单位 认真落实	认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架安装	支架安装完成
	主要原材料质量	支架外观检查 合格	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量		进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
河南万安实业有限公司								
1	支架安装	20180611		20180611		3.585M W/3.585 MW	3.585M W/3.585 MW	
2	组件安装					3MW/3.5 85MW	3MW/3. 585MW	
3	逆变器安					35 台	35 台/42	

	装						台	
4	并网计量柜					24 台	24 台/28 台	
5	并网发电					1.865MW/3.585 MW	1.865MW/3.585 MW	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
1	支架安装					3.585MW /3.585MW		
2	组件安装					3.585MW /3.585MW		
3	逆变器安装					42 台		
4	并网计量柜					28 台		
5	并网验收					3.585MW /3.585MW		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外分包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		18 人		/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及国家电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照施工合同的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程监理项目部

2018 年 10 月 31 日
