



编号: JL- (RJPK) -05

监 理 月 报

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

2018年 11月第 5期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 苗守明

报告日期: 2018 年 11 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程 月次 第5次 月报开始时间 2018年11月1日



结束日期 2018年11月30日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程		影像	30张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	1、红都兴光伏电站已并网试运行。 2、圆鑫标准厂房光伏电站已并网发电试运行。 3、凯斯特光伏电站已并网发电试运行。 4、金富电力光伏电站已并网发电试运行。 5、海润服饰光伏电站已并网发电试运行。 6、凯迪电子（金一珠宝）厂房屋顶光伏电站已并	1、光伏电站已并网发电。 2、光伏电站整改消缺阶段。 3、完成光伏电站的验收工作。

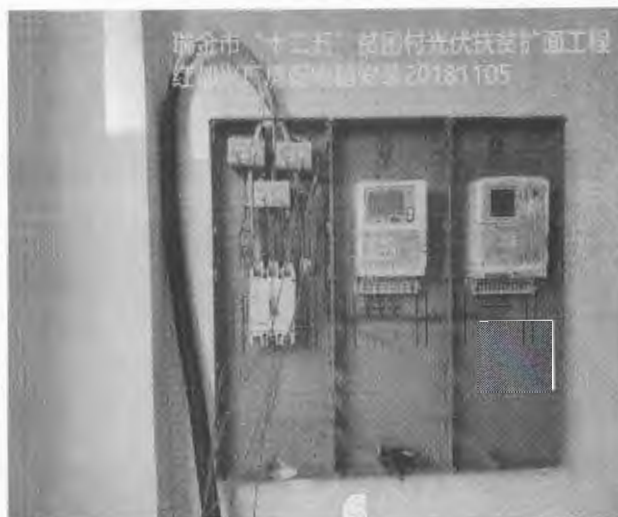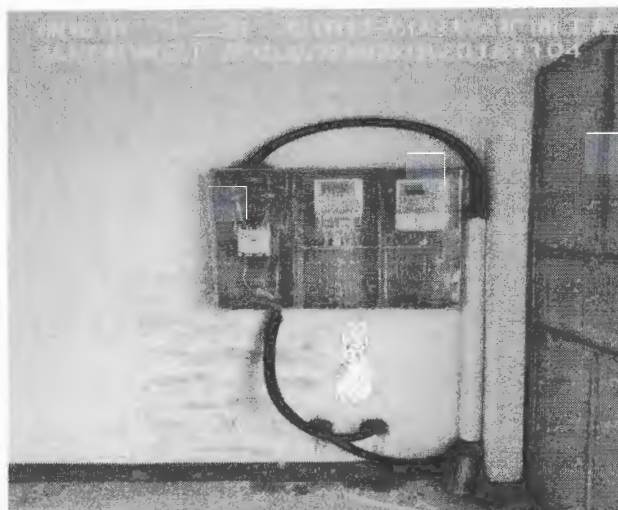

网发电试运行。

7、瑞京鸿兴光伏电站已并网发电试运行。

8、瑞谷科技光伏电站已并网发电试运行。

9、金字电线电缆光伏电站已并网发电试运行。

10、江雄管道光伏电站已并网发电试运行。

11、美家照明光伏电站已并网发电试运行。

12、诚顺钟表光伏电站已并网发电试运行。

13、乐群塑胶光伏电站已并网发电试运行。

14、弘冠发制品光伏电站已并网发电试运行。

希艺欧光伏电站已并网发电试运行。




瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件 20181109



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件 20181110




瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件 20181111

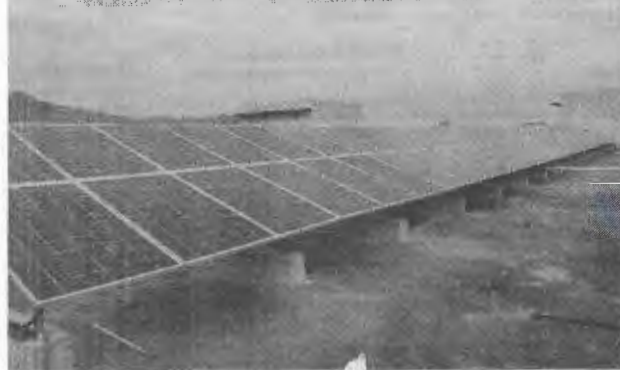

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件20181112



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
圆鑫标准厂房屋顶光伏组件20181113

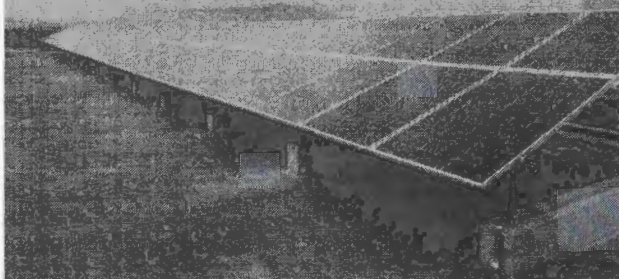

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
美家照明厂房屋顶光伏组件20181114



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件20181115



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件20181116



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件20181117

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
希艺欧厂房屋顶光伏组件20181118



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
希艺欧厂房屋顶光伏组件20181119




瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
乐群塑胶厂房屋顶光伏组件20181120



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
弘冠发厂房屋顶光伏组件20181121



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
金字电线电缆厂房屋顶光伏组件20181122

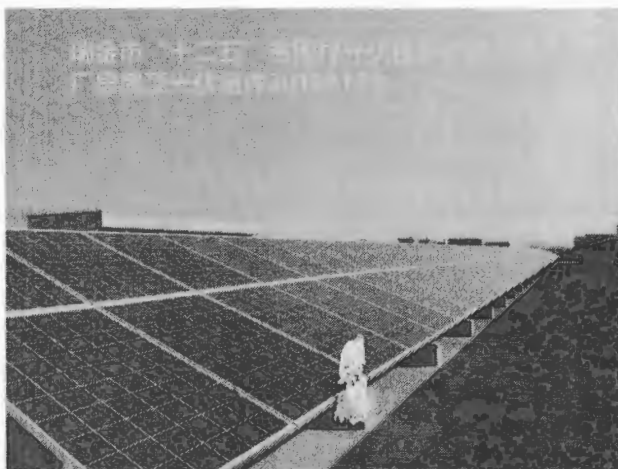


瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶光伏组件20181124



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶光伏组件20181125



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶光伏组件20181126

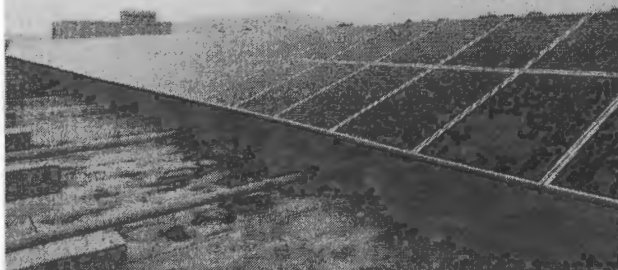

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶光伏组件20181127



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶光伏组件20181128



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
厂房屋顶光伏组件20181129



			
	设备交付进度	全部设备已安装完成。	等待验收
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	完成
	方案审查	交付	已完成审查
	技术交底	完成	完成
	设计变更	无	无
安全	安全培训情况	完成安全培训工作	完成安全培训工作
	安全交底情况	完成安全交底工作	完成安全交底工作
	安全措施落实情况	安全措施已落实	安全措施已落实
	安全文明施工情况	现场安全、文明	加强现场安全

		措施良好	管理力度
质量	主要工序质量	支架安装	支架安装完成
	主要原材料质量	支架外观检查合格	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
河南万安实业有限公司								
1	支架安装	20180611		20180611		3.585MW/3.585MW	3.585MW/3.585MW	
2	组件安装					3MW/3.85MW	3MW/3.585MW	
3	逆变器安装					51 台	51 台/51 台	
4	并网计量柜					28 台	28 台/28 台	
5	并网发电					3.585M	3.585M	

						W/3.585 MW	W/3.585 MW	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	支架安装					3.585MW /3.585MW		
2	组件安装					3.585MW /3.585MW		
3	逆变器安装					51 台		
4	并网计量柜					28 台		
5	并网验收					3.585MW /3.585MW		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		18 人		/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网验收准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实《安全文明施工措施》。	审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及国家电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照施工合同的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程监理项目部

2018 年 11 月 30 日
