



正衡监理

编号: ZHJL-YB-01

监 理 月 报

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

2018年7月第1期



总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2018 年 07 月 29 日

监 理 月 报

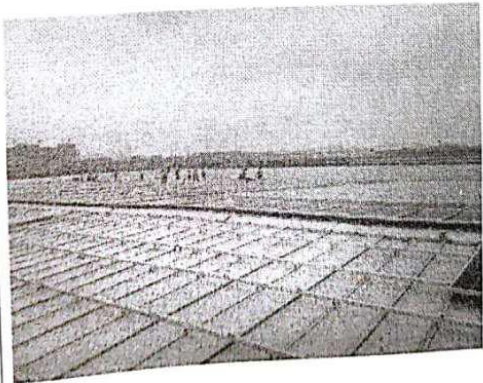
工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目 月次 第 1 次 月报开始时间 2018 年 7 月 29 日

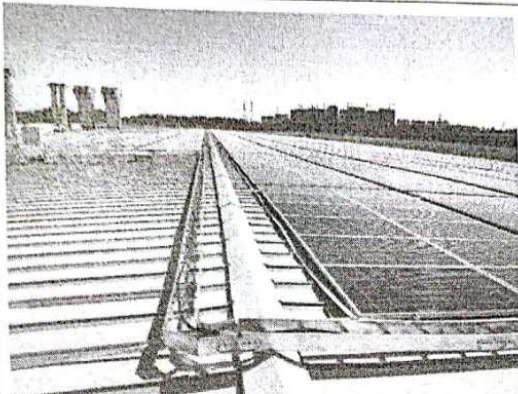
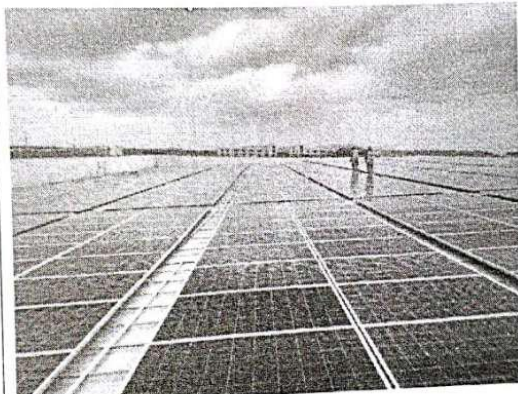
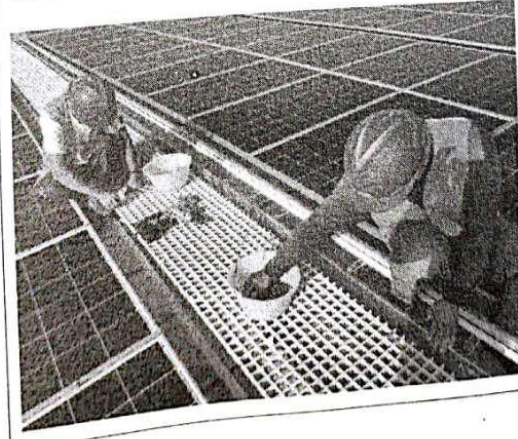
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	南京长安发动机厂光伏发电项目	湖南警安工程有限公司	影像	7 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		光伏区支架完 已全部完成; 光伏区组件全 部完成; 检修通道安装 完毕; 电缆桥架安装 完成; 光伏区至配电 室 1#、2#进线 380V 低压电缆 3*120/150+1*7	通讯柜安装; 并网柜安装;

	0 敷设完毕；	
	逆变器安装完成 20 台，接线完成；	
	汇流箱安装完成 6 台，接线完成。	

		
	设备交付进度	设备、支架、组件、桥架、电缆、箱逆变器 etc 进场
	设计交付进度	CAD 图纸

	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实彻底	施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安装，电缆桥架安装，电缆敷设，电缆头制作；	支架及组件安装；电缆敷设，电缆头制作。
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关

	设备质量		进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量 / 总量)	累计完成 (完成量 / 总量)	备注
湖南警安								
1	支架安装		2018.7.10	2018.6.23		0.8MW/ 0.8MW	0.8MW/0 .8MW	
2	组件安装		2018.7.15	2018.6.28		0.8MW/ 0.8MW	0.8MW/0 .8MW	
3	电缆桥架		2018.7.25	2018.7.8		0.8MW/ 0.8MW	0.8MW/0 .8MW	
4	直流电缆 4mm2		2018.7.25	2018.7.12		0.8MW/ 0.8MW	0.8MW/0 .8MW	
8	逆变器安 装			2018.7.24	2018.7.15	20/20 台	2Q/20 台	
9	汇流箱安 装			2018.7.24	2018.7.15	6/6 台	6/6 台	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
----	------	--------	--------	--------	--------	----------------------	----------------------	----

						量)	量)	
湖南警察								
1	通讯柜安 装		2018.7.31	2018.7.21		0.8MW		
2	并网柜安 装		2018.7.31	2018.7.21		0.8WM		

四、安全文明施工情况

[illegible]

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理		
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
南京长安发动机厂光伏发电项目监理部

2018 年 7 月 29 日
