



正衡监理

编号: ZHJL-YB-02

监 理 月 报

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

2018年8月第2期



总监理工程师: 侯耀奎

报告日期: 2018年08月29日

监 理 月 报

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目 月次 第 2 次 月报开始时间 2018 年 8 月 29 日


监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	南京长安发动机厂光伏发电项目	湖南警安工程有限公司	影像	4 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		通讯柜已全部安装完成； 并网柜安装完成并并网发电；	竣工验收； 消缺整改；

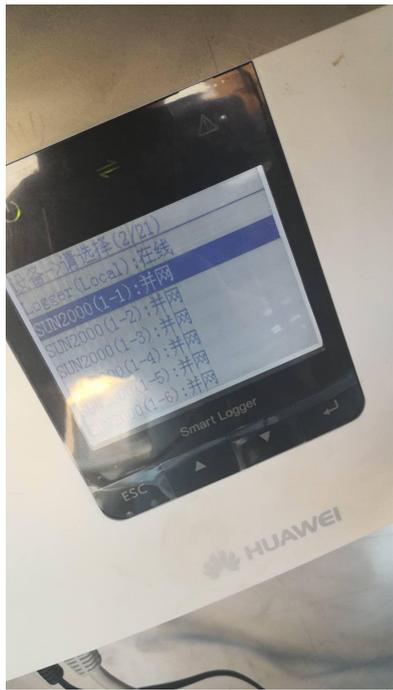

设备交付进度

设备、支架、组

		件、桥架、电缆、箱逆变器进场	
	设计交付进度	蓝图	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况	落实彻底	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	
质量	主要工序质量	支架及组件安装，电缆桥架安装，电缆敷设，电缆头制作；	
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	
	构（配）件质量	进场材料质量合格	

	设备质量	进行进场报验、 开箱检查	
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量 / 总量)	累计完成(完成量 / 总量)	备注
湖南警安								
1	支架安装		2018.7.10	2018.6.23		0.8MW/ 0.8MW	0.8MW/0 .8MW	
2	组件安装		2018.7.15	2018.6.28		0.8MW/ 0.8MW	0.8MW/0 .8MW	
3	电缆桥架		2018.7.25	2018.7.8		0.8MW/ 0.8MW	0.8MW/0 .8MW	
4	直流电缆 4mm2		2018.7.25	2018.7.12		0.8MW/ 0.8MW	0.8MW/0 .8MW	
8	逆变器安 装			2018.7.24	2018.7.15	20/20 台	20/20 台	
9	汇流箱安 装			2018.7.24	2018.7.15	6/6 台	6/6 台	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总	本月实际完成 (完成量 / 总	权值

						量)	量)	
湖南警安								
1	通讯柜安装		2018.7.31	2018.7.21		0.8MW		
2	并网柜安装		2018.7.31	2018.7.21		0.8WMM		

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		3人	1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理		
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

南京长安发动机厂光伏发电项目监理部

2018年8月29日
