

监理月报

邯郸盛天光伏能源科技有限公司2*4兆瓦

分布式光伏发电项目

(第01期)

监理项目部(章)



报告日期: 2019年05月28日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

本月工程实施情况

编号：01

项目名称	临漳县盛天光伏能源科技有限公司2*4兆瓦分布式光伏发电项目		业主单位	临漳县盛天光伏能源科技有限公司
项目规模	本项目装机容量（2x4MW）		项目地址	临漳县邯钢工业园区
监理负责人	田同有		监理人数	驻场 1人
监理进场时间	2019.04.20（业主通知进场时间）。		合同工期	总计监理时间120天。
参建单位	建设单位：临漳县盛天光伏能源科技有限公司			
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
	设计单位：河北能源工程设计有限公司			
	总承包单位：宁波建工建乐工程有限公司			
	施工单位：辽宁葫芦岛时雨电力安装有限公			

一、本工程规模：

临漳县盛天光伏能源科技有限公司2x4兆瓦分布式光伏发电项目，位于临漳县邯钢工业园区，总计发电容量2x4WMP，共计6个厂房彩钢瓦屋面，汇流箱33台，逆变器93台，箱变8台，一次舱、二次舱各1个，SVG无功补偿2台。

二：工程进度、安全、质量：

1、截止2019年04月28日10号厂房屋面（1.9734WM）光伏支架安装固定完成，屋面镀锌扁铁接地环网连接完成，20台逆变器支架、7台汇流箱支架安装固定完成，光伏组串（24块光伏组件多晶硅275WP）电缆线敷设完成。

2、因施工材料未进场（光伏组件、电缆桥架高低压电缆以及各种设备等），导致施工方无法正常安装施工，施工方于2019年04月28日10号屋顶安装暂停施工。

3、10号厂房屋面光伏支架安装、汇流箱支架安装、逆变器支架安装经监理人员现场检查未发现松动情况。

4、光伏组串电缆线敷设安装固定符合要求。



5、开关站一二预制舱、SVG、6台箱变基础位置经总包方、厂区有关部门、监理项目部、施工方等单位联合考察确认以及需砍伐的树木后，上报上级有关部门等待审批。2019年5月20日上级单位部门对上报的各设备基础位置予以否决。

6、施工过程中有个别施工人员安全帽帽带未系现象。

7、屋面临边安全防护不到位，安全警示标牌未悬挂。

三、本月监理工作情况：

1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（记录日志、监理检查记录表等），对施工现场发现的安装质量问题进行了规范安装示范，现场要求施工人员整改。

2、本月召开监理周例会1次，会议纪要1份，工作联系单3份，监理检记录表2份。

四、其它：

1、监理于2019年04月20日进场，施工单位于2019年04月05日进场开始安装，部分施工材料已进场。截止2019年05月27日未有材料、设备进场。

2、监理项目部多次与总包负责人微信、电话联系沟通关于施工方进场资料报审、工程材料、设备进场情况，监理项目部对总包项目部发出工作联系单二份（抄送业主负责人）。

3、项目名称迟迟确定不了，并且确定后又再次变更，导致总包项目部、监理项目部项目无法刻制公章，致使监理项目部文件无法传送。

4、监理项目部多次电话、微信向业主负责人汇报工程情况，业主负责人于2019年5月27日晚7点向监理人员qq邮箱里发来一份工作联系单，要求监理项目部暂时撤场，监理项目部于2019年5月28日下午17点已撤场（监理撤场联系单一份）。

临漳县盛天光伏能源科技有限公司2*4兆瓦分布式光伏发电项目

监理项目部

2019年05月28日






监理进场各方有关负责人碰头会



监理周例会



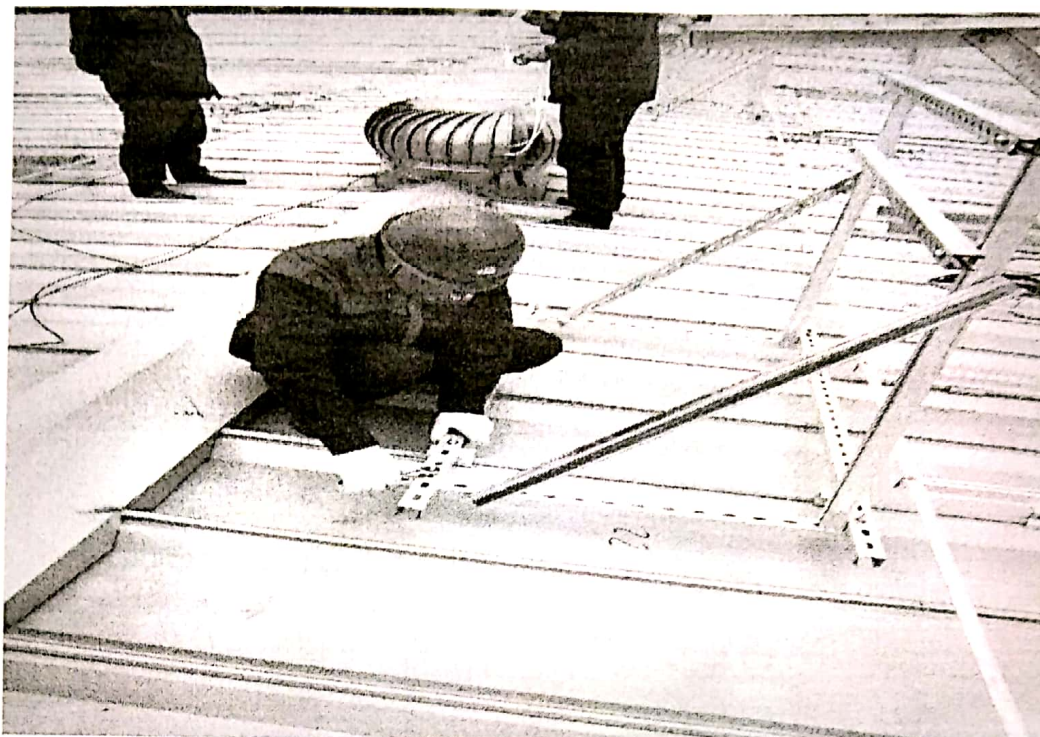

10号屋面汇流箱支架安装




10号屋面光伏组串电缆线敷设





10号屋面镀锌接地扁铁吊运

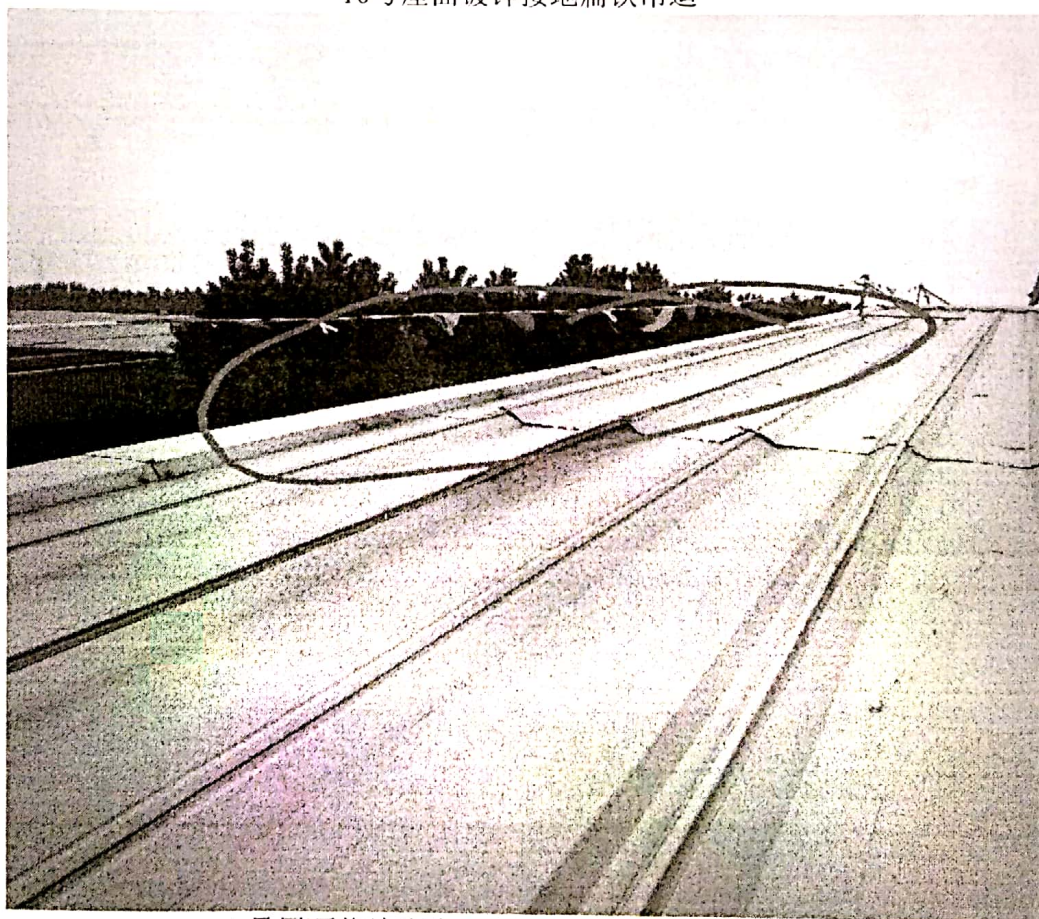

10号屋顶临边安全防护不规范 (01)





10号屋顶临边安全防护不规范（02）

