

监理月报

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

(皮阿诺3.5856WM)

第04期

监理项目部（章）



报告日期： 2019年01月24日



扫描全能王 创建

监 理 月 报

本月工程实施情况

项目名称	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺)		业主单位	兰考县兴泰光伏发电有限公司
项目规模	本项目装机容量（皮阿诺3.5856MW）		项目地址	兰考恒大家居联盟产业园内
监理负责人	田同有		监理人数	驻场 2人
监理进场时间	2018.10.09（业主通知进场时间）。		合同工期	2018.09.21-2019.01.21（另加免费监理30天）
参建单位	建设单位：兰考县兴泰光伏发电有限公司			
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
	设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
	总承包单位： /			
	施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司。			

一、本工程规模：

河南开封兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目，位于开封市兰考恒大家具联盟产业园内，其中皮阿诺项目（3.5856MW），共计三个彩钢瓦屋面占地面积149400m²，共计安装组件共13280块，汇流箱52个，箱变4个，一次舱、二次舱各1个。

二：工程进度：

（1）、2018年12月30日施工人员未告知监理项目部情况下已撤离施工现场，2018年01月04日监理项目部已对施工项目部发出监理通知单（GFDZJBM08-07）要求复工，2019年01月6日施工项目部2人进场，开始对D号屋面已并网1WM光伏区进行镀锌扁铁焊接、安装固定及防腐处理，截止2019年01月24日已完成并网1WM光伏区接地焊接90%。

（2）、2019年01月16日，本项目移动通信电缆敷设完成。

（3）、2019年01月18日箱逆变、一二次舱设备内通讯电缆熔接完成。



(4)、2019年01月11日,光伏发电并网0.97WM。

(5)、2019年01月17日, D号屋面13台汇流箱、1#2#箱逆变箱体以及一二次预制舱内防火封堵完成封堵。

1、材料进场情况:

(1)、本月业主项目部接收其它已并网项目剩余光伏材料:

(2)、电缆桥架进场十车(规格型号多种见附件)。

(3)、高压电缆1盘、低压电缆14盘,其它型号电缆若干。

(4)、汇流箱进场39台。

(5)、所有转运进场材料、设备本项目暂不使用。

二、施工过程中存在的问题:

(1)、D号屋面镀锌扁铁焊接、安装固定符合设计要求,防腐处理个别处存在防腐刷漆不到位现象。

(2)、D号屋面6台汇流箱未安装固定,电缆头(2*70mm²)未接入汇流箱,电缆头未做防雨、防潮保护。部分电缆桥架盖板未安装固定。

(3)、办公用电线路未安全保护。

(4)、三个楼面上楼爬梯上口处安装警示标牌脱落,未重新悬挂。

(5)开关站施工垃圾、屋面施工新增垃圾清理不到位。

四、本月监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述(特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法):

1)、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正,并做记录(记录日志、监理检查记录表等),对施工现场发现的安装质量问题进行了规范安装示范,现场要求施工人员整改。

2)、本月召开监理周例会4次,会议纪要4份,监理通知单2份,监理检查记录表2份,监理旁站2份,月专项安全检查1份(春节前安全专项检查)。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方:

1)、加强工程监理专业学习,监理工作规范化。

2)、提高电气和土建监理专业知识。

3)、要经常组织本项目监理人员多交流探讨施工现场遇到的各种疑难问题。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求:

严抓施工质量及现场安全,及时与施工项目部对工程质量施工进行沟通。

五、下月监理工作重点:


无

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

2019年01月24日



扫描全能王 创建

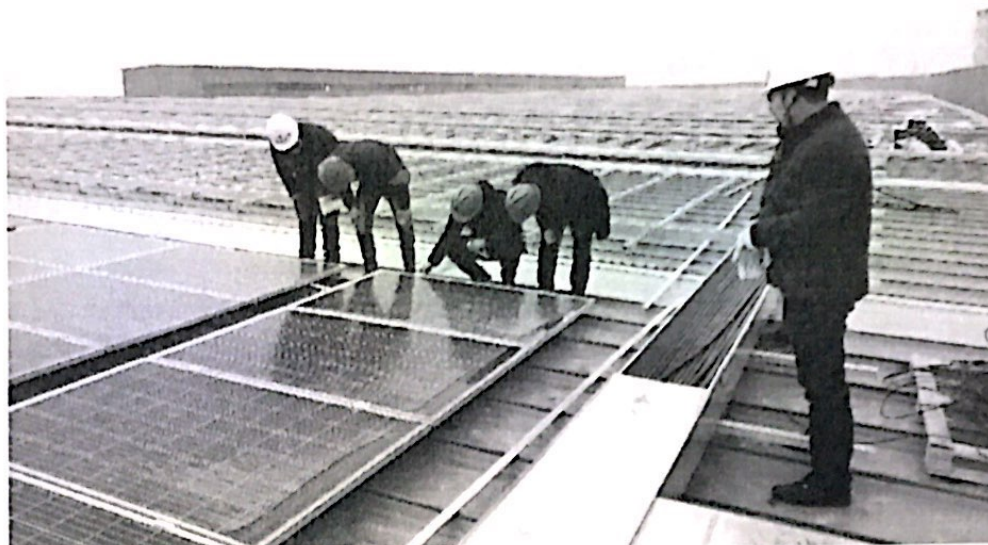

正泰中部区域公司领导春节前莅临本项目检查现场安全、质量情况



正泰公司其它已并网项目剩余材料、设备转运本项目监理现场检查验收





并网发电箱逆变器检查



D号屋面镀锌扁铁焊接监理检查






箱逆变器通讯电缆熔接



D号屋面光伏区镀锌扁铁焊接施工



汇流箱设备内防火封堵制作

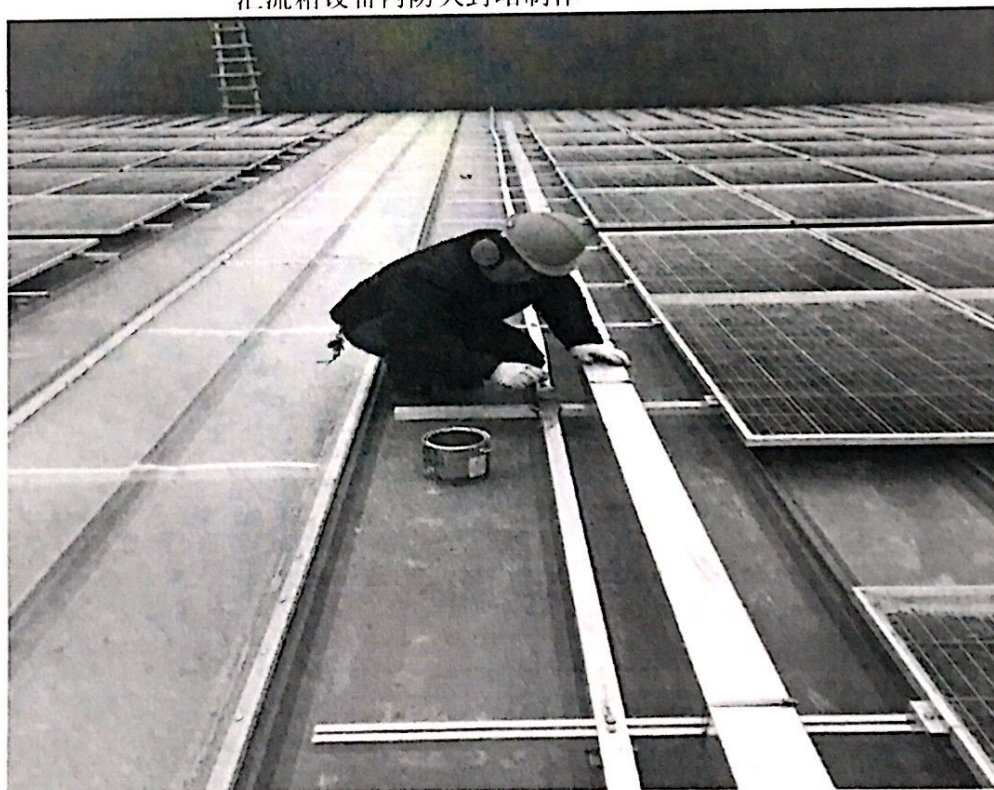

D号屋面镀锌扁铁防腐处理

